



ALTAR SONORA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

FAISM 2022

En la localidad Altar, Municipio de Altar, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 03 de Enero del 2023, se reunieron las personas que asisten en representación del Organismo Ejecutor, de los beneficiarios, Invitados Especiales del Sector Público y representativo de los beneficiarios de la obra de acuerdo al siguiente listado.

El H. Ayuntamiento de Altar, como Organismo ejecutor de la obra a entregar, representado por el **LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL** como Presidente Municipal, y la **L.E. BEATRIZ ADRIANA CORELLA CELAYA** Secretario del H. Ayuntamiento.

La Dependencia Entidad Operadora de Obras Publicas, representada por el **C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON** Director de esta entidad.

El motivo de la reunión es llevar a cabo el acta de Entrega-Recepción de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO.**

ANTECEDENTES

FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal

FECHA DE INICIO: 28 de noviembre del 2022

FECHA DE TERMINACION: 30 de diciembre del 2022

MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa

NO. BENEFICIARIOS: 1 familias

METAS PROGRAMADAS: 1 VIVIENDA

ALCANZADA: 100 %

INVERSION APROBADA: \$88,389.81

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$88,389.81	\$0	\$0	\$88,389.81	Material

INVERSIÓN EJERCIDA: \$88,389.81

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$88,389.81	\$0	\$0	\$88,389.81	Material

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que: la obra construida se encuentra terminada al 100% y con las especificaciones correctas, la cual es aceptada en su totalidad.

ENTREGA – RECEPCION

El H. Ayuntamiento de Altar, Sonora, por medio de esta acta hace entrega con esta fecha a la C. Guadalupe Sesma Quijada como representante autorizado por la comunidad, comprometiéndose a su conservación y mantenimiento adecuado.

ENTREGA POR EL H. AYUNTAMIENTO


LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.E. BEATRIZ ADRIANA CORELLA CELAYA
SECRETARIO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

RECIBE

POR LA ENTIDAD OPERADORA


C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 24

POR LOS BENEFICIARIOS


C. GUADALUPE SESMA QUIJADA




ACTA DE SITIO

Siendo La 11:00 horas del día 03 del mes de Enero de 2023. En las instalaciones del H. Ayuntamiento de Altar ubicado en calle Zaragoza s/n del Municipio de Altar, Sonora.


Encontrándose reunidos el **C. Lic. Luis Ángel Valenzuela Mendivil**, Presidente Municipal; el C. C.P. Juan José Celaya Gaytán, Tesorero Municipal; C. C.P. Luis Alonso Traslaviña Miranda, Contralor Municipal, así como el C. Jorge Arsenio Espinoza Limón, Director de Obra Pública Municipal; quienes fungirán como responsables para llevar a cabo la revisión física de los trabajos relativos a la obra denominada **"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD DE ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO"**.

Una vez realizada la verificación física, se desprende lo siguiente: una vez verificada la obra mediante un recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra y se encuentra terminada en un 100% con cada una de las especificaciones correctamente realizadas y se da por aceptada por las partes encargadas y dar fe de la misma y se anexa posterior a esta acta de sitio las fotos correspondientes a los trabajos realizados.


Leído lo anterior y no habiendo más que agregar se da por concluida la presente diligencia a las 12:00 horas del mismo día, firmado de conformidad al calce de la misma los que en ella intervienen.



ADMINISTRACIÓN
Lic. Luis Ángel Valenzuela Mendivil
Presidente Municipal


C.P. Luis Alonso Traslaviña Miranda
Contralor Municipal


L.E. Beatriz Adriana Corella Celaya
Secretario del Ayuntamiento


C. Jorge Arsenio Espinoza Limón
Director de Obras Públicas


C.P. Juan José Celaya Gaytán
Tesorero Municipal


C. Andrea Melina Medina Miquirray
Testigo

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA. ACUERDO PARA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA.

I.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 17, 99 Y 100 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SONORA Y 59 Y 61 DE SU REGLAMENTO, Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 56, 77 Y 79 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS FEDERAL EN VIGOR, EN EL CAPITULO II, DE LA CLAUSULA IV DEL CONVENIO ESTADO-MUNICIPIO, EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA, EMITE EL PRESENTE ACUERDO PARA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE CONFORMIDAD DE LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDO

II.- QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO APROBO LA ASIGNACION MUNICIPAL A EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA, DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33, PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS A EJECUTAR EN ESTE AÑO, EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

III.- QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA, CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN, PERSONAL TECNICO, OBRERO Y EQUIPO NECESARIO PARA EJECUTAR POR ORGANIZACIÓN DIRECTA LOS TRABAJOS A QUE SE REFIEREN A LA AUTORIZACION DE REFERENCIA.

IV.- QUE SE ELABORO EL ANEXO TECNICO DE APROBACION **2022**, ASI COMO LOS EXPEDIENTES TECNICO UNITARIOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES CORRESPONDIENTES.



POR LO ANTERIOR DESCRITO SE HA DETERMINADO QUE ES CONVENIENTE QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA, EFECTUE POR ADMINISTRACION DIRECTA LAS OBRAS APROBADAS POR EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA ESTE AÑO, POR LO QUE SÉ A TENIDO A BIEN DICTAR EL SIGUIENTE:

ACUERDO

PRIMERO. - EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA, REALIZARA DURANTE EL PRESENTE AÑO, POR ADMINISTRACION DIRECTA LA SIGUIENTE OBRA:

OBRA	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO.	ALTAR	\$88,389.81

SEGUNDO. - LA EROGACION QUE SE AUTORIZAN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION ANTES MENCIONADOS, IMPORTA LA CANTIDAD DE \$88,389.81 (SON: OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.)

TERCERO. - LA INVERSION TOTAL A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA CLAUSULA ANTERIOR, ES LA MAXIMA QUE DEBE EFECTUARSE Y NO PODRA VARIAR SALVO QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL FISM AUTORICEN LAS MODIFICACIONES RESPECTIVAS.

CUARTO. - LAS OBRAS DE OBJETO DE ESTE ACUERDO SE EFECTUARÁN CONFORME EL PROGRAMA DE OBRAS QUE SE ANEXAN, TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL 28 DE NOVIEMBRE Y TERMINACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.



QUINTO. - LA FORMA DE PAGO Y LA COMPROBACION DE LAS EROGACIONES SE AJUSTARÁN A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE OPERACIÓN DEL RAMO 33.

SEXTO. - ENVÍESE ESTE ACUERDO Y LA INFORMACION DERIVADA DEL MISMO, AL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LA FEDERACION.

SÉPTIMO. - DENTRO DE LOS 10 SIGUIENTES DIAS A LA TERMINACION DE LAS OBRAS, GÍRESE AL GOBIERNO DEL ESTADO, Y A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y A LA FEDERACION, EL ACTA DE TERMINACION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES.

ALTAR, SONORA, A 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022

H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

EL SECRETARIO MUNICIPAL



L.E. BEATRIZ ADRIANA CORELLA CELAYA

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA
ALTAR, SONORA. EJERCICIO 2022**

**NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR
LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO**

MUNICIPIO: ALTAR, SONORA

LOCALIDAD: ALTAR

PROGRAMA: VIVIENDA

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCION

FECHA DE INICIO: 28/11/22

FECHA DE TERMINACION: 30/12/22

COSTO TOTAL: \$88,389.81

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSION (PESOS)

FISM: \$88,389.81

BENEFICIARIOS: MATERIALES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CONSISTENTE EN 20 ML DE CIMENTACION A BASE DE ZAPATA CORRIDA, MUROS DE BLOCK 15X20X40, CADENAS Y CASTILLOS REFORZADOS CON ARMEX ARMADO, ADEMAS DE TERCHO DE LAMINA GALVANIZADA Y POLINERIA, CONSTRUCCION DE FIRMES DE CONCRETO, INSTALACION ELECTRICA, Y ENJARRES INTERIORES A BASE DE MORTERO ARENA. E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS



PRINCIPALES RUBROS DE INVERSIÓN: ADQUISICION DE MATERIALES, Y MANO DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$88,389.81

CROQUIS DE LOCALIZACION



**METAS BENEFICIOS: 1 VIVIENDA
BENEFICIARIOS: 1 FAMILIA**

LOS ABAJO FIRMANTES HACEMOS CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EN LOS REFERENTES A NORMAS, FACTIBILIDAD ECONOMICA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL POR LO ANTERIOR SE COMPROMETEN A EJECUTAR CONFORME A LAS MISMAS.

LA DEPENDENCIA EJECUTORA

REPRESENTANTE

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE A. ESPINOZA LIMON

**ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2021-2024**

ALTAR SONORA

25 DE NOVIEMBRE DEL 2022



PRESUPUESTO



NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR
LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO

LOCALIDAD: ALTAR

MUNICIPIO: ALTAR, SONORA

CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE
MATERIALES				
BLOC CONCRETO 15X20X40	PZA	200.0	\$18.51	\$3,702.00
CLAVO COMUN CON CABEZA 2 1/2"	KG	1.0	\$51.48	\$51.48
ALAMBRE RECOCIDO CAL 16	KG	2.0	\$37.93	\$75.86
CASTILLOS FORMADOS DE 15X20 CM 6 MTS, 4 LADOS	PZA	10.0	\$250.05	\$2,500.50
MALLA PARA ZAPATA 15X20 EXTENDIDA	PZA	4.0	\$240.61	\$962.44
CAJA OCTAGONAL 4"	PZA	3.0	\$27.69	\$83.07
CONTACTO DUPLEX POLARIZADO	PZA	3.0	\$17.12	\$51.36
PLACA ARMADA CONTACTO E INTERRUPTOR BLANCO	PZA	1.0	\$60.76	\$60.76
PIJA ESTRUCTURAL 1"	PZA	150.0	\$1.21	\$181.50
PLACA ARMADA 2 INTERRUPTORES SENCILLOS BLANCO	PZA	1.0	\$62.73	\$62.73
MANGUERA NEGRA 1/2"	ML	40.0	\$5.32	\$212.80
ROSETA DE PORCELANA 4"	PZA	3.0	\$20.60	\$61.80
CAJA CHALUPA GALVANIZADA 1 7/8 X 1/2	PZA	5.0	\$24.46	\$122.30
CINTA AISLANTE COLOR NEGRO	PZA	1.0	\$14.90	\$14.90
PLACA PARA CONTACTO DUPLEX MARFIL	PZA	3.0	\$7.05	\$21.15
POLIN PINTADO 6 MTS X 6"	PZA	4.0	\$970.41	\$3,881.64
POLIN PINTADO 6 MTS X 4"	PZA	2.0	\$828.11	\$1,656.22
CABLE ELECTRICO CALIBRE #12 ROJO	ML	50.0	\$16.22	\$811.00
CABLE ELECTRICO CALIBRE #12 BLANCO	ML	50.0	\$12.43	\$621.50
VENTANA 1X1 METALICA	PZA	1.0	\$2,255.56	\$2,255.56
PUERTA METALICA DUELA COMPLETA .90 X 2 MTS	PZA	1.0	\$5,370.37	\$5,370.37
VENTANA DE BAÑO .40 X .60 MTS METALICA	PZA	1.0	\$1,396.29	\$1,396.29
TOTAL DE MATERIALES				\$24,157.23
MANO DE OBRA				
CONSTRUCCION DE CIMENTACION (INCLUYE EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 3 CMS, ARMEX DESTENDIDO DE 15X20 AHOGADO EN 10 CMS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, 1 VUELTA DE BLOCK 15X20X40 RELLENOS DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 Y CADENA DE DESPLANTE ARMADA CON ARMEX 15X20 Y CONCRETO DE FC=150 KG/CM2, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	MI	20	\$450.00	\$9,000.00
CONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK 15X20X40, PEGADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA.	PZA	600	\$18.00	\$10,800.00
CONSTRUCCION DE DALAS Y CASTILLOS DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 150 KG/CM2 REFORZADO ARMEX 15X20 INCLUYE CIMBRA.	ML	35	\$200.00	\$7,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA CAL 28. SOSTENIDA CON POLÍN MONTEN 4". INCLUYE; PRETILES, PIJAS AUTOSCABLES, CORTES, TRASLAPES	M2	20	\$250.00	\$5,000.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME TERMINACION PULIDO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE 150 KG/CM2.	M2	15	\$200.00	\$3,000.00
ENJARRE DE MUROS A BASE DE CAL-ARENA, EN ACABADO FINO	M2	103	\$180.00	\$18,540.00
COLOCACIÓN DE PINTURA BLANCA VINÍLICA EN MUROS A DOS MANOS	M2	103	\$40.00	\$4,120.00
INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 2 UNIDADES, INCLUYE RANURA Y RESANE	SALIDA	1	\$500.00	\$500.00

COLOCACION, CABLEADO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, INCLUYE RANURADO, Y RESANE.	SALIDA	2	\$250.00	\$500.00
COLOCACION, CABLEADO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS, INCLUYE RANURADO, Y RESANE.	SALIDA	3	\$250.00	\$750.00
COLOCACION, CABLEADO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ROSETA.	SALIDA	3	\$250.00	\$750.00
COLOCACION DE PUERTA METALICA A BASE DE PERFIL TUBULAR Y DUELA. 0.90 X 2 MTS	PZA	1	\$1,040.00	\$1,040.00
COLOCACION DE VENTANA METALICA DE BAÑO .40 X .60 MTS	PZA	1	\$500.00	\$500.00
COLOCACION DE VENTANA DE PERFIL METALICO DE 1X1 MTS	PZA	1	\$800.00	\$800.00
TOTAL MANO DE OBRA				\$62,300.00
SUBTOTAL				\$86,457.23
Iva 8%				\$1,932.58
Total				\$88,389.81

DEPENDENCIA RESPONSABLE
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2021-2024



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PROGRAMA DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO
Inicio: 28 de Noviembre / Termino: 30 de Diciembre
MUNICIPIO: ALTAR, SONORA

LOCALIDAD: A ALTAR

GRUPO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES	Octubre				Noviembre				Diciembre			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
CONSTRUCCION DE CIMENTACION (INCLUYE EXCAVACION; PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 3 CMS, ARMEX DESTENDIDO DE 15X20 AHOGADO EN 10 CMS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, 1 VUELTA DE BLOCK 15X20X40 RELLENOS DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 Y CADENA DE DESPLANTE ARMADA CON ARMEX 15X20 Y CONCRETO DE FC=150 KG/CM2, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE												
CONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK 15X20X40, PEGADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA.												
CONSTRUCCION DE DALAS Y CASTILLOS DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 150 KG/CM2 REFORZADO ARMEX 15X20 INCLUYE CIMERA.												
CONSTRUCCION DE TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA CAL 28. SOSTENIDA CON POLIN MONTEN 4". INCLUYE; PRETILES, PIJAS AUTO ROSCABLES, CORTES, TRASLAPES												
CONSTRUCCION DE PISO FIRME TERMINACION PULIDO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE 150 KG/CM2.												
ENJARRE DE MUROS A BASE DE CAL-ARENA, EN ACABADO FINO												
COLOCACION DE PINTURA BLANCA VINÍLICA EN MUROS A DOS MANOS												
INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 2 UNIDADES, INCLUYE RANURA Y RESANE												
COLOCACION, CABLEADO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, INCLUYE RANURADO, Y RESANE.												
COLOCACION, CABLEADO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS, INCLUYE RANURADO, Y RESANE.												
COLOCACION, CABLEADO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ROSETA												
COLOCACION DE PUERTA METALICA A BASE DE PERFIL TUBULAR Y DUELA. 0.90 X 2 MTS												
COLOCACION DE VENTANA METALICA DE BAÑO .40 X .60 MTS												
COLOCACION DE VENTANA DE PERFIL METALICO DE 1X1 MTS												

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON.

ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2021-2024



JUSTIFICACION DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO

LOCALIDAD: ALTAR

MUNICIPIO: ALTAR, SON.

Es de gran importancia debido a que con este dormitorio se les dará un espacio digno, se abatirá el hacinamiento y se dará una mejor calidad de vida a sus ocupantes, quienes son de escasos recursos, y no tienen la oportunidad para cubrir las necesidades más básicas como alimentación y vestido.


C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMÓN.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.





25 DE NOVIEMBRE DEL 2022
ALTAR, SONORA

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE**

DESIGNACIÓN RESIDENTE DE OBRAS

Por medio de la presente y a fines de los interesados me permito hacer de su conocimiento que se designa como **Residente de obras** del H. Ayuntamiento de Altar, Sonora, en obras de "administración directa" al **C. Jorge Arsenio Espinoza Limón**, para que supervise la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO"**

Sin más por el momento me despido con un cordial saludo.

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024
C.P LUIS ALONSO TRASLAVINA MIRANDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION
GOBIERNO GUBERNAMENTAL
ALTAR, SONORA

C.C.P.ARCHIVO

SUMINISTRO DE MATERIALES

FAISM 2022

AYUNTAMIENTO DE ALTAR



OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO

No.	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	Octubre				Noviembre				Diciembre			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	BLOC CONCRETO 15X20X40	PZA	200.0												
2	CLAVO COMUN CON CABEZA 2 1/2"	KG	1.0												
3	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16	KG	2.0												
4	CASILLLOS FORMADOS DE 15X20 CM 6 MTS. 4 LADOS	PZA	10.0												
5	MALLA PARA ZAPATA 15X20 EXTENDIDA	PZA	4.0												
6	CAJA OCTAGONAL 4"	PZA	3.0												
7	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO	PZA	3.0												
8	PLACA ARMADA CNTACTO E INTERRUPTOR BLANCO	PZA	1.0												
9	PIJA ESTRUCTURAL 1"	PZA	150.0												
10	PLACA ARMADA 2 INTERRUPTORES SENCILLOS BLANCO	PZA	1.0												
11	MANGUERA NEGRA 1/2"	ML	40.0												
12	ROSETA DE PORCELANA 4"	PZA	3.0												
13	CAJA CHALUPA GALVANIZADA 1 7/8 X 1/2	PZA	5.0												
14	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO	PZA	1.0												
15	PLACA PARA CONTACTO DUPLEX MARFIL	PZA	3.0												
16	POLIN PINTADO 6 MTS X 6"	PZA	4.0												
17	POLIN PINTADO 6 MTS X 4"	PZA	2.0												
18	CABLE ELECTRICO CALIBRE #12 ROJO	ML	50.0												
19	CABLE ELECTRICO CALIBRE #12 BLANCO	ML	50.0												
20	VENTANA 1X1 METALICA	PZA	1.0												
21	PUERTA METALICA DUELA COMPLETA 50 X 2 MTS	PZA	1.0												
22	VENTANA DE BAÑO .40 X .60 MTS METALICA	PZA	1.0												

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2021-2024



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO	
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES	
1	28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2022	CONSTRUCCION DE 20 ML DE CIMENTACION A BASE DE ZAPATA CORRIDA, Y CONSTRUCCION DE 150 PZA DE BLOCK PARA MUROS A BASE DE BLOCK DE CONCRETO	
2	05 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2022	CONSTRUCCION DE 450 PZA DE BLOCK PARA MUROS A BASE DE BLOCK DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE 18 ML DE DALAS Y CASTILLOS	
3	12 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022	CONSTRUCCION DE 17 ML DE DALAS Y CASTILLOS. CONSTRUCCION DE 20 M2 DE TECHO A BASE DE LAMINA Y POLINEARIA, 15 M2 DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON ACABADO FINO Y 1.66 M2 DE APLANADOS EN MUROS INTERIORES	
4	19 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022	65 M2 DE APLANADOS EN MUROS INTERIORES, Y EXTERIORES	
5	26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	36.34 M2 DE APLANADOS EN MUROS INTERIORES, 103 M3 COLOCACIÓN DE PINTURA BLANCA , INSTALACION ELECTRICA, PUERTAS Y VENTANAS	

SUPERVISION

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA GONZALEZ



REVISO

CONTRALORIA MUNICIPAL

C.P LUIS ALONSO TRASLAVINA MIRANDA



FAISM 2022

FINIQUITO DE OBRA



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO										FECHA:							
DOMICILIO: CAMINO A LLANO BLANCO BARRIO DE ABAJO		ALTAR, SONORA								31 DE DICIEMBRE DE 2022							
LOCALIDAD: ALTAR																	
FECHA DE INICIO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 N° DE OBRA:336438 N° BENEFICIARIOS; 1 FAMILIAS		ESTRUCTURA FINANCIERA															
		META OPEI 1 VIVIENDA					COSTO TOTAL					FAISM		MUNICIPAL		ESTATAL	
		SUBPROGR VIVIENDA					\$88,389.81					88,389.81		0.00		0.00	
		MODALIDAD Administracion Directa TIEMPO DE 33 Dias Naturales															
CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	EJERCIDO CANTIDAD	IMPORTE	DIFERENCIA CANTIDAD	IMPORTE						
	BLOC CONCRETO 15X20X40	PZA	200.0	\$18.51	\$ 3,702.00	200.00	\$ 3,702.00		\$ 3,702.00	0.00	0.00						
	CLAVO COMUN CON CABEZA 2 1/2"	KG	1.0	\$51.48	\$ 51.48	1.00	\$ 51.48		\$ 51.48	0.00	0.00						
	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16	KG	2.0	\$37.93	\$ 75.86	2.00	\$ 75.86		\$ 75.86	0.00	0.00						
	CASTILLOS FORMADOS DE 15X20 CM 6 MTS, 4 LADOS	PZA	10.0	\$250.05	\$ 2,500.50	10.00	\$ 2,500.50		\$ 2,500.50	0.00	0.00						
	MALLA PARA ZAPATA 15X20 EXTENDIDA	PZA	4.0	\$240.61	\$ 962.44	4.00	\$ 962.44		\$ 962.44	0.00	0.00						
	CAJA OCTAGONAL 4"	PZA	3.0	\$27.69	\$ 83.07	3.00	\$ 83.07		\$ 83.07	0.00	0.00						
	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO	PZA	3.0	\$17.12	\$ 51.36	3.00	\$ 51.36		\$ 51.36	0.00	0.00						
	PLACA ARMADA CNTACTO E INTERRUPTOR BLANCO	PZA	1.0	\$60.76	\$ 60.76	1.00	\$ 60.76		\$ 60.76	0.00	0.00						
	PIJA ESTRUCTURAL 1"	PZA	150.0	\$1.21	\$ 181.50	150.00	\$ 181.50		\$ 181.50	0.00	0.00						
	PLACA ARMADA 2 INTERRUPTORES SENCILLOS BLANCO	PZA	1.0	\$62.73	\$ 62.73	1.00	\$ 62.73		\$ 62.73	0.00	0.00						
	MANGUERA NEGRA 1/2"	ML	40.0	\$5.32	\$ 212.80	40.00	\$ 212.80		\$ 212.80	0.00	0.00						
	ROSETA DE PORCELANA 4"	PZA	3.0	\$20.60	\$ 61.80	3.00	\$ 61.80		\$ 61.80	0.00	0.00						
	CAJA CHALUPA GALVANIZADA 1 7/8 X 1/2	PZA	5.0	\$24.46	\$ 122.30	5.00	\$ 122.30		\$ 122.30	0.00	0.00						
	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO	PZA	1.0	\$14.90	\$ 14.90	1.00	\$ 14.90		\$ 14.90	0.00	0.00						
	PLACA PARA CONTACTO DUPLEX MARFIL	PZA	3.0	\$7.05	\$ 21.15	3.00	\$ 21.15		\$ 21.15	0.00	0.00						
	POLIN PINTADO 6 MTS X 6"	PZA	4.0	\$970.41	\$ 3,881.64	4.00	\$ 3,881.64		\$ 3,881.64	0.00	0.00						
	POLIN PINTADO 6 MTS X 4"	PZA	2.0	\$828.11	\$ 1,656.22	2.00	\$ 1,656.22		\$ 1,656.22	0.00	0.00						
	CABLE ELECTRICO CALIBRE #12 ROJO	ML	50.0	\$16.22	\$ 811.00	50.00	\$ 811.00		\$ 811.00	0.00	0.00						
	CABLE ELECTRICO CALIBRE #12 BLANCO	ML	50.0	\$12.43	\$ 621.50	50.00	\$ 621.50		\$ 621.50	0.00	0.00						
	VENTANA 1X1 METALICA	PZA	1.0	\$2,255.56	\$ 2,255.56	1.00	\$ 2,255.56		\$ 2,255.56	0.00	0.00						
	PUERTA METALICA DUELA COMPLETA .90 X 2 MTS	PZA	1.0	\$5,370.37	\$ 5,370.37	1.00	\$ 5,370.37		\$ 5,370.37	0.00	0.00						
	VENTANA DE BAÑO .40 X .60 MTS METALICA	PZA	1.0	\$1,396.29	\$ 1,396.29	1.00	\$ 1,396.29		\$ 1,396.29	0.00	0.00						
	TOTAL MATERIALES	SUBTOTAL					\$ 24,157.23		\$ 24,157.23	0.00	0.00						
		IMPORTE + IVA					\$ 26,089.81		\$ 26,089.81								

FINIQUITO DE OBRA



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO										FECHA:	
DOMICILIO: CAMINO A LLANO BLANCO BARRIO DE ABAJO										31 DE DICIEMBRE DE 2022	
LOCALIDAD: ALTAR		ALTAR, SONORA									
CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO			EJERCIDO			DIFERENCIA			
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
		META OPEI 1 VIVIENDA			ESTRUCTURA FINANCIERA						
		SUBPROGR VIVIENDA			COSTO TOTAL		FAISM		MUNICIPAL	ESTATAL	
		MODALIDAD Administración Directa			\$88,389.81		88,389.81		0.00	0.00	
								</			

FAISM 2022

FINIQUITO DE OBRA



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO		FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2022				
DOMICILIO: CAMINO A LLANO BLANCO BARRIO DE ABAJO		ALTAR, SONORA				
LOCALIDAD: ALTAR		ESTRUCTURA FINANCIERA				
FECHA DE INICIO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022		COSTO TOTAL				
N° DE OBRA: 336438		88,389.81				
N° BENEFICIARIOS: 1 FAMILIAS		0.00				
PRESUPUESTO		DIFERENCIA				
CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	COLOCACION DE VENTANA METALICA DE BAÑO 40 X .60 MTS	PZA	1	\$ 500.00	0.00	0.00
	COLOCACION DE VENTANA DE PERFIL METALICO DE 1X1 MTS	PZA	1	\$ 800.00	0.00	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				\$ 62,300.00	0.00	0.00
		IMPORTE DE OBRA		\$88,389.81		
		IMPORTE EJERCIDO		\$88,389.81		
		SALDO		\$0.00		

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024


DIRECTOR DE OBRAS
JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMC
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

ORGANO DE CONTROL
C.P LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024



PLANOS
FAISM 2022
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR
LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO

PLANTA GENERAL

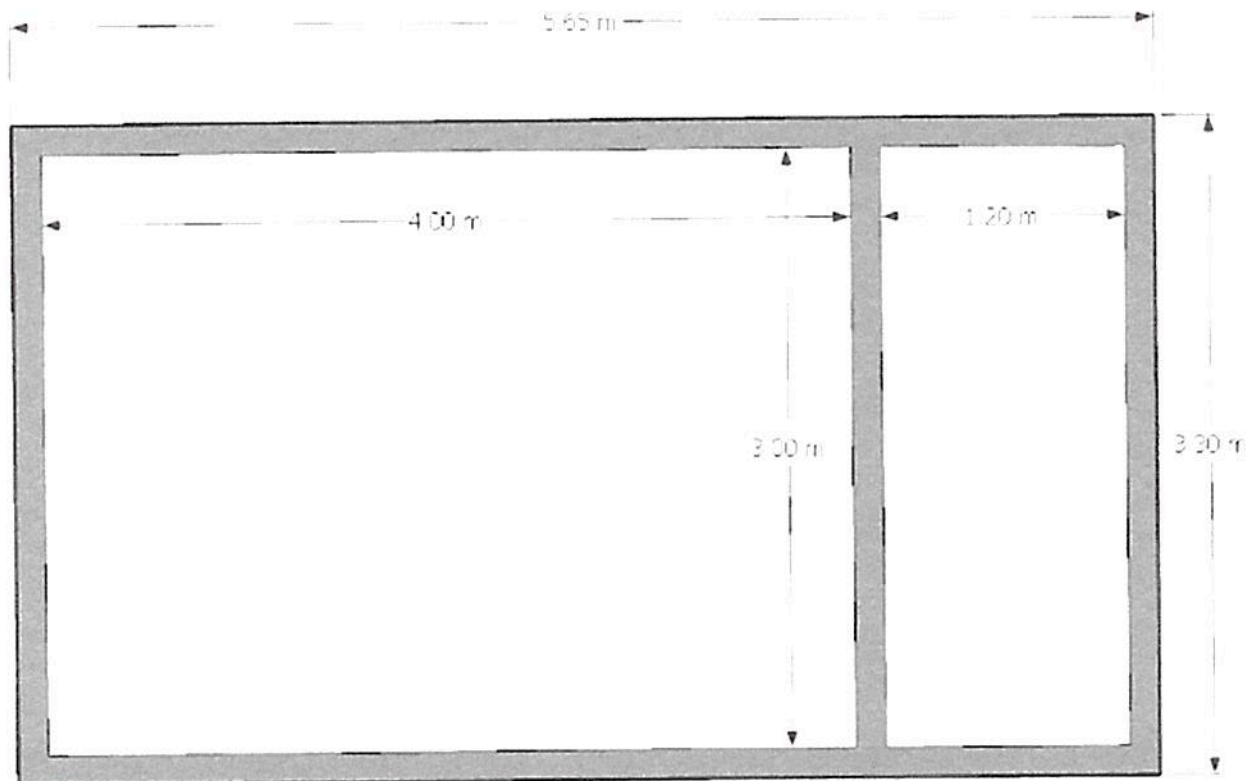


ATTESTACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



PLANOS
FAISM 2022
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR
LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO

PLANO ELECTRICO

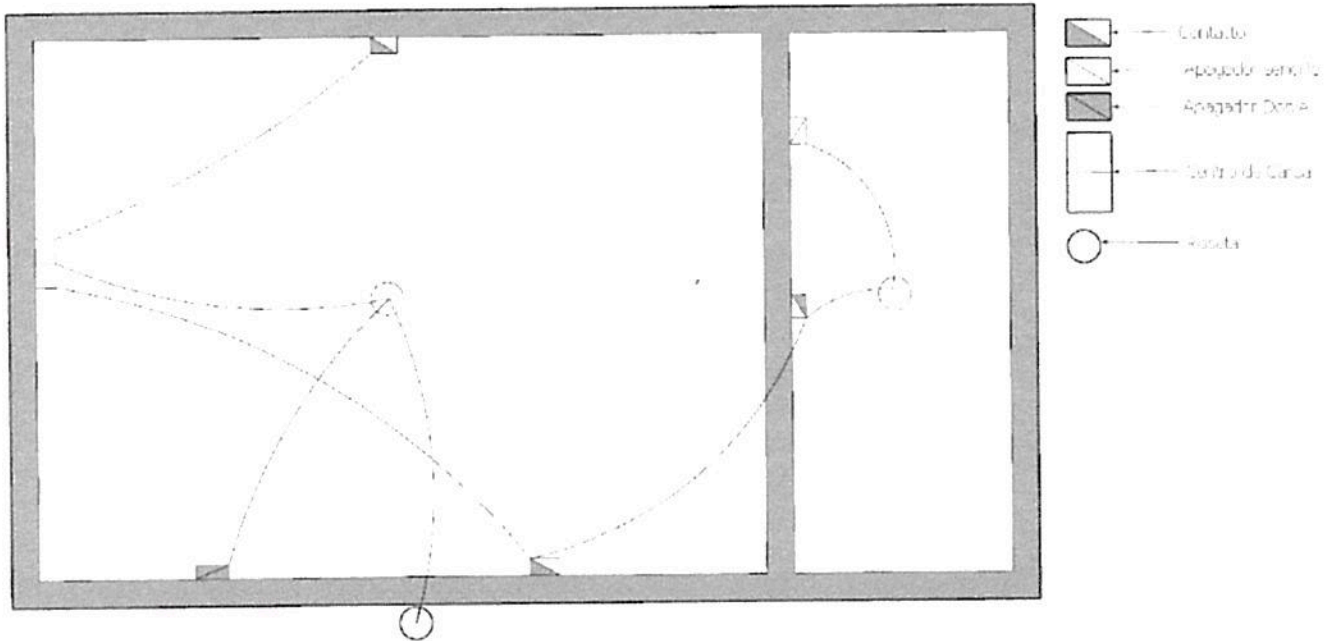

REGISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024


PLANOS
FAISM 2022
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR
LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO

CIMENTACION

Cadena de cimientos armada con Armex
15x20 cm concreto $f_c = 150 \text{ Kg/cm}^2$

2 Vueltas de Block de concreto
15x20x40 cms relleno de concreto $f_c = 100 \text{ Kg/cm}^2$

Armex extendido por anclaje
en 10 cms de concreto $f_c = 150 \text{ Kg/cm}^2$

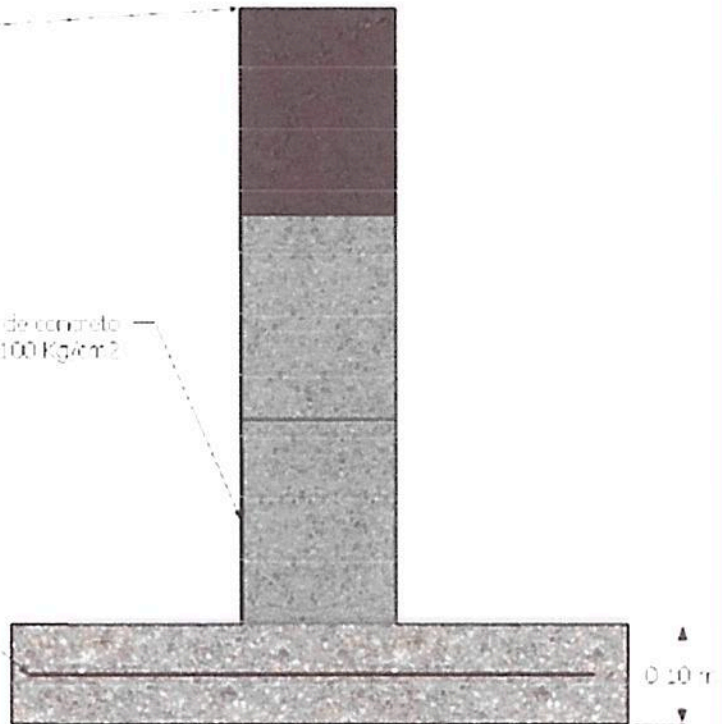


ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



PLANOS
FAISM 2022
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR
LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO


TECHO

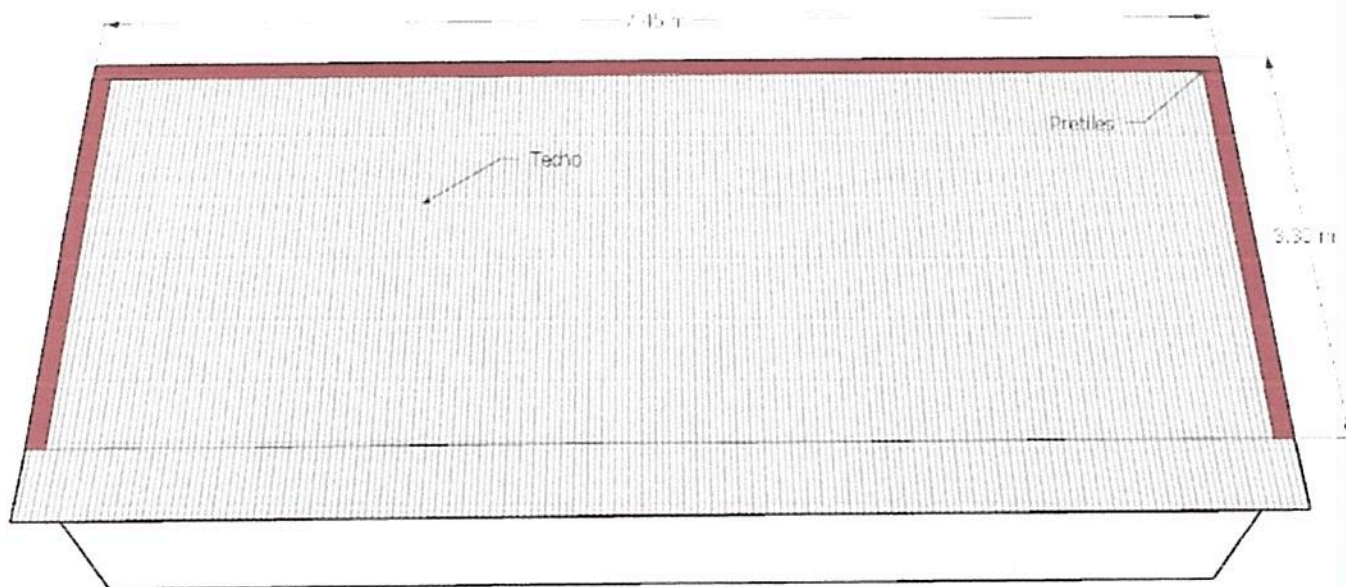

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

PLANOS
FAISM 2022
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR
LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO

MUROS

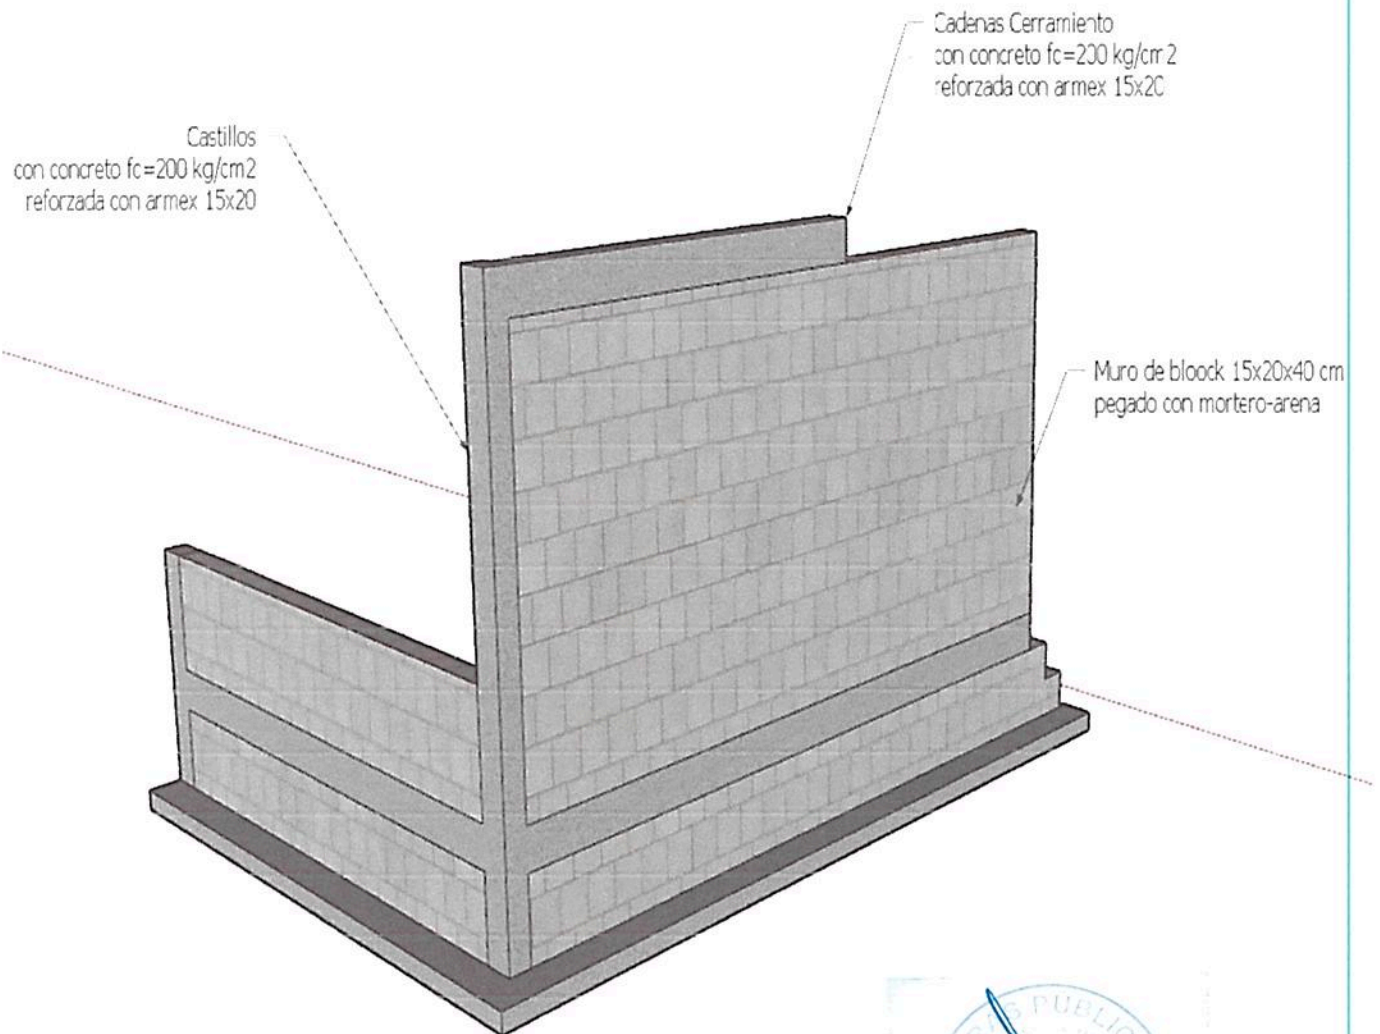

ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2021-2024

FOTOGRAFIAS FAISM 2022
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR
LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO





COMPROBACION DE GASTO

FAISM 2022

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO

Pago	Fecha	Destino	Concepto	cantidad
TRANSFERENCIA	23-dic-22	MARVIN EMANUEL HERNANDEZ CRUZ	OUERTA Y VENTANAS	\$ 9,744.00
TRANSFERENCIA	23-dic-22	VISION CCI STG S.A DE C.V	MATERIALES VARIOS	\$ 9,550.36
TRANSFERENCIA	08-dic-22	VISION CCI STG S.A DE C.V	MATERIALES VARIOS	\$ 2,797.29
TRANSFERENCIA	22-dic-22	VISION CCI STG S.A DE C.V	BLOCK	\$ 3,998.16
CHEQUE #033	03-dic-22	JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON	NOMINA 28 DE NOV AL 03 DE DICIEMBRE	\$ 11,700.00
CHEQUE #034	16-dic-22	JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON	NOMINA 05 AL 10 DE DICIEMBRE	\$ 11,700.00
CHEQUE #035	20-dic-22	JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON	NOMINA 12 AL 17 DE DICIEMBRE	\$ 11,700.00
CHEQUE #037	23-dic-22	JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON	NOMINA 19 AL 24 DE DICIEMBRE	\$ 11,700.00
CHEQUE #038	29-dic-22	JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON	NOMINA 26 AL 31 DE DICIEMBRE	\$ 15,500.00
				\$ 88,389.81



C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2021-2024

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/01/2023 11:17:38

Cuenta/ CLABE Ordenante	1176345522
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC o CURP del Ordenante	MAL840101S34
Moneda	MXP
ID Tercero	324
Nombre del Beneficiario	MARVIN EMANUEL HERNANDEZ CRUZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014773655091580430
RFC Beneficiario	HECM830107KH3
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$9,744.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	23/dic./2022
Número de Referencia	231222
Propósito de la Transferencia	cuarto dormitorio
Clave de Rastreo	8846APR2202212232054825947
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha Captura	23/dic./2022 11:44:12 a. m.
Ejecutó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha de Ejecución	23/dic./2022 11:44:58 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Uso CFDI:

HECM830107KH3
MARVIN EMANUEL HERNANDEZ CRUZ
MAL840101S34
MUNICIPIO DE ALTAR
Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AAA14A66-7D50-4BB0-BC08-357BB234C265
00001000000504465028
83753 2022-12-23 11:49:00
Ingreso
Régimen Simplificado de Confianza

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72152402		1	H87		2100.00	2100.00				
Descripción	Ventana de 1x1 metalica				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2100.00	Tasa	16.0000%	336.00
72152402		1	H87		5000.00	5000.00				
Descripción	Puerta metalica duela completa 90x2mts				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5000.00	Tasa	16.0000%	800.00
72152402		1	H87		1300.00	1300.00				
Descripción	Ventana de baño 40x60 mts metalica				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1300.00	Tasa	16.0000%	208.00

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Peso Mexicano
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Pago en una sola exhibición

Subtotal
Impuestos Traslados
Total

IVA 16.0000%
\$ 1,344.00
\$ 9,744.00

Sello digital del CFDI:
jzvXSzT1B6wNrXuiTyWuFXtXkAd2JkfazL1YDF8U7TG/zsHUyKbP4jsBzP+bvbqPttWqjPgHRIjtczkHB24H0wlf7w1XN/9WwzFPvzqKunhKLtO8wgt/RQ47CrrBaRwUx3J7K8wajOq4E8UdWIM9YeE3ceV3IRykyyWCajl0Bmo+Uzl1o0xEqroir3Z9xk5dkjKdVB1PUqQxN3mBd0Vq9WFWdWJrAhPjtlcWmAApO+UABQQBUXSv9Pm2LizZZXMEhXYbgXAEtEgMcOsUFT3/dIR/uJg27uYh5P6BW7zH2viiCU6CFrON+ICVNAAn1BU4BkRgAUe6UDKkYTKICgA==

Sello digital del SAT:
ouwHkNcaVWrr6daDz+ehReDUB/6Splf9X0Ww9wIN7e3MAhUYIOVyW5Z7j7ID5Q3qI9ndISrlr/leoq9Ypd5lrz+Z8tOCfWRWF9dqXociltPnCqAzTZQzIMZTKVPkbX2rqDXhMsvFMeM5QoXX0kyKRkxGinjjmV4aJV3b8fbCcVRMqnrlx+DxtKmgmmo2gBaKqM+3VTeQtlJbFmdgRPsXyly5XpedQAU4sRNSva4b1SPilzlrpCpJT3U9g1kmHuJpBJR/xkUZGECJIYdcmItAe2i/S6fybtra3mPngXdAlzMSy4GhJONsARck+BZF16PVJPnYp+Lr07REEKzefoWL6g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]AAA14A66-7D50-4BB0-BC08-357BB234C265[2022-12-23T11:52:05]SAT970701NN3[jzvXSzT1B6wNrXuiTyWuFXtXkAd2JkfazL1YDF8U7TG/zsHUyKbP4jsBzP+bvbqPttWqjPgHRIjtczkHB24H0wlf7w1XN/9WwzFPvzqKunhKLtO8wgt/RQ47CrrBaRwUx3J7K8wajOq4E8UdWIM9YeE3ceV3IRykyyWCajl0Bmo+Uzl1o0xEqroir3Z9xk5dkjKdVB1PUqQxN3mBd0Vq9WFWdWJrAhPjtlcWmAApO+UABQQBUXSv9Pm2LizZZXMEhXYbgXAEtEgMcOsUFT3/dIR/uJg27uYh5P6BW7zH2viiCU6CFrON+ICVNAAn1BU4BkRgAUe6UDKkYTKICgA=[00001000000504465028]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-12-23 11:52:05
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/01/2023 11:16:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	1176345522
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC Ordenante	MAL840101S34
Moneda	MXP
ID Tercero	09
Nombre del Beneficiario	VISION XXI STG S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0610258101
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC Beneficiario	VVS081231SR8
Importe a Transferir	\$9,550.36
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	23/dic./2022
Número de Referencia	231222
Propósito de la Transferencia	casa factura fa0263426
Clave de Rastreo	216
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha Captura	23/dic./2022 11:39:05 a. m.
Ejecutó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha de Ejecución	23/dic./2022 11:39:58 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.

C.P. 83620, H. CABORCA, SONORA.

TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO

C.P. 83750 ALTAR, SONORA

TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA

FA0263426

Tipo de Comprobante : Ingreso

CONDICIONES: CREDITO

Empleado: MANUEL HERNANDEZ

DATOS DEL TIMBRADO:

Certificado Emisor:

00001000000510013041

Certificado SAT:

00001000000504204971

Folio Fiscal:

60026A01-56C9-4E4F-B331-C5298AABA2F8

Fecha Timbrado:

2022-12-22T16:57:08

FERRETERIA ALTAR

ALTAR, SONORA. A 22 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Cliente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
Domicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750
Ciudad: ALTAR, SONORA
RFC: MAL840101S34

Clave	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
CO18	H87-Piez	3.0000	[39111539-Caja de iluminación] CAJA EL CTRICA OCTAGONAL GALVANIZADA DE 4" CALIBRE	27.69	83.07
ZZ15127	H87-Piez	3.0000	[39121522-Contactos eléctricos] CONTACTO DUPLEX POLARIZADO MARFIL	17.12	51.36
46455TRU	H87-Piez	1.0000	[39122200-Interruptores eléctricos y accesorios] PLACA ARMADA CONTACTO E INTERRUPTOR LINEA ITALIANA BLANCO	60.76	60.76
PE141	H87-Piez	150.0000	[31162800-Ferretería en general] PIJA ESTRUCTURAL COMPLETA DE 1	1.21	181.50
46461TRU	H87-Piez	1.0000	[31162800-Ferretería en general] PLACA ARMADA 2 INTERRUPTORES SENCILLOS ITALIANA BLANCO	62.73	62.73
MNE12	MTR-Metr	40.0000	[31162800-Ferretería en general] MANGUERA NEGRA DE 1/2"	5.32	212.80
PC4	H87-Piez	3.0000	[31162800-Ferretería en general] ROSETA DE POCELANA DE 4" PARA FOCO	20.60	61.80
30337ACE	H87-Piez	5.0000	[39121321-Ferretería y accesorios de caja eléctrica] CAJA CHALUPA GALVANIZADA 1 7/8" X 1/2"	24.46	122.30
12500TRU	H87-Piez	1.0000	[31201502-Cinta aislante eléctrica] CINTA AISLANTE COLOR NEGRO DE 19 MIL METROS X18 ME	14.90	14.90
FM6022	H87-Piez	3.0000	[23153035-Placa] PLACA PARA CONTACTO DUPLEX MARFIL 86003	7.05	21.15
15204	H87-Piez	4.0000	[20121114-Zapatillas de flotación] CASTILLOS FORMADOS DE 15 CM. X 20 CM. X 6 MTS. DE 4 LADOS	250.05	1,000.20
ZE46P	H87-Piez	2.0000	[30102304-Perfiles de acero] POLIN PINTADO 6 MTS. X 4" CALI	828.11	1,656.22
3P	H87-Piez	4.0000	[11101704-Acero] POLIN PINTADO 6 MTS. X 6" CALI	970.41	3,881.64
THW12R	H87-Piez	50.0000	[26121600-Cables eléctricos y accesorios] CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 12 COLOR ROJO	16.22	811.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||60026A01-56C9-4E4F-B331-C5298AABA2F8|2022-12-22T16:57:08|oeVpG3mZ8SdQgVZL1m5DS8kcYsbwls8H5/TD2Nbye+/ppeQEbkE+43Ehlt6KAsV7bh2YhGHIGX4wN6DGaSVVKFpgyhVvda9lgwnqvFTJtRSdb/5BOYpp1YURd/HD7zDhMI5eFYL+SbCr+qDtuWnkaxW4vofvB2OhWDQAEQQHBC1dLzTOrVnLwbZ4Rgd7bZKIRYmc5fAeJCvLUArlwaeIEJd750jxrmqqrJunEJkLAIULAGxH1udVTZNclnCFV577FNqT2ry1GkKgOvfiXKQvJWIKKE5mFheHlyhW04JEXYCYzHX+b6d8GIX0trRepPteeXq9VbxDFQ3VvA==||00001000000504204971||

Sello Digital del SAT:

oeVpG3mZ8SdQgVZL1m5DS8kcYsbwls8H5/TD2Nbye+/ppeQEbkE+43Ehlt6KAsV7bh2YhGHIGX4wN6DGaSVVKFpgyhVvda9lgwnqvFTJtRSdb/5BOYpp1YURd/HD7zDhMI5eFYL+SbCr+qDtuWnkaxW4vofvB2OhWDQAEQQHBC1dLzTOrVnLwbZ4Rgd7bZKIRYmc5fAeJCvLUArlwaeIEJd750jxrmqqrJunEJkLAIULAGxH1udVTZNclnCFV577FNqT2ry1GkKgOvfiXKQvJWIKKE5mFheHlyhW04JEXYCYzHX+b6d8GIX0trRepPteeXq9VbxDFQ3VvA==

Sello Digital del Emisor:

Pmw+wzalpduy/1EpLOWWzheBEIRE804++J5nAXCVP/YepcAcVj+5/EdlyPshPgGu6BzP0i8VNZDK1HT3tcA28gsmHend8/LZC6Wl+dawB013WhOskQ2+ZxeX+GxyOfQYCRFD2o oBqToDmD1KXBNvCAWMMQ4W5tjxIGJ8GcQj/1es38PD4PdY9Yaq5Upf96KGikAY/Azaa/SyO4kNWwTvbTpD/Fmw3lwOZkvHUQg/NH1A+3P2xfzkZN+klkfaX+WQhwP9IEwe87 YVeHStau5MmOLLMMw6z2tFtUWVCh/O1aWhct6FZRR8dV9Cj3ts4qWDpayLCQ2iKxpCao5Q==



Estimado Cliente: "El tiempo máximo de resguardo de sus materiales en almacen será de 90 días."

NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 36/100 M.N.

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

UsoCFDI: G03

Forma de Pago: 99.

PAGARE No. FA0263426.

BUENO POR \$9,550.36

EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 22 de DICIEMBRE del 2022.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a: VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 21 de ENERO del 2023, la cantidad de \$9,550.36 (NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 36/100 M.N.) valor o importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34

DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N

CIUDAD: ALTAR

SUScriptor y AVAL

FA0263426

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 2.

Pago en una sola exhibición. Toda Devolución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

22/12/2022 03:57:09p. m.



VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.

C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.

TEL 0(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 0(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO

C.P. 83750 ALTAR, SONORA

TEL 0(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA

FA0263426

Tipo de Comprobante : Ingreso

CONDICIONES: CREDITO

Empleado: MANUEL HERNANDEZ

DATOS DEL TIMBRADO:

Certificado Emisor:

00001000000510013041

Certificado SAT:

00001000000504204971

Folio Fiscal:

60026A01-56C9-4E4F-B331-C5298AABA2F8

Fecha Timbrado:

2022-12-22T16:57:08

FERRETERIA ALTAR

ALTAR, SONORA. A 22 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Cliente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR

Domicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

Ciudad: ALTAR, SONORA

RFC: MAL840101S34

Clave	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
THW12B	MTR-Metr o	50.0000	[26121600-Cables eléctricos y accesorios] CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 12 COLOR BLANCO	12.43	621.50

Fismon
Castro

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|60026A01-56C9-4E4F-B331-C5298AABA2F8|2022-12-22T16:57:08|oeVpG3mZ8SdQgvZL1im5DS8kcYsbwls8H5/TD2Nbye+/ppeQEbk+43Ehlt6KAsV7bh2YhGHlGX4wN6DGaSVVKFpgyhVVda9lgwnqvFTJtRSdb/5BOYpp1YURd/HD7zDhM5eFYl+SbCr+qDtuWnkaxW4vofvB2OhWQAEQHBc1dLzTOWhLwbZ4Rgd7bZKIRYmc5fAeJCvLUaLrLwaelEJd750jxrMqqbrJunEJkLAIULAGxH1udVTZNclnCFV577FNqT2ry1GkKgOvIXKQvJWIKKE5mFheHYyhW04JEXYCHX+b6d8GIX0trRepTeeXq9VbxDfQ3VvA==[00001000000504204971]

Sello Digital del SAT:

oeVpG3mZ8SdQgvZL1im5DS8kcYsbwls8H5/TD2Nbye+/ppeQEbk+43Ehlt6KAsV7bh2YhGHlGX4wN6DGaSVVKFpgyhVVda9lgwnqvFTJtRSdb/5BOYpp1YURd/HD7zDhM5eFYl+SbCr+qDtuWnkaxW4vofvB2OhWQAEQHBc1dLzTOWhLwbZ4Rgd7bZKIRYmc5fAeJCvLUaLrLwaelEJd750jxrMqqbrJunEJkLAIULAGxH1udVTZNclnCFV577FNqT2ry1GkKgOvIXKQvJWIKKE5mFheHYyhW04JEXYCHX+b6d8GIX0trRepTeeXq9VbxDfQ3VvA==

Sello Digital del Emisor:

Pmw+wzalpduy1EpLOWzhebEIRE804++J5nAXCVp/YepcAcWj+5/Ed/yPshPvGu6BzP0t8VNZDk1HT3tcA28gismHend8/LZC6W+dawB013WhOskQ2+ZxeX+Gxy0fQYCRFD2o oBqToDmD1KXBnvCAWMM04W6tjxIGJ8GcQj1es38PD4PdY9Yaq5Upf96KGiKAY/Azaa/Sy04kNWcrTvbTpDfMw3lw0ZikvHUQgfnH1A+3P2xfzkZN+klkfaX+WQhwP9IEwe87 YVeHStau8MmOLLMMw6z2TnFTUWC4/Q1aWhct6FZRR8dV9C3t4qWdpayLCQ2iKpCqo5Q==



Estimado Cliente : "El tiempo máximo de resguardo de sus materiales en almacen será de 90 días."

NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 36/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido

UsoCFDI: G03

Forma de Pago: 99.

PAGARE No. FA0263426. BUENO POR \$9,550.36
EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 22 de DICIEMBRE del 2022.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 21 de ENERO del 2023, la cantidad de \$9,550.36 (NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 36/100 M.N) valor o importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34

SECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N

CIUDAD: ALTAR

Subtotal	8,842.93
	0.00
IVA	707.43
TOTAL	9,550.36

SUSCRIPTORY AVAL

FA0263426

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 2 de 2.

Pago en una sola exhibición. Toda Devolución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

22/12/2022 03:57:09p. m.



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

08/12/2022 10:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	1176345522
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC Ordenante	MAL840101S34
Moneda	MXP
ID Tercero	09
Nombre del Beneficiario	VISION XXI STG S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0610258101
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC Beneficiario	VVS081231SR8
Importe a Transferir	\$2,797.29
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	08/12/2022
Número de Referencia	081222
Propósito de la Transferencia	cuarto dormitorio fact fa0261457
Clave de Rastreo	207
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha Captura	08/12/2022 10:38:13 a. m.
Ejecutó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha de Ejecución	08/12/2022 10:38:34 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO POR FAISM

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



SOCOADA
SOMOS TU OESTE...

FERRETERIA ALTAR

SONORA, A 08 DE DICIEMBRE DEL 2022.

VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.

C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.

TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO

C.P. 83750 ALTAR, SONORA

TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA

FA0261457

Tipo de Comprobante : Ingreso

CONDICIONES: CONTADO

Empleado: RAMON ESTEBAN AHUMADA GAMBOA

DATOS DEL TIMBRADO:

Certificado Emisor:

00001000000510013041

Certificado SAT:

00001000000504204971

Folio Fiscal:

ABA27F70-CD47-4366-9FE8-FAA746E080B

Fecha Timbrado:

2022-12-08T09:32:28

Cliente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
Domicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

Ciudad: ALTAR, SONORA
RFC: MAL840101S34

Clave	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
CCC212	KGM-Kilo	1.0000	[31162002-Clavos de sombrerete] CLAVO COMÚN CON CABEZA DE 2 1/2". KILO	51.48	51.48
AR16	KGM-Kilo	2.0000	[30264305-Alambre de acero electro galvanizado] ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16	37.93	75.86
15204	H87-Pieza	6.0000	[20121114-Zapatillas de flotación] CASTILLOS FORMADOS DE 15 CM. X 20 CM. X 6 MTS. DE 4 LADOS	250.05	1,500.30
15204E	H87-Pieza	4.0000	[20121114-Zapatillas de flotación] MALLA PARA ZAPATA 15X20 EXTEND	240.61	962.44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ABA27F70-CD47-4366-9FE8-FAA746E080B|2022-12-08T09:32:28|G9Uv0LVN83Pp9xg743gS5ASkYk9UXJUf1mn7nws8LRSvMAEyGX5hb6ENnnhJNdlYkNS0Y+L5B89Y69Xhc+VriW5G7iqsCPM84Z+0ENZcOU4X7m/OrdqZX1pe4H1WuLuXbOQzIjowZxylvo4XDn1sTsnRj6HFwNc8CPmz4uP9CfzNcalDQTR2z9A1XA2vW5mJP2Qw8TOcuC8Rrc+mm0x3tgcAnk/J3Z+9v2EioYFcD68XPMJ4Y1ObbpDteJM5jKn26R4e12gbBc+JJ2N+2zWAV7he1cFckK1J1w8j2b8x4LdH54QbXFq0nZ2J1JlywPvmYcXwSQFOw8rd88nw==||00001000000504204971|

Sello Digital del SAT:

G9Uv0LVN83Pp9xg743gS5ASkYk9UXJUf1mn7nws8LRSvMAEyGX5hb6ENnnhJNdlYkNS0Y+L5B89Y69Xhc+VriW5G7iqsCPM84Z+0ENZcOU4X7m/OrdqZX1pe4H1WuLuXbOQzIjowZxylvo4XDn1sTsnRj6HFwNc8CPmz4uP9CfzNcalDQTR2z9A1XA2vW5mJP2Qw8TOcuC8Rrc+mm0x3tgcAnk/J3Z+9v2EioYFcD68XPMJ4Y1ObbpDteJM5jKn26R4e12gbBc+JJ2N+2zWAV7he1cFckK1J1w8j2b8x4LdH54QbXFq0nZ2J1JlywPvmYcXwSQFOw8rd88nw==

Sello Digital del Emisor:

||dT5ozRZTFOQ38KlrcvBj|OBEgwqCxESE34rVxcYx9G1amVmA2pXF+0DW40tVBAiyB6BSXijlIAstikKyvgVwzQ6lkQOQnk4RAEDDfdqF5HXdyQy4EvHKpT7q9JYCMGwnqxnPh6xaZ2TH2SaXv5Qr2Bie4T3Zd7wLvkEaj8HVpsvOaiux4UMSwe2Jl7mrSp4aroei+Cdv0GFC0+DmyYLLju7naigzYnvcUlrN5vgWvaAbmOVZ6I2i+6+xpuvuCs8IRFyLGDZB1Vlbq6CA22D6VWVKk/+Szmu/47gKJXIH2h2G5ZQLvX+J1nw+9DK8o2Zf8zB5WD1rA==



Estimado Cliente : "El tiempo máximo de resguardo de sus materiales en almacen será de 90 días."

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N

Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición

UsoCFDI: G03

Forma de Pago: 01.

PAGARE No. FA0261457. BUENO POR \$2,797.29
EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 08 de DICIEMBRE del 2022.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 08 de DICIEMBRE del 2022, la cantidad de \$2,797.29 (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N) valor o importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este título a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34
DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N
CIUDAD: ALTAR

Subtotal	2,590.08
	0.00
IVA	207.21
TOTAL	2,797.29

SUScriptor Y AVAL

FA0261457

Página 1 de 1.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para su uso en una sola exhibición. Toda Devolución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

08/12/2022 08:32:32a.m.

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/01/2023 11:16:40

Cuenta/ CLABE Ordenante	1176345522
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC Ordenante	MAL840101S34
Moneda	MXP
ID Tercero	09
Nombre del Beneficiario	VISION XXI STG S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0610258101
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC Beneficiario	VVS081231SR8
Importe a Transferir	\$3,998.16
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	22/dic./2022
Número de Referencia	221222
Propósito de la Transferencia	cuarto dormitorio fact fa0263343
Clave de Rastreo	212
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha Captura	22/dic./2022 13:15:58 p. m.
Ejecutó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha de Ejecución	22/dic./2022 13:16:17 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.

C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.

TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO

C.P. 83750 ALTAR, SONORA

TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA

FA0263343

Tipo de Comprobante : Ingreso

CONDICIONES: CREDITO

Empleado: RAMON ESTEBAN AHUMADA GAMBOA

DATOS DEL TIMBRADO:

Certificado Emisor:

00001000000510013041

Certificado SAT:

00001000000504204971

Folio Fiscal:

F1B8C556-9C93-440F-90E7-1430898B8EB2

Fecha Timbrado:

2022-12-22T11:12:34

FERRETERIA ALTAR

ALTAR, SONORA. A 22 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Cliente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR

Domicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

Ciudad: ALTAR, SONORA

RFC: MAL840101S34

Clave	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
BCKCA	H87-Piez a	200.0000	[31162800-Ferretería en general] BLOCK DE 15X 20X40 EG	18.51	3,702.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F1B8C556-9C93-440F-90E7-1430898B8EB2|2022-12-22T11:12:34|UFQ1|MCRMZG+pXXISE2ZQIRCHbZf8cSu1Hct6VRwBCX107VG11QRMEZT88gePDWZu5QCIPVQ+5CulA9HG5uZ+PntlzDaZMa1dMCRh3ZVlcZcPdYO6TB+BzvM+7CGaFv4/vv7YBZbsFUetA23IEwUX8vbT5+bMV1EPttiBf2/GWcc/KEV65+gfrq6NLBPS703XTqUq7G4TSveF3wZs+x0WEkO49fHJuVIKXQ4N+WLUAqMaCVQlgW/gY5WSFoqgoVwIIIEvPbOXGtvvjF8awPwr1dOdobxq5OQiiq+YbSM7ub4dNmmRlqwHciSVKDZ7TWX4Ms3mUIGrLz7xdUAgQ==|00001000000504204971|

Sello Digital del SAT:

UFQ1|MCRMZG+pXXISE2ZQIRCHbZf8cSu1Hct6VRwBCX107VG11QRMEZT88gePDWZu5QCIPVQ+5CulA9HG5uZ+PntlzDaZMa1dMCRh3ZVlcZcPdYO6TB+BzvM+7CGaFv4/vv7YBZbsFUetA23IEwUX8vbT5+bMV1EPttiBf2/GWcc/KEV65+gfrq6NLBPS703XTqUq7G4TSveF3wZs+x0WEkO49fHJuVIKXQ4N+WLUAqMaCVQlgW/gY5WSFoqgoVwIIIEvPbOXGtvvjF8awPwr1dOdobxq5OQiiq+YbSM7ub4dNmmRlqwHciSVKDZ7TWX4Ms3mUIGrLz7xdUAgQ==

Sello Digital del Emisor:

VB7cfd1oAA7vMteP7N/dpGFI/GCasn/p8+r6dh9ntwJsdLdy7+VWanaygwo3H1OxkAgZLhHe2qBW5fOIJFNom925QUOq2zz46s9uFUDyrPFT7q3f0JDR3GmlbaUIHsgv53D0UIOI8dplYpEilc2TBYmbWxsooLSsvjzKFHuyzU4PJo0qco0CwAm0AgULx4j1Ssr1F8IHvPn8EKHPJS9x9Qio5KLLPG563tp5glo8752+7eeFfL+rwKMxMa7FIMbJSmMumKNEJZL1QTZCqz+0sUbc57c9/MTblnH65cqOD7n2HqTG5GZIBhvzi7OQP2Yf4EknFNnkV4qJQ==



Estimado Cliente : "El tiempo máximo de resguardo de sus materiales en almacen será de 90 dias."

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido

UsoCFDI: G03

Forma de Pago: 99.

PAGARE No. FA0263343.

BUENO POR \$3,998.16

EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 22 de DICIEMBRE del 2022.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 21 de ENERO del 2023, la cantidad de \$3,998.16 (TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N) valor o importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34

DIRECCIÓN: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N

CIUDAD: ALTAR

Subtotal	3,702.00
	0.00
IVA	296.16
TOTAL	3,998.16

SUSCRIPTOR Y AVAL

FA0263343

Página 1 de 1.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Pago en una sola exhibición. Toda Devolución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

22/12/2022 10:12:36a. m.

FAISM 2022

ONCE MIL SETECIENTOS 00/100

BANCO: BANORTE S.A.

MUNICIPIO ALTAR: 01176345522

NO. CHEQUE: 0033

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

TRABAJOS REALIZADOS DE CONSTRUCCION 20 ML. DE CIMENTACION A BASE DE ZAPATA CORRIDA Y CONSTRUCCION

19 M2 DE MUROS A BASE DE BLOCK DE CONCRETO

CONCEPTO CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO

[illegible]

OPERADO POR FAISM

SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	PÓLIZA NÚMERO
-----------	----------	------------	------------	--------	---------------

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA:

OBRA PUBLICA

RECIBO DE EGRESOS

FAIMS-033

RECIBI de la tesorería municipal de este lugar la cantidad de \$ 11,700.00

Son: Once Mil Setecientos Pesos 00/100

Por el siguiente concepto: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR
LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO
NOMINA EN EL MUNICIPIO DE ALTAR SONORA SEMANA 28 NOVIEMBRE-03 DE DICIEMBRE

Altar, Sonora., a 03 de DICIEMBRE 2022

OPERADO POR FAISM
AUTORIZACIÓN DE TESORERÍA
C. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
(Nombre y Firma de Recibido)

MUNICIPAL 2021-2024	
Banorte S.A.	
No. Cta.	4552-2
No. Cheque	33
No. Factura	

Vo.Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL
C. L.D. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

OPERADO POR FAISM

ADMINISTRACION 2021-2024


NOMINA DE LA SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2022
FISM 2022



TRABAJOS REALIZADOS: CONSTRUCCION DE 20 ML DE CIMENTACION A BASE DE ZAPATA CORRIDA, Y CONSTRUCCION DE 150 PZA DE BLOCK PARA MUROS A BASE DE BLOCK DE CONCRETO

CONCEPTO: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO


No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	SALARIO	DIAS TRAB.	COMPENSACION HORAS EXTRAS	SUELDO NETO	FIRMAS
1	RAUL GERARDO SOTO DIAZ	OFICIAL ALBAÑIL	\$550.00	6.00		\$3,300.00	R. Gerardo Soto Diaz
2	RAMON MAHUARI NAVARRO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	\$500.00	6.00		\$3,000.00	Ramon Mahuari Navarro
3	JORGE LUIS MARTINEZ HERNANDEZ	AYUDANTE GENERAL	\$480.00	6.00		\$2,880.00	Jorge Luis Martinez Hernandez
4	FERNANDO MARTINEZ FERNANDEZ	PEON	\$420.00	6.00		\$2,520.00	Fernando Martinez Fernandez
				TOTAL		\$11,700.00	



[Handwritten signature]

AUTORIZACION DE TESORERIA.
C.P JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON-2024

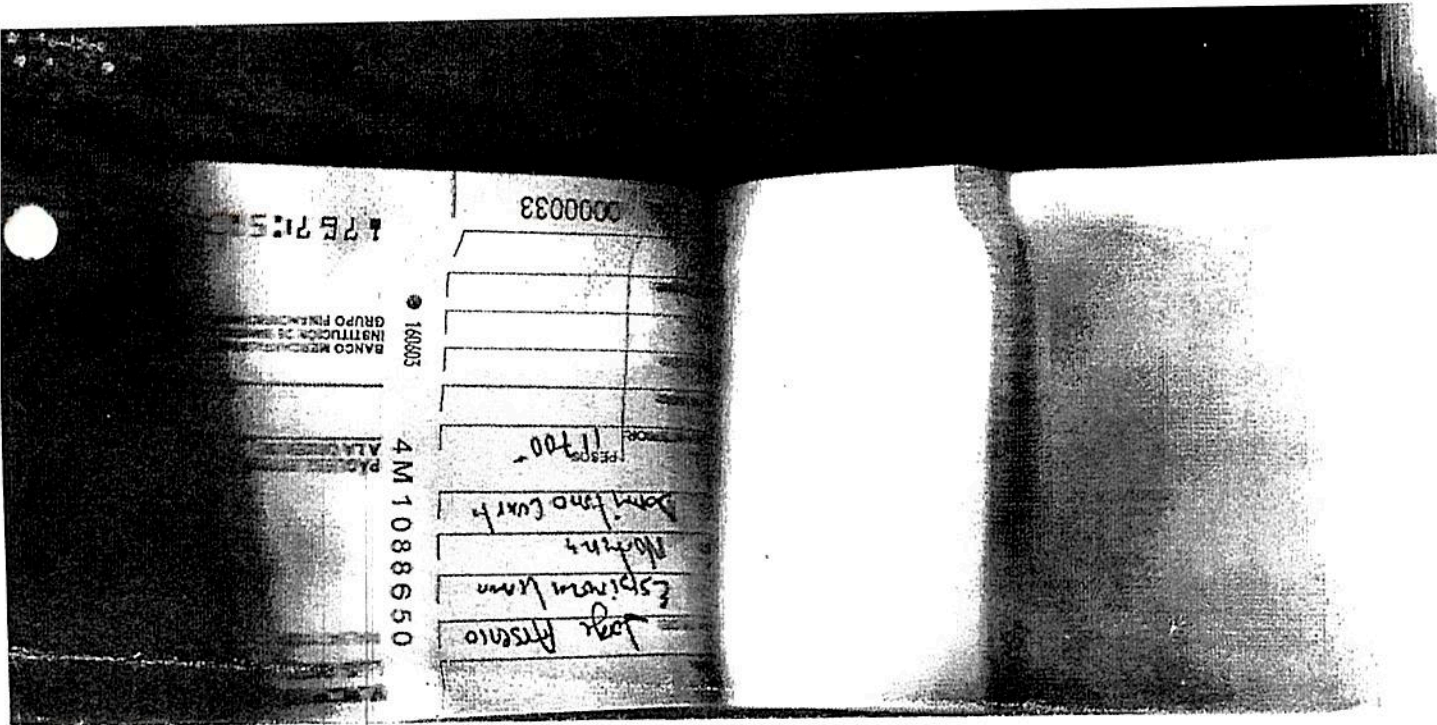

OPERADO POR FAISM

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	PÓLIZA NÚMERO
-----------	----------	------------	------------	--------	---------------

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA: OBRA PUBLICA

RECIBO DE EGRESOS


FAIMS-037

RECIBI de la tesorería municipal de este lugar la cantidad de \$ 11,700.00

Son: Once Mil Setecientos Pesos 00/100

Por el siguiente concepto: TRABAJOS REALIZADOS CONSTRUCCION A BASE
INTERIORES INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS Y SISTEMA ELECTRICO
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD ALTAR

Altar, Sonora., a 23 de DICIEMBRE 2022


AUTORIZACIÓN DE TESORERÍA
C. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN



JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
(Nombre y Firma de Recibido)

Vo.Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL
C. L.D. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

OPERADO POR FAISM

Banorte S.A.
ADMINISTRACIÓN
No. Cta. 4552-2
No. Cheque 37
No. Factura

MUNICIPIO DE ALTAR
LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVILFAISM
MAL840101S34



CUENTA NUEVA

4M1120132

CABORCA, SON.

FECHA: 23 diciembre del 2022 \$ 11700-

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Jorge Arsenio Espinoza Limon

Son Once mil setecientos Pesos 00/100 mm


160603

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 6520 CABORCA
CTA 117634552-2

No. CUENTA

No. CHEQUE



84241510170723101176345522110000037

OPERADO POR FAISM

Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	PÓLIZA NÚMERO
-----------	----------	------------	------------	--------	---------------

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA: OBRA PUBLICA

RECIBO DE EGRESOS


FAIMS-034


RECIBI de la tesorería municipal de este lugar la cantidad de \$ 11,700.00

Son: Once Mil Setecientos Pesos 00/100

Por el siguiente concepto: CONSTRUCCION DE MUROS A BASE DE BLOCK CONCRETO
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO

Altar, Sonora., a 16 de DICIEMBRE 2022


AUTORIZACIÓN DE TESORERÍA
C. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN


JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
(Nombre y Firma de Recibido)

Vo.Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL
C. L.D. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIOLA

Banorte S.A.

No. Cta.	4552-2
No. Cheque	34
No. Factura	

OPERADO POR FAISM

MUNICIPIO DE ALTAR
LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVILFAISM
MAL840101S34



CUENTA NUEVA

4 M 1:088650

FECHA: 16 diciembre del 2022

\$ 11700⁰⁰

CABORCA, SON.

PÁGUESE ESTE CHEQUE
ALA ORDEN DE:

Jorge Arsenio Espinoza Limon

Son once mil Setecientos Pesos 00/100 m.n.

160603

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 6520 CABORCA
CTA 117634552-2

No. CUENTA

No. CHEQUE

MONEDA NACIONAL

FIRMA

17671510170723101176345522110000034

OPERADO POR FAISM

ADMINISTRACION 2021-2024

NOMINA DE LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022
FISM 2022



TRABAJOS REALIZADOS: CONSTRUCCION DE 17 ML DE DALAS Y CASTILLOS, CONSTRUCCION DE 20 M2 DE TECHO A BASE DE LAMINA Y POLINEARIA, 15 M2 DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON ACABADO FINO Y 1.66 M2 DE APLANADOS EN MUROS INTERIORES

CONCEPTO: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	SALARIO	DIAS TRAB.	COMPENSACION HORAS EXTRAS	SUELDO NETO	FIRMAS
1	RAUL GERARDO SOTO DIAZ	OFICIAL ALBAÑIL	\$550.00	6.00		\$3,300.00	R Gerardo Soto Diaz
2	RAMON MAHUARI NAVARRO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	\$500.00	6.00		\$3,000.00	Ramon Mahuari Navarro
3	JORGE LUIS MARTINEZ HERNANDEZ	AYUDANTE GENERAL	\$480.00	6.00		\$2,880.00	Jorge Luis Martinez Hernandez
4	FERNANDO MARTINEZ FERNANDEZ	PEON	\$420.00	6.00		\$2,520.00	Fernando Martinez Fernandez
TOTAL						\$11,700.00	



[Signature]

Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

[Signature]

AUTORIZACIÓN DE TESORERIA.
C.P JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

11,700.00

BANCO: BANORTE S.A.

MUNICIPIO ALTAR: 01176345522

NO. CHEQUE: 0035

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CONSTRUCCION DE MUROS A BASE DE BLOCK DE CONCRETO CONSTRUCCION DE DALAS

Y CASTILLO DE BASE DE CONCRETO

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		OPERADO POR FAISM			

SUMAS IGUALES		

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	PÓLIZA NÚMERO
-----------	----------	------------	------------	--------	---------------

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA: OBRA PUBLICA

RECIBO DE EGRESOS

FAIMS-035

RECIBI de la tesorería municipal de este lugar la cantidad de \$ 11,700.00

Son: Once Mil Setecientos Pesos 00/100

Por el siguiente concepto: CONSTRUCCION DE MUROS A BASE DE BLOCK CONCRETO
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO

Altar, Sonora., a 20 de DICIEMBRE 2022

OPERADO POR FAISM
C. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
MUNICIPAL 2021-2024
(Nombre y Firma de Recibido)

Vo.Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL
C. L.D. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

Banorte S.A.
No. Cta. 4552-2
No. Cheque 35
No. Factura

MUNICIPIO DE ALTAR
LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVILFAISM
MAL840101S34

 **BANORTE** 

CUENTA NUEVA

FECHA: 20 diciembre del 2022 \$ 11700⁻

4 M 1135064
PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: CABORCA, SON.

Jorge Arsenio Espinoza Limon
Son once mil Setecientos Pesos 00/100 m.n.

MONEDA NACIONAL

160603
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 6520 CABORCA
CTA 117634552-2

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

06051:5101707231:011763455221:0000035

OPERADO POR FAISM

ADMINISTRACION 2021-2024

NOMINA DE LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022


FISM 2022




TRABAJOS REALIZADOS: 65 M2 DE APLANADOS EN MUROS INTERIORES,

CONCEPTO: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	SALARIO	DIAS TRAB.	COMPENSACION HORAS EXTRAS	SUELDO NETO	FIRMAS
1	RAUL GERARDO SOTO DIAZ	OFICIAL ALBAÑIL	\$550.00	6.00		\$3,300.00	Gerardo Soto Diaz
2	RAMON MAHUARI NAVARRO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	\$500.00	6.00		\$3,000.00	Ramon Mahuari Navarro
3	JORGE LUIS MARTINEZ HERNANDEZ	AYUDANTE GENERAL	\$480.00	6.00		\$2,880.00	Jorge Luis Martinez Hernandez
4	FERNANDO MARTINEZ FERNANDEZ	PEON	\$420.00	6.00		\$2,520.00	Fernando Martinez Fernandez
				TOTAL		\$11,700.00	



Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON 2021-2024



AUTORIZACION DE TESORERIA.
C.P JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

PÓLIZA DE CHEQUE

FAISM 2022

15,500.00

QUINCE MIL QUINIENTOS 00/100

BANCO: BANORTE S.A.

MUNICIPIO ALTAR: 01176345522

NO. CHEQUE: 0038

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

TRABAJOS REALIZADOS CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE LAMINA Y POLINEARIA, APLANADOS EN MUROS

INTERIORES CONSTRUCCION DE PISO FIRME ACABO PULIDO

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
--------	------------	--------	---------	------	-------

OPERADO POR FAISM

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PÓLIZA NÚMERO

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA:

OBRA PUBLICA

RECIBO DE EGRESOS

FAIMS-038

RECIBI de la tesorería municipal de este lugar la cantidad de \$ 15,500.00

Son: Quince Mil Quinientos Pesos 00/100

Por el siguiente concepto: TRABAJOS REALIZADOS CONSTRUCCION A BASE
INTERIORES CONSTRUCCION DE PISO FIRME ACABADO PULIDO
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD ALTAR

Altar, Sonora., a 29 de DICIEMBRE 2022


AUTORIZACION DE TESORERO
C. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

OPERADO POR FAISM


JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
(Nombre y Firma de Recibido)

Vo.Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL
C. L.D. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

Banorte S.A.	
No. Cta.	4552-2
No. Cheque	38
No. Factura	

MUNICIPIO DE ALTAR
LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVILFAISM
MAL840101S34



CUENTA NUEVA

4M1073869

FECHA: 29 diciembre del 2022 | \$ 15500

CABORCA SON.

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Jorge Arsenio Espinoza Limon

Son quince mil quinientos Pesos ⁰⁰/₁₀₀ m.n.

160603

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 6520 CABORCA
CTA 117634552-2

No. CUENTA

No. CHEQUE

MONEDA NACIONAL

FIRMA

EDICIÓN 2019

7334151017072310117634552210000038

PERADO POR FAISM

ADMINISTRACION 2021-2024

NOMINA DE LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
FISM 2022



TRABAJOS REALIZADOS: 36.34 M2 DE APLANADOS EN MUROS INTERIORES, 103 M3 COLOCACIÓN DE PINTURA BLANCA ,
INSTALACION ELECTRICA, PUERTAS Y VENTANAS

CONCEPTO: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR ASENTAMIENTO DE ABAJO

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	SALARIO	DIAS TRAB.	COMPENSACION HORAS EXTRAS	SUELDO NETO	FIRMAS
1	RAUL GERARDO SOTO DIAZ	OFICIAL ALBAÑIL	\$550.00	6.00	100	\$3,400.00	R. Gerardo Soto Diaz
2	RAMON MAHUARI NAVARRO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	\$500.00	6.00	100	\$3,100.00	Ramon Mahuari Navarro
3	JORGE LUIS MARTINEZ HERNANDEZ	AYUDANTE GENERAL	\$480.00	6.00	100	\$2,980.00	Jorge Luis Martinez Hernandez
4	FERNANDO MARTINEZ FERNANDEZ	PEON	\$420.00	6.00	100	\$2,620.00	Fernando Martinez Fernandez
5	RAFAEL LLAMAS	OFICIAL SOLDADOR	\$550.00	6.00	100	\$3,400.00	Rafael Llamas
TOTAL						\$15,500.00	



Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

AUTORIZACIÓN DE TESORERIA.
C.P. JUAN JOSÉ CELAYA GAYTAN
