



LIC. CARLOS ERNESTO ZATARÁIN GONZÁLEZ

**Coordinador General del Consejo Estatal
de Concertación para La Obra Pública**

En atención a la Cláusula Décima Cuarta del Convenio de Coordinación para la operación del Programa Estatal de Participación Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 2021, firmado por el CECOP y el H. Ayuntamiento de Altar, Sonora, el 05 de Abril del 2021, y en uso de las facultades que me confiere la Ley de Gobierno y Administración Municipal, me permito extender la presente **CONSTANCIA DE FINIQUITO DE OBRAS**, correspondiente al programa de Concertación de Obra Pública del ejercicio fiscal 2021 a cargo del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública de este Municipio.

La constancia de finiquito comprende las 2 (Dos) obras concertadas y ejecutadas en el Municipio, cuya relación y copias de las respectivas actas de entrega – recepción se anexan a la misma.

Se extiende la presente, para los efectos legales, normativos, administrativos y de procedimiento a que haya lugar; sin que la misma constituya procedimiento sustantivo de las acciones de control y evaluación que por disposición legal le compete ejecutar a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, en virtud del origen de los recursos transferidos al Ayuntamiento para la ejecución de las obras señaladas.

Altar, Sonora, a 05 de Julio de 2022

Atentamente

C.P. LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA

CONTRALOR MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN
ALTAR, SONORA. MUNICIPAL 2021-2024



**H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PARA OBRA POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**OBRA: REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO DE
IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO**

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 2022, SE DIERON CITA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CATECISMO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO, UBICADA EN CALLE HIDALGO SUR ENTRE AV. PEDRO PABLO VARELA Y AV. EVARISTO ARAIZA, EN ALTAR, SONORA LAS SIGUIENTES PERSONAS: LOS C. C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON Y LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL EN SUS CARACTERES DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, POR LOS BENEFICIARIOS LOS C. LUZ EUGENIA MONTEVERDE ESCALANTE EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE ; C. TOMAS MONTEVERDE ESCALANTE EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO; C. ERNESTO CORELLA ORTEGA EN SU CARÁCTER TESORERO; POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL EL C. LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA.

DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, FUÉ REALIZADA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, DECLARA QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE ACTA DE LA JUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SU INVERSIÓN APROBADA SEGÚN OFICIO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS NÚMERO CECOP-PN-21R-026 DE FECHA 21 DE ENERO DEL 2022 CON NO. DE OBRA PN-065; CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: POR PARTE DEL CECOP \$113,858.73; EL H. AYUNTAMIENTO \$18,976.46; POR LOS BENEFICIARIOS \$18,976.46, SUMANDO LA CANTIDAD DE: \$151,811.65.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACIÓN DE GASTOS GENERADOS

MANO DE OBRA: \$82,960.00

MATERIALES: \$64,403.49

MAQUINARIA Y EQUIPO: \$4,448.16

OTROS: \$0.00

TOTAL: \$151,811.65

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE: LA OBRA CONSISTE EN EL DESPRENDIMIENTO DE LADRILLOS MAL ADHERIDOS, Y COLOCACION DE LADRILLOS FALTANTES, 53 ML DE CADENAS DE CERRAMIENTO EN MUROS EXISTENTES DE 15X20 CMS, 426 M2 DE ENJARRES GRUESOS Y FINOS EN MUROS CON MORTERO, ADEMAS DE LA CONSTRUCCION DE 30 M2 DE BANQUETA Y LIMPIEZA GENERAL.

MISMOS QUE ESTÁN ACORDES AL PRESUPUESTO Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACIÓN DE 32 DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2022 Y CONCLUYENDO EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2022.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, GARANTIZA HASTA POR UN AÑO LAS OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCIÓN POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN. EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR HACE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA ANTES DESCRITA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 31 DEL MES MARZO DEL 2022, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR

REPRESENTADO POR:

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA EIMON
MUNICIPAL 2021-2024

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL
MUNICIPAL 2021-2024

RECIBE DE CONFORMIDAD
EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SONORENSE
REPRESENTADO POR:

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

EL TESORERO

C. LUZ EUGENIA MONTEVERDE
ESCALANTE

C. TOMAS MONTEVERDE
ESCALANTE

C. ERNESTO CORELLA
ORTEGA

VOCAL 1

JOAQUIN VILLA ALCARAZ
VARELA

VOCAL 2

C. AURELIO MEDINA HURTADO

TESTIGOS

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO

C.P LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

C.

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO	
DOMICILIO:		CALLE HIDALGO SUR ENTRE AV. PEDRO PABLO VARELA Y AV. EVARISTO ARAIZA, COL CENTRO	
LOCALIDAD:		MUNICIPIO: ALTAR	
OFICIO DE LIBERACIÓN:	CECOP-PN-21R-026	1 OBRA	
FECHA DE LIBERACIÓN:	21 DE ENERO DE 2022	EDIFICIOS PUBLICOS	
NÚMERO DE OBRA:	PN-065	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
NÚM. DE BENEFICIARIOS:	250	TIEMPO DE EJECUCIÓN: 32.00 DÍAS	

FECHA:

20 DE ABRIL DEL 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA			
COSTO TOTAL	C.E.C.O.P	H. AYTO.	COMUNIDAD
151,811.65	113,858.73	18,976.46	18,976.46

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO			EJERCIDO			DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
AL01	DESPRENDIMIENTO DE LADRILLOS MAL ADERIDOS Y/C MEZCLAS EN PARTE SUPERIOR DE BARRA. INCLUYE ACARREOS A PIE DE CAMION POR MEDIOS MANUALES Y/O CARRETILLA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	2.00	425.15	850.30	2.00	850.30	0.00	0.00
AL02	CONSTRUCCION DE MURO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO PARA DAR ALTURA A LA BARRA, PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE: NIVELADO PLOMEADO, ANDAMIOS, ALTURA MAX A 2.5' HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	M2	3.00	485.65	1,456.95	3.00	1,456.95	0.00	0.00
AL03	CONSTRUCCION DE CADENA DE CERRAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX PREFABRICADO Y 2 VARILLAS DE 3/8" EN LECHO INFERIOR Y 1 VARILLA EN LECHO SUPERIOR, DIMENSIONES DE 15 CM X 20 CM. INCLUYE: CIMERA, COLADO, CONCRETO HEN. O. CURADO CON LOS CONCRETOS, T.M.A 3/4, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M/L	53.00	445.65	23,619.45	53.00	23,619.45	0.00	0.00
AL04	APLANADO ACABADO GRUESO EN MUROS CON MORTERO-CEMENTO-ARENA ESPESOR MAX. DE 2.5 CM. PLOMEADO Y REGLEADO. INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, HUMECTADO DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	426.00	166.85	71,078.10	426.00	71,078.10	0.00	0.00
AL05	ACABADO FINO EN MUROS CON CEMENTO-CAL-ARENA. FINA, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, HUMECTADO DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	426.00	86.85	36,998.10	426.00	36,998.10	0.00	0.00

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO

DOMICILIO: CALLE HIDALGO SUR ENTRE AV. PEDRO PABLO VARELA Y AV. EVARISTO ARAIZA, COL CENTRO

LOCALIDAD: ALTAR

MUNICIPIO: ALTAR

FECHA: 20 DE ABRIL DEL 2022

OFICIO DE LIBERACIÓN: CECOP-PN-21R-026

FECHA DE LIBERACIÓN: 21 DE ENERO DE 2022

NÚMERO DE OBRA: PN-065

NÚM. DE BENEFICIARIOS: 250

META OPERATIVA: 1 OBRA

SUBPROGRAMA: EDIFICIOS PUBLICOS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 32.00 DÍAS

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO				DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
AL06	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HIDRAULICO DE FC=150 KG7CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE; RELLENO DE DEPRESIONES, CORTES, COMPENSACIONES, AFINE, COMPACTACION CON PIZON A MANO, HUMECTADO, REVOLVEDORA DE UN SACO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	30.00	515.25	15,457.50	30.00	15,457.50	0.00	0.00		
AL07	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMION DE VOLTEO, CARGA DE ESCOMBRO POR MEDIOS MANUALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	LOTE	1.00	2,351.25	2,351.25	1.00	2,351.25	0.00	0.00		
						IMPORTE DE OBRA		\$151,311.65			
						IMPORTE EJERCIDO		\$151,311.65			
						SALDO		\$0.00			

OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS

Presidencia Municipal

Presidente Municipal

C. JORGE ARSEÑO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

Controlaría Municipal

ÓRGANO DE CONTROL

C. P. LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024



ACTA DE ASAMBLEA PARA LA INTEGRACION DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE PARA OBRA

250

Siendo las 19:00 horas, del día 18 del mes de Enero del 20 22 nos reunimos los vecinos de la localidad de ALTAR del Municipio de ALTAR con el propósito de dar cumplimiento a la convocatoria emitida por D.B.O.S. CECOP y H. AYUNTAMIENTO para la integración del Comité de Participación Social Sonorense de la Obra Rehabilitación dentro de catecismo de Iglesia Católica San Antonio Calle Hidalgo final Sur en la colonia dentro del Altar.

Dicha Asamblea se lleva a cabo bajo la coordinación del C. Jorge Espinoza y el C. Norma Alicia Celaga Celaga quienes actúan como presidente y secretario de la asamblea, por acuerdo del H. Ayuntamiento de ALTAR Sonora y de CECOP, conforme al siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia de beneficiarios.
2. Exposición de los objetivos y principios del programa.
3. Descripción y acuerdo de aceptación de la obra concertada.
4. Propuestas, votación e integración del comité
5. Toma de protesta al Comité de Participación Social.
6. Clausura

La asamblea dio inicio pasando lista de asistencia de 09 beneficiarios representantes de la obra, quedando asentado el quórum legal.

Acto seguido, por conducto del C. Hisacel Duarte Lopez en su carácter de Promotor Social expuso a los presentes los objetivos y principios, así como los beneficios que la operación del Programa de Participación Social para la obra pública concertada traerá a la comunidad.

Como siguiente punto del orden del día se sometió a consideración de la asamblea las siguientes características de la obra a concretar:

1. Descripción de la obra (se anexa catálogo de conceptos)
2. Financiamiento de la obra y aportación de la comunidad.

Una vez analizados los diferentes aspectos de la obra en cuestión, se procedió a levantar la votación sobre la aceptación de la misma y sus modalidades de ejecución y financiamiento, quedando aprobada por unanimidad-mayoría de votos la propuesta presentada.



CONSEJO ESTATAL DE
CONCERTACIÓN
PARA LA OBRA
PÚBLICA

GOBIERNO
de SONORA

ACTA DE ASAMBLEA PARA LA INTEGRACION DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE

MUNICIPIO: ALTAR

Posteriormente se les explicó a los presentes la necesidad y requerimientos normativos para constituir el Comité de Participación Social, mismo que será integrado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos vocales, siendo la forma de constituirlo de acuerdo a las propuestas presentadas para cada cargo, mediante la respectiva votación de cada uno de los beneficiarios.

Acto seguido se procedió a abrir la participación para la recepción de propuestas a los cargos, habiéndose recibido para tal efecto 01 propuestas (s). Tras lo anterior, los nombres de los candidatos se sometieron a consideración y votación para elegir a la mesa directiva, habiéndose previamente acordado que los cargos en jerarquía estarán en función del número de votos efectivos para cada uno de los candidatos que han sido sometidos a votación. Lo votación arrojó: 07 votos efectivos y 00 abstenciones, dando como resultado la conformación de la Mesa directiva con los siguientes integrantes:

1. PRESIDENTE Luz Eugenia Monteverde Escalante
2. SECRETARIO Tomas Monteverde Escalante
3. TESORERO Ernesto Corella Ortega
4. VOCAL 1 Joaquin Villa Alcaraz
5. VOCAL 2 Aurelio Medina Hurtado

Firman de conformidad los que en esta asamblea intervinieron:


PRESIDENTE


ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

Norma Alicia Deloya Deloya
SECRETARIO



CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS MEDIOS DE DENUNCIA QUE PUEDAN REALIZAR A TRAVÉS DEL ÓRGANO DE CONTROL Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA CUALQUIER RECOMENDACIÓN, INCONFORMIDAD O ACTOS INDEBIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

I.- Buzón de Quejas en Oficinas de CECOP

II.- Queja, Denuncia o Recomendación:

II.1).- En las Oficinas de la Secretaría de la Contraloría General, en Centro de Gobierno Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort C.P. 83280, Col. Villa de Seris en Hermosillo, Sonora, México.

II.2).- En el Órgano Interno de Control en CECOP, en Zaragoza No. 5 Esq. Con Independencia, Col. Villa de Seris, C.P. 83280, en Hermosillo, Sonora, México.

III.- Denuncia Vía Electrónica a los correos:

III.1).- contraloria.sonora.gob.mx (DECIDES)

III.2).- hernandez@sonora.gob.mx

IV.- Vía telefónica al 800 466 37 86

FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ ELECTO, ASÍ COMO DE ENTERADOS DE LOS MEDIOS DE DENUNCIA QUE PUEDEN REALIZAR A TRAVÉS DEL ÓRGANO DE CONTROL Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.


PRESIDENTE


SECRETARIO


TESORERO


VOCAL 1


VOCAL 2

Una vez electa la Mesa Directiva, se procede a la toma de protesta reglamentaria a los integrantes del comité de Participación Social Sonorense por el C. JORGE ESPINOZA representante II. AYUNTAMIENTO de ALTAR.

Como último punto del orden del día, se procede a la clausura de los trabajos para la integración del Comité de Participación Social, estando a cargo el C. ALISEEL DUARTE LOPEZ y siendo las 19:45 horas.

LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA

OBRA: Rehabilitación del Centro de catecismo de Iglesias católicas
San Antonio calle Hidalgo final Sur en la colonia centro local 1147

MUNICIPIO: Altar LOCALIDAD: Altar FECHA: 18 Enero - 2022

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	FECHA NAC.	GENERO	CALLE Y NÚMERO	COLONIA	C.P.	TELÉFONO	FIRMA
Loreto	Montevideo	Escalante	10/01/72	F	Hidalgo # 92	Centro	8320	637 400 26	Leite
Tomas	Montevideo	Escalante	17/01/73	H	Zoragoza # 6	Centro	8320	637 122 020	GPE
Ernesto	Caella	Ortega	5/05/67	H	Hidalgo # 32	Centro	8320	637 411 11	Ernesto
Cecilia	Moreno	Vazquez	2/05/65	F	Guadalupe # 8	los bonas	8320	637 106 066	Cecilia Moreno
Joaquin	Villa	Alcaraz	5/06/71	M	Humberto Lora # 43	los bonas	8320	637 103 694	Joaquin
Manuel	Villa	Galindo	18/03/71	M	Humberto Lora # 3	los bonas	8320	637 935 982	Manuel
Arvelio	Medina	Fortato	12/11/57	M	Calle 3ro alijapine # 1	Barrido Sur	8320	637 376 809	Arvelio

DIRECTORIO DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SONORENSE

OBRA: Rehabilitación de centro de catecismo de Iglesia Católica San Antonio
Calle Hidalgo final Sur en la col. Centro Loc Altar

MUNICIPIO: Altar LOCALIDAD: Altar FECHA: 18 Enero - 2022

CARGO	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	F. NACIMIENTO	GENERO	CALLE Y NUMERO	COLONIA	C.P.	TELÉFONO
PRESIDENTE	Luz Eugenia	Monteverde	Escalante	16/01/72	Fm	Calle Hidalgo #92	Centro	83750	637400-26
SECRETARIO	Tomás	Monteverde	Escalante	17/08/73	#	Zaragoza #6	Centro	83750	637-12-21020
TESORERO	Ernesto	Corella	Ortega	5/05/67	#	Hidalgo #32	Centro	83750	6374-11-11
VOCAL 1	Joaquín	Villa	Alcaraz	5/11/60	#	Humberto Zarzeta	Los Lomos	83750	6371103694
VOCAL 2	Aurelio	Medina	Hurtado	12/11/57	#	Calle 3ra y callejos pinos #1	Benito Juárez	83750	6373708049

CONSEJO ESTATAL DE
**CONCERTACIÓN
PARA LA OBRA
PÚBLICA**

GOBIERNO
SONORA

No. Oficio de Liberación: CECOP-PN-21R-026.
Hermosillo, Sonora, a 21 de enero del 2022.

LIC. LUIS ÁNGEL VALENZUELA MENDIVIL
Presidente Municipal de Altar
Presente.-

Con base en el oficio de AutORIZACIÓN SH-ED-21-195 (C-00055/1573) de fecha 09 de diciembre del 2021 y Oficio de Anuencia SE-05.06-0187/2022 de fecha 19 de enero del 2022, emitido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y conforme al presupuesto asignado a su Municipio en el Convenio de Concertación de fecha 05 de abril del 2021, firmado por el CECOP y el mismo Ayuntamiento, por este conducto me permito comunicarle que se autoriza a su Municipio la Liberación de Recursos Estatales a través del CECOP por un monto de \$151,432.61 (SON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 61/100 MN) para que con ellos se ejecuten las obras que a continuación se describen:

PROGRAMA	APORTACIÓN
SUBPROGRAMA	CECOP
OBRA	(PESOS)
NORMAL	\$151,432.61
Parques y Áreas Verdes	\$113,858.73
Rehabilitación de Centro de Catecismo de Iglesia Católica San Antonio, Calle Hidalgo Final Sur, en la Colonia Centro, de la Localidad de Altar	113 858 73
Mejoramiento Ambiental	\$37,573.88
Suministro e instalación de Señalamientos Viales en Varias Calles, de la Localidad de Altar	37 573 88

Los recursos se aplicarán de acuerdo a los anexos técnicos de liberación correspondiente a las obras que se acompañan a este oficio y cualquier modificación con respecto al contenido del mismo solo procederá previa autorización del CECOP.

Para la adjudicación y ejecución de la obra deberán observarse las normas y disposiciones contenidas en las Leyes de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración Pública Estatal y sus respectivos Reglamentos.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS ERNESTO ZATARAIN GONZÁLEZ
COORDINADOR GENERAL DEL CECOP

Ccp-ING F. LORENA MARTÍNEZ CERVANTES - Directora General de Concertación y Apoyo Técnico
Ccp-C.P. LUIS EFREN VALDEZ JUVERA - Director General de Administración y Finanzas
Ccp-ING LUIS MANUEL ARVIZU ARIZMENDI - Director de Apoyo Técnico
Ccp-Expediente
CEZG/FLMC/LMAA/jdt**

SONORA



Oficio de Auto. SH-ED-21-195 (1573)
Oficio de Lib.: CECOP-PN-21R-026
Fecha: 14-ene-2022
No. de Obra: PN-065

ANEXO TÉCNICO DE LIBERACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

Rehabilitación de Centro de Catecismo de Iglesia Católica San Antonio, Ubicada en Calle Hidalgo Final Sur, en la Colonia Centro, de la Localidad de Altar, en el Municipio de Altar, Sonora.

PRINCIPALES CONCEPTOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO
Construcción de muro de ladrillo rojo recocido para dar altura a la barda y construcción de cadena de cerramiento con concreto hidráulico reforzado con Armex prefabricado. Incluye: cimbra, colado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	53.00	25,926.40
Aplanado acabado grueso en muros con mortero cemento-arena espesor máximo de 2.5cm y acabado fino en muros con cemento-cal-arena fona acabado floteado. Incluye: herramienta, andamios, humectado de superficie, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	426.00	108,076.50
Construcción de banquetta de concreto hidráulico de 10 cm de espesor con concreto hidráulico reforzado con malla electrosoldada y limpieza general de obra. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	30.00	17,808.75
			151,811.65

META OPERATIVA: 1 OBRA.
SUBPROGRAMA: SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 28 DÍAS
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 250

ESTRUCTURA FINANCIERA:

COSTO TOTAL	CECOP	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD
151,811.65	113,858.73	18,976.46	18,976.46

NOTA: La aportación correspondiente al Ayuntamiento y la comunidad será en especie y mano de obra.

COORDINADOR GENERAL	
LIC. CARLOS ERNESTO ZATARAIN GONZÁLEZ	
DIRECTORA GENERAL DE CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ING. F. LORENA MARTÍNEZ CERVANTES	C.P. LUIS EFRÉN VALDEZ JUVERA

FLMC/LMAA/rem**

ANEXO TÉCNICO DE LIBERACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

Suministro e instalación de Señalamientos Viales en Varias Calles, de la Localidad de Altar, en el Municipio de Altar, Sonora.

PRINCIPALES CONCEPTOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO
Suministro e instalación de nomenclatura tipo solo alto con antirreflejante adherido a lamina de 45.8 x 45.8 cm, incluye poste tipo PTR, construcción de cepa, colado de concreto en cepa, herrajes y herramienta de instalacion asi como todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA.	10.00	27,526.50
Suministro e instalación de veletas para nomenclatura de calles y señalamiento tipo alto en parte superior con antirreflejante adherido a la lamina de 45.8 x 45.8cm, Incluye porte tipo PTR, construcción de cepa, colado de concreto en cepa, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA.	6.00	22,572.00
			50,098.50

META OPERATIVA: 1 OBRA.
SUBPROGRAMA: SE36.- SEÑALAMIENTOS VIALES
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 28 DÍAS
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 850

ESTRUCTURA FINANCIERA:

COSTO TOTAL	CECOP	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD
50,098.50	37,573.88	6,262.31	6,262.31

NOTA: La aportación correspondiente al Ayuntamiento y la comunidad será en mano de obra y especie.

COORDINADOR GENERAL	
DIRECTORA GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TÉCNICO ING. F. LORENA MARTÍNEZ CERVANTES	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS C.P. LUIS EFRÉN VALDEZ JUVERA



Santander

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LAO 080120955506

Usuario: 52060734 - LUIS EFREN VALDEZ JUVERA

Referencia: 9920220124164420411360

**Referencia
numérica del
Emisor:**

**Referencias del
Movimiento:** 2446369

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014760180001800507

Cuenta Cargo: 18000180050 - CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LAO

Cuenta Abono: 072765004532432101 - MUNICIPIO DE ALTAR

Importe: \$ 151,432.61 MXN

Concepto: SH ED 21 195 CECOP PN 21R 026

**Fecha y hora de
Alta:** 24/01/2022 16:44:20

**Fecha y hora de
Liquidación:** 24/01/2022 16:44:33

**Clave de
Rastreo:** 2022012440014 BET0000424463690

**RFC
Beneficiario:**

**RFC
Ordenante:** CEC921126TW0

Importe IVA:

**Email del
Beneficiario:** guadalupe.manjarrez@sonora.gob.mx

Banco Destino: BANORTE

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

ACUERDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Con fundamento en los Artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, "El H. Ayuntamiento" de Altar emite el presente Acuerdo para ejecución de Obras por Administración Directa, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

I.- Que el CMCOP de Altar es un órgano **Desconcentrado** creado en los términos del artículo 55 de la ley orgánica de Administración Municipal, que depende Jerárquicamente del Ayuntamiento de Altar, que en virtud de ello y de que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento establecen que en el ámbito municipal es el Ayuntamiento quien está facultado para ejecutar las obras que han de llevarse a cabo a través de administración directa.

II.- Que el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública del Estado de Sonora aprobó la inversión correspondiente a la Obra que ejecutará el CMCOP de Altar que ampara el presente documento, mediante Oficio de Liberación No. **CECOP-PN-21R-026** de fecha **21 de enero del 2022** por un monto de **PN-065**.

III.- Que el Ayuntamiento de Altar cuenta con la organización, el personal técnico, administrativo y trabajadores, así como la maquinaria y el equipo de construcción que se requiera para ejecutar por Administración Directa los trabajos a que se refiere la autorización citada en el considerando inmediato anterior.

IV.- Que se ha elaborado el proyecto, Presupuesto, Planos, Especificaciones y Programas de ejecución de la obra materia de este Acuerdo, mismos que se anexan al presente, formando parte integral del mismo.

V.- Que en virtud de que este H. Ayuntamiento cuenta con la Organización y elementos de trabajo mencionados y a fin de aprovechar debidamente dichos recursos, es conveniente y redundante en beneficio económico de la realización de la propia obra que el H. Ayuntamiento de Altar ejecute por Administración Directa la Obra que se describe en el Acuerdo Primero de este documento, por lo que ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de Altar realizará durante el presente año, por Administración Directa y utilizando el personal, maquinaria y equipo de construcción con que cuenta, la ejecución de la siguiente obra: **Rehabilitación de centro de catecismo de iglesia católica san Antonio**

SEGUNDO. - Se anexa el Proyecto, Presupuesto, Especificaciones y Programa de Ejecución de la Obra, aprobados por el CMCOP formando parte del presente documento.

TERCERO. - El importe total de la obra es por la cantidad de: **\$ 142,314.87 (Son: Ciento cuarenta y dos mil trescientos catorce pesos 87/100 M.N).** Mas el 16 % de I.V.A. dando un total de: **\$151,811.65 (Son: ciento cincuenta y un mil ochocientos once pesos 65/100 M.N),** y el monto a ejercer durante el presente ejercicio es por: **\$151,811.65 (Son: ciento cincuenta y un mil ochocientos once pesos 65/100 M. N).** Cabe aclarar que el monto de la obra se estructura de la siguiente manera: CECOP aportará **\$113,858.73 (Son: Ciento trece mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 73/100 M.N)** y "EL CMCOP" **\$37,952.92 (Son: treinta y siete mil novecientos cincuenta y dos pesos 92/100 M.N)**

CUARTO. - Los trabajos referentes a este Acuerdo se iniciarán el día **28 de febrero de 2022** y se concluirán el día **02 de abril del 2022** de acuerdo al Programa de ejecución aprobado por CMCOP de Altar.

QUINTO. - La inversión total a que se hace referencia en el Considerando I, del presente acuerdo, es la máxima que se debe ejercer y no podrá variar, salvo que el Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública autorice por escrito la modificación respectiva.

SEXTO. - El importe de la obra podrá comprender:

- A) El pago a personal con carácter eventual para los trabajos realizados que integran el presupuesto mencionado en el ACUERDO SEGUNDO, que forma parte del presente documento.
- B) El pago de materiales que se utilicen en la ejecución de la Obra.
- C) El pago de alquiler de equipo y la maquinaria de construcción, así como los servicios de fletes, pasajes y acarreos complementarios que se requieran para la realización de los trabajos.
- D) El pago de combustibles, lubricantes, estopa, llantas y mantenimiento menor del equipo y maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra.

SÉPTIMO. - La forma de pago y la comprobación de las erogaciones se ajustarán a las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

Altar, Sonora, a 25 de Octubre de 2021

LIC. CARLOS ERNESTO ZATARAIN GONZÁLEZ
Coordinador General del CECOP

FET-1

En atención a la solicitud recibida por el grupo de ciudadanos demandantes de la obra; con fundamento en el Convenio de Coordinación que suscribimos el H. Ayuntamiento que me honro en presidir y el CECOP, de fecha 5 de Abril del 2021, para la operación del Programa de Participación Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 2021, me permito proponer la realización de la obra "Rehabilitación de Centro de Catecismo de Iglesia catolica San Antonio " de este Municipio

Anexo a la presente los siguientes documentos

1. Solicitud de la Comunidad al Presidente Municipal (FET-2)
2. Cédula de Información Básica (FET-3)
3. Presupuesto de la Obra desglosado por conceptos (FET-4, FET-4.1, FET-4.2 y FET-4)
4. Formatos de aceptación del Municipio de la participación de la Comunidad (FET-5 y F)
5. Proyecto Ejecutivo (Información Básica)
6. Programa de Ejecución de los trabajos (FET-6)
7. Croquis de Localización de la Obra (FET-7 y FET-8)
8. Finiquito de Obra (FET-9)
10. Acta de validación ciudadana sobre la priorización de la obra (COPLAM)
11. Fichas de depósito de las aportaciones del Municipio y de los beneficiarios en la Cuenta Concentradora del Ayuntamiento o, en su caso, constancia del Tesorero del Ayuntamiento.
12. Acta de la Asamblea de los beneficiarios en la que conste:
 - a) La elección democrática de la Mesa Directiva del Comité de Participación Social.
 - b) La aceptación de la obra, su presupuesto, proyecto y la modalidad de su aportación.

Con la seguridad de su atenta consideración y atención procedente, le ratifico nuestro saludo y respeto.

Atentamente

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL
Presidente Municipal



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

SOLICITUD DE OBRA

Altar, Sonora a 21 de Octubre de 2021.

Formato: FET-2

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL
Presidente Municipal
Presente.-

Por este conducto hacemos de su conocimiento que somos un grupo de Ciudadanos de la Colonia Centro de la localidad de Altar, de este Municipio.

Quienes tenemos interés en participar en el programa de Participación Social Sonorense, mediante el cual, queremos que se gestionen los recursos económicos del 75 % por parte del Gobierno del Estado para la realización de la obra "Rehabilitación de centro de Catecismo de iglesia Católica San Antonio", Nuestra comunidad está en disposición de aportar la cantidad de: \$18,976.46 (SON: Dieciocho mil novecientos setenta y seis pesos 46/00 M.N) ESPECIE Y MANO DE OBRA , para que a través del H. Ayuntamiento se ejecuten los trabajos antes descritos.

Sin más por el momento, quedamos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

Blanca Iba Espinoza

Rosal Sandoval M.

Rosa Rosa Hdez G.


Martine Salazar G

ana Luis Guea G

Maria del Carmen Limón G

Blanca Selene López

[Firma]



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

FET-3
CÉDULA DE
INFORMACIÓN BÁSICA

25 de Octubre de 2021

NOMBRE DE LA OBRA:	Rehabilitación de Centro de Catecismo de Iglesia catolica San Antonio
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	se realizaran actividades de consruccion de cadena de cerramiento reforzada con acero y enjarres grueso y fino asi como consruccion de banquetta con espesor de 10 cm.
LOCALIDAD:	Altar
MUNICIPIO:	Altar, Sonora
DOMICILIO:	calle hidalgo final sur S/n colonia centro

META OPERATIVA:	1 Obra	TOTAL BENEFICIARIOS:	250	
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 Semanas				
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO () ADMÓN. DIRECTA (x)				
APORTACIONES		EFFECTIVO	MANO DE OBRA	ESPECIE
AYUNTAMIENTO		-	X	X
COMUNIDAD		-	X	X

TOTAL		APORTACIONES (\$)	
CECOP	AYUNTAMIENTO	CECOP	AYUNTAMIENTO
151,811.65	113,858.73	18,976.46	18,976.46

ESTRUCTURA FINANCIERA	
CECOP	AYUNTAMIENTO
75.00%	12.50%

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL PRESIDENTE MUNICIPAL	C. JORGE ARSENIIO ESPINOZA LIMON. TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL RESPONSABLE (COORD. DEL CMOP, DIRECTOR DE OBRAS ...)
AYuntamiento de Altar	AYuntamiento de Altar
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD:	
-------------------------------------	--



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

FET-4
PRESUPUESTO DE OBRA
POR ADMINISTRACIÓN
DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA: Rehabilitación de Centro de Catecismo de Iglesia católica San Antonio

UBICACIÓN: calle hidalgo final sur S/n colonia centro

LOCALIDAD: Altar

MUNICIPIO:

Altar, Sonora

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)
MATERIALES Y RENTA DE EQUIPO:					
1	GRAVA	M3	5.00	235.00	\$ 1,175.00
2	ARENA	M3	17.00	245.50	\$ 4,173.50
3	CEMENTO	SACO	65.00	245.50	\$ 15,957.50
4	CAL	SACO	30.00	135.50	\$ 4,065.00
5	MORTERO	SACO	120.00	125.15	\$ 15,018.00
6	LADRILLO RECOCIDO	PZA	170.00	3.85	\$ 654.50
7	ALAMBRE RECOCIDO	KG	5.00	68.54	\$ 342.70
8	MADERA P/CIMBRE	FT/TAB	125.00	13.25	\$ 1,656.25
9	CLAVOS	KG	5.00	64.50	\$ 322.50
10	VARILLA DE 3/8"	PZA	17.00	264.25	\$ 4,492.25
11	CURACRETO	LTO	5.00	65.84	\$ 329.20
12	ARMEX CADENA	PZA	9.00	315.25	\$ 2,837.25
13	MALLA ELECTROSOLDADA	M2	35.00	46.58	\$ 1,630.30
14	AGUA P/CONSTRUCCION	M3	5.00	75.50	\$ 377.50
15	ANDAMIOS	TOR	2.00	134.31	\$ 268.62
16	REVOLVEDORA DE CEMENTO	HRA	24.00	65.25	\$ 1,566.00
17	CAMION E VOLTEO	HRA	4.00	500.00	\$ 2,000.00
18	HERRAMIENTA MENOR	M.O.	0.03	82,960.00	\$ 2,488.80
MANO DE OBRA:		SUMA DE MATERIALES Y R.E.			
1	OFICIAL DE ALBANIL	jor	58.00	520.00	\$ 30,160.00
2	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	60.00	460.00	\$ 27,600.00
3	PEON	jor	60.00	420.00	\$ 25,200.00
		SUMA DE MANO DE OBRA:			
				\$	82,960.00
				SUBTOTAL	142,314.87
				I.V.A. DE MATERIALES Y R.E.	\$ 9,496.78
				TOTAL:	\$ 151,811.65

NOTA.- EL CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DEBERÁ CONSIDERARSE POR COSTO HORARIO DE CADA MÁQUINA O EQUIPO.

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS O COORDINADOR DEL CMCOP

C. JORGE ARSENIUS ESPINOZA LIMON



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

FET-4
PRESUPUESTO DE OBRA
POR ADMINISTRACIÓN
DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA: Rehabilitación de Centro de Catecismo de Iglesia catolica San Antonio

UBICACIÓN: calle hidalgo final sur S/n colonia centro

LOCALIDAD: Altar

MUNICIPIO:

Altar, Sonora

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)
MATERIALES Y RENTA DE EQUIPO:					
1	GRAVA	M3	5.00	235.00	\$ 1,175.00
2	ARENA	M3	17.00	245.50	\$ 4,173.50
3	CEMENTO	SACO	65.00	245.50	\$ 15,957.50
4	CAL	SACO	30.00	135.50	\$ 4,065.00
5	MORTERO	SACO	120.00	125.15	\$ 15,018.00
6	LADRILLO RECOCIDO	PZA	170.00	3.85	\$ 654.50
7	ALAMBRE RECOCIDO	KG	5.00	68.54	\$ 342.70
8	MADERA P/CIMBRE	FT/TAB	125.00	13.25	\$ 1,656.25
9	CLAVOS	KG	5.00	64.50	\$ 322.50
10	VARILLA DE 3/8"	PZA	17.00	264.25	\$ 4,492.25
11	CURACRETO	LTO	5.00	65.84	\$ 329.20
12	ARMEX CADENA	PZA	9.00	315.25	\$ 2,837.25
13	MALLA ELECTROSOLDADA	M2	35.00	46.58	\$ 1,630.30
14	AGUA P/CONSTRUCCION	M3	5.00	75.50	\$ 377.50
15	ANDAMIOS	TOR	2.00	134.31	\$ 268.62
16	REVOLVEDORA DE CEMENTO	HRA	24.00	65.25	\$ 1,566.00
17	CAMION E VOLTEO	HRA	4.00	500.00	\$ 2,000.00
18	HERRAMIENTA MENOR	M.O.	0.03	82,960.00	\$ 2,488.80
SUMA DE MATERIALES Y R.E.				\$	59,354.87
MANO DE OBRA:					
1	OFICIAL DE ALBAÑIL	jor	58.00	520.00	\$ 30,160.00
2	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	60.00	460.00	\$ 27,600.00
3	PEON	jor	60.00	420.00	\$ 25,200.00
SUMA DE MANO DE OBRA:				\$	82,960.00
SUBTOTAL					142,314.87
I.V.A. DE MATERIALES Y R.E.					\$ 9,496.78
TOTAL:					\$ 151,811.65

NOTA.- EL CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DEBERÁ CONSIDERARSE POR COSTO HORARIO DE CADA MÁQUINA O EQUIPO.

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS O COORDINADOR DEL CMCOP

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LOMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

FET-4.1
RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO
Y LAS CANTIDADES QUE SE
EJECUTARÁN EN OBRA POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:

Rehabilitación de Centro de Catecismo de Iglesia catolica San Antonio

UBICACIÓN:

calle hidalgo final sur S/n colonia centro

LOCALIDAD:

Altar

MUNICIPIO:

Altar, Sonora

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
AL01	desprendimiento de ladrillos mal adheridos y/o mezclas en parte superior de barda. Incluye acarreo a pie de camion por medios manuales y/o carretilla herramienta y mano de obra.	m2	2.00 ✓	425.15	850.30
AL02	construcción de muro de ladrillo rojo recocido para dar altura a barda, pegado con mortero cemento-arena. Incluye; nivelado, plomeado, andamios, altura max a 2.50, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.00 ✓	485.65	1,456.95
AL03	construcción de cadena de cerramiento con concreto hidraulico f'c= 200 kg/cm2 reforzado con armex prefabricado y 2 varillas de 3/8" en lecho inferior y 1 varilla en lecho superior, dimensiones de 15 cm x 20 cm. Incluye; cimbra, colado, concreto h. en o., curado de los concretos, T.M.A. 3/4, andamios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	53.00 ✓	445.65	23,619.45
AL04	aplanado acabado grueso en muros con morero cemento - arena espesor max de 2.5 cm. Plomeado y regleado. Incluye; herramienta, andamios, humectado de superficie, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	426.00	166.85	71,078.10
AL05	Acabado fino en muros con cemento - cal - arena fina, acabado floteado Incluye; herramienta, andamios, humectado de superficie, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	426.00	86.85	36,998.10
AL06	construcción de banquetas de concreto hidraulico de 10 cm. De espesor con concreto hidraulico f'c=150 kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada, incluye; relleno en depresiones, cortes, compensaciones, afine, compactación con pizón a mano, humectado, revolvedora de un saco., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	30.00	515.25	15,457.50
AL07	limpieza general de obra, retiro de escombros en camion de volteo carga de escombros por medios manuales, herramienta y mano de obra.	lote	1.00	2,351.25	2,351.25
				TOTAL	\$ 151,811.65

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS O COORDINADOR DEL

CECOP

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



Gobierno del
Estado de Sonora



Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

FET-5
APORTACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE: Altar, Sonora FECHA: 25 de Octubre de 2021

NOMBRE DE LA OBRA: Rehabilitación de Centro de Catecismo de Iglesia catolica San Antonio

CONCEPTOS:	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P.U. \$	TOTAL \$	OBSERVACIONES
▶ MANO DE OBRA					
▶ MATERIALES Y SUMINISTROS					
▶ USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.					
OFICIAL DE ALBANIL	JOR	36	520.00	18,720.00	
ARENA	M3	0.901	284.78	256.46	
TOTAL:				18,976.46	

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS O COORDINADOR DEL

C. JORGE ARSENIÓ ESPINOZA LIMÓN
AYUNTAMIENTO DE ALTAR
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

ET-5.1

APORTACIÓN
DE LA COMUNIDAD

FECHA: 25 de Octubre de 2021

MUNICIPIO DE: Altar, Sonora

NOMBRE DE LA OBRA: Rehabilitación de Centro de Catecismo de Iglesia catolica San Antonio

CONCEPTOS: ▶ MANO DE OBRA ▶ MATERIALES Y SUMINISTROS ▶ USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. \$	TOTAL \$	OBSERVACIONES
PEON	JOR	44.00	420.00	18,480.00	
ARENA	M3	1.74	284.78	496.46	
TOTAL:				18,976.46	

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS
O
COORDINADOR DEL CMCOP



C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMÓN
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

MUNICIPIO DE:

Altar, Sonora

FECHA: 25 de Octubre de 2021

PROGRAMA
DE OBRA

FET-6

NOBRE DE LA OBRA:		Rehabilitación de Centro de Catecismo de Iglesia catolica San Antonio												LOCALIDAD: Altar			
ACTIVIDADES PRINCIPALES		PERIODO DE TIEMPO (SEMANA)												% DEL TOTAL			
		1		2		3		4									
desprendimiento de ladrillos mal adheridos y/o mezclas en parte superior de barda. Incluye acarreo a pie de camion por medios manuales y/o carretilla herramienta y mano de obra.																0.560	
construcción de muro de ladrillo rojo recocido para dar altura a barda, pegado conmortero cemento-arena. Incluye; nivelado, plomeado, andamios, altura max a 2.50, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.																0.960	
construcción de cadena de cerramiento con concreto hidraulico f'c= 200 kg/cm2 reforzado con armex prefabricado y 2 varillas de 3/8" en lecho inferior y 1 varilla den lecho superior, dimensiones de 15 cm x 20 cm. Incluye; cimbra, colado, concreto h. en o., curado de los concretos, T..M.A. 3/4, andamios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario																15.558	
aplanado acabado grueso en muros con morero cemento - arena espesor max de 2.5 cm. Plomeado y regleado. Incluye; herramienta, andamios, humectado de superficie, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.																46.820	
Acabado fino en muros con cemento - cal - arena fina, acabado floteado Incluye; herramienta, andamios, humectado de superficie, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.																24.371	
construcción de banquetta de concreto hidraulico de 10 cm. De espors con concreto hidraulico f'c=150 kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada, incluye; relleno en depresiones, cortes, compensaciones, afine, compactación con pizon a mano, humectado, revolvedora de un saco,, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.																10.182	
limpieza general de obra, retiro de escombros en camion de volteo carga de escombros por medios manuales, herramienta y mano de obra.																1.549	
AVANCE FINANCIERO (%)		20.0	15.0	15.0	15.0	10.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	100.0		



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

MUNICIPIO DE:

Altar, Sonora

FECHA: 25 de Octubre de 2021

NOBRE DE
LA OBRA:

Rehabilitación de Centro de Catecismo de Iglesia catolica San Antonio

LOCALIDAD: Altar

ACTIVIDADES PRINCIPALES

	PERIODO DE TIEMPO (SEMANA)				% DEL TOTAL
	1	2	3	4	
AVANCE FÍSICO (%)	0	5	5	10	10
					100

DIRECTOR DE OBRAS O COORDINADOR DEL CMCOP
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMÓN



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

FET-7
CROQUIS DE
MICROLOCALIZACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: Rehabilitación de Centro de Catecismo de Iglesia catolica San Antonio

LOCALIDAD: Altar MUNICIPIO: Altar, Sonora

UBICACIÓN DE LA OBRA: calle hidalgo final sur S/n colonia centro



DIRECTOR DE OBRAS O COORDINADOR DEL CMCOP

C. JORGE ARSENIÓ ESPINOZA LIMÓN.



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

FET-8
CROQUIS DE
MACROLOCALIZACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: Rehabilitación de Centro de Catecismo de Iglesia catolica San Antonio

LOCALIDAD: Altar

MUNICIPIO: Altar, Sonora

UBICACIÓN DE LA OBRA: calle hidalgo final sur S/n colonia centro



DIRECTOR DE OBRAS O COORDINADOR DEL CMCOP



C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



PROGRAMA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
1	28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2022	2 M2 DESPRENDIMIENTO DE LADRILLO EN MAL ESTADO, 3 M2 DE CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE LADRILLO, 20 ML DE CONSTRUCCION DE CADENA, 117 M2 DE ENJARRE GRUESO
2	07 AL 12 DE MARZO DE 2022	15 ML DE CONSTRUCCION DE CADENA, 135 M2 DE ENJARRE GRUESO
3	14 AL 20 DE MARZO DEL 2022	18 ML DE CONSTRUCCION DE CADENA, 144 M2 DE ENJARRE GRUESO
4	21 AL 27 DE MARZO	30 M2 DE ENJARRE GRUESO, 313.68 M2 DE ENJARRE FINO, 30 M2 DE BANQUETA Y LIMPIA GENERAL



SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON



REVISO

CONTRALORIA MUNICIPAL

C.P. LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA

ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2021-2024

FET-9

FINIQUITO DE OBRA

CONCERTACIÓN
PARA LA OBRA
PÚBLICA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO		FECHA: 20 DE ABRIL DEL 2022	
DOMICILIO: CALLE HIDALGO SUR ENTRE AV. PEDRO PABLO VARELA Y AV. EVARISTO ARAIZA, COL CENTRO			
LOCALIDAD: ALTAR		MUNICIPIO: ALTAR	
OFICIO DE LIBERACIÓN: CEGOP-PN-21R-026	META OPERATIVA: 1 OBRA		
FECHA DE LIBERACIÓN: 21 DE ENERO DE 2022	SUBPROGRAMA: EDIFICIOS PÚBLICOS		
NÚMERO DE OBRA: PN-065	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
NÚM. DE BENEFICIARIOS: 250	TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4.00 SEMANAS		
		COSTO TOTAL	151,811.65
		G.E.C.O.P.	113,858.73
		H. AYTO.	18,976.46
		COMUNIDAD	18,976.46


CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO				DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
AL01	DESPRENDIMIENTO DE LADRILLOS MAL ADERIDOS Y/O MEZCLAS EN PARTE SUPERIOR DE BORDA. INCLUYE ACARREOS A PIE DE CAMIÓN POR MEDIOS MANUALES Y/O CARRETILLA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	2.00	425.15	850.30	2.00	850.30	0.00	0.00	0.00	0.00
AL02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO PARA DAR ALTURA A LA BORDA, PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE: NIVELADO PLOMEADO, ANDAMIOS, ALTURA MAX A 2.5, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	M2	3.00	485.65	1,456.95	3.00	1,456.95	0.00	0.00	0.00	0.00
AL03	CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX PREFABRICADO Y 2 VARILLAS DE 3/8" EN LECHO INFERIOR Y 1 VARILLA EN LECHO SUPERIOR, DIMENSIONES DE 15 CM X 20 CM. INCLUYE: CIMBRA, COLADO, CONCRETO H EN. O. CURADO CON LOS CONCRETOS, T.M.A 3/4, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	53.00	445.65	23,619.45	53.00	23,619.45	0.00	0.00	0.00	0.00
AL04	APLANADO ACABADO GRUESO EN MUROS CON MORTERO-CEMENTO-ARENA ESPESOR MAX. DE 2.5 CM. PLOMEADO Y REGLEADO. INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, HUMECTADO DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	426.00	166.85	71,078.10	426.00	71,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00
AL05	ACABADO FINO EN MUROS CON CEMENTO-CAL-ARENA FINA, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, HUMECTADO DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	426.00	86.85	36,998.10	426.00	36,998.10	0.00	0.00	0.00	0.00

FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO		FECHA:	
DOMICILIO:		CALLE HIDALGO SUR ENTRE AV. PEDRO PABLO VARELA Y AV. EVARISTO ARAIZA, COL CENTRO		20 DE ABRIL DEL 2022	
LOCALIDAD:		ALTAR			
		MUNICIPIO:		ALTAR	
OFICIO DE LIBERACIÓN:		CECOP-PN-21R-026		1 OBRA	
FECHA DE LIBERACIÓN:		21 DE ENERO DE 2022		EDIFICIOS PUBLICOS	
NÚMERO DE OBRA:		PN-065		MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	
NÚM. DE BENEFICIARIOS:		250		TIEMPO DE EJECUCIÓN:	
				4.00 SEMANAS	
				ESTRUCTURA FINANCIERA	
		COSTO TOTAL		H. AYTO.	
		151,811.65		113,858.73	
				18,976.46	
				18,976.46	

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO				EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
AL06	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HIDRAULICO DE FC=150 KG7CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE; RELLENO DE DEPRESIONES, CORTES, COMPENSACIONES, AFINE, COMPACTACION CON PIZON A MANO, HUMECTADO, REVOLVEDORA DE UN SACO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	30.00	515.25	15,457.50	30.00	15,457.50	0.00	0.00
AL07	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMION DE VOLTEO. CARGA DE ESCOMBRO POR MEDIOS MANUALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	LOTE	1.00	2,351.25	2,351.25	1.00	2,351.25	0.00	0.00
					IMPORTE DE OBRA		\$151,811.65		
					IMPORTE EJERCIDO		\$151,811.65		
					SALDO		\$0.00		

PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS:



C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMÓN

ÓRGANO DE CONTROL



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

NOMBRE DE LA OBRA: Rehabilitación de Centro de Catecismo de Iglesia catolica San Antonio		FECHA: 25 de Octubre de 2021	
DOMICILIO: calle hidalgo final sur S/n colonia centro			
LOCALIDAD: Altar	MUNICIPIO : Altar, Sonora		
OFICIO DE LIBERACIÓN:	META OPERATIVA: 1 Obra		
FECHA DE LIBERACIÓN:	SUBPROGRAMA: Edificios Publicos		
N° DE OBRA:	MODALIDAD DE EJECUCIÓN Administración Directa		
N° BENEFICIARIOS 250	TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 Semanas		

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO			EJERCIDO			DIFERENCIA		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	COMUNIDAD
	desprendimiento de ladrillos mal adheridos y/o mezclas en parte superior de barda. Incluye acarreo a pie de camion por medios manuales y/o carretilla herramienta y mano de obra.	m2	2.00	425.15	\$ 850.30					
	construcción de muro de ladrillo rojo recocido para dar altura a barda, pegado con mortero cemento-arena. Incluye: nivelado, plomeado, andamios, altura max a 2.50, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.00	485.65	\$ 1,456.95					
	construcción de cadena de cerramiento con concreto hidráulico f'c=200 kg/cm2 reforzado con armex prefabricado y 2 varillas de 3/8" en lecho inferior y 1 varilla den techo superior, dimensiones de 15 cm x 20 cm. Incluye: cimbra, colado, concreto h. en o., curado de los concretos, T.M.A. 3/4, andamios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	53.00	445.65	\$ 23,619.45					
	aplanado acabado grueso en muros con mortero cemento - arena espesor max de 2.5 cm. Plomeado y regleado. Incluye: herramienta, andamios, humectado de superficie, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	426.00	166.85	\$ 71,078.10					
	Acabado fino en muros con cemento - cal - arena fina, acabado floreado Incluye: herramienta, andamios, humectado de superficie, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	426.00	86.85	\$ 36,998.10					
	construcción de banqueta de concreto hidráulico de 10 cm. De espesor con concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2 reforzado con mallas electrosoldada, incluye: relleno en depresiones, cortes, compensaciones, afine, compactación con pizon a mano, humectado, revoladora de un saco., herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	30.00	515.25	\$ 15,457.50					
	limpieza general de obra, retiro de escombros en camion de volteo carga de escombros por medios manuales, herramienta y mano de obra.	lote	1.00	2,351.25	\$ 2,351.25					
				SUMA	\$ 151,811.65					

IMPORTE DE OBRA	
IMPORTE EJERCIDO	
SALDO	

PRESIDENTE MUNICIPAL

JC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIY



DIRECTOR DE OBRAS O COORDINADOR DEL CMCOP

CMCOP



C. JORGE ARSENO ESPINOZA LIMON.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

ÓRGANO DE CONTROL



C.P. Luis Alonso Macslavine Miranda

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

SUMINISTRO DE MATERIALES
CECOP
AYUNTAMIENTO DE ALTAR



REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO

OBRA:

No.	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	GRAVA	M3	5.0																
2	ARENA	M3	17.0																
3	CEMENTO	SACO	65.0																
4	CAL	SACO	30.0																
5	MORTERO	SACO	120.0																
6	LADRILLO RECOCIDO	PZA	170.0																
7	ALAMBRE RECOCIDO	KG	5.0																
8	MADERA PARA CIMBRA	FT/TAB	125.0																
9	CLAVOS	KG	5.0																
10	VARILLA DE 3/8"	PZA	17.0																
11	CURACRETO	LTO	5.0																
12	ARMEX CADENA	PZA	9.0																
13	MALLA ELECTROSOLDADA	M2	35.0																
14	AGUA PARA CONSTRUCCION	M2	5.0																
15	ANDAMIOS	TOR	2.0																
16	REVOLVEDORA DE CEMENTO	HRA	24.0																
17	CAMION DE VOLTEO	HRA	4.0																
18	HERRAMIENTA MENOR	M.O	0.03																



C. JORGE ARSENO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2021-2024



25 DE FEBRERO DEL 2022
ALTAR, SONORA

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE**

DESIGNACIÓN RESIDENTE DE OBRAS

Por medio de la presente y a fines de los interesados me permito hacer de su conocimiento que se designa como **Residente de obras** del H. Ayuntamiento de Altar, Sonora, en obras de "administración directa" al **C. Jorge Arsenio Espinoza Limón**, para que supervise la obra: **"REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO"**

Sin más por el momento me despido con un cordial saludo.



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

C.P LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION
GUBERNAMENTAL
ALTAR, SONORA

C.C.P.ARCHIVO



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

FOTOS ANTES DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: Rehabilitación de Centro de Catecismo de Iglesia catolica San Antonio

LOCALIDAD: Altar

MUNICIPIO: Altar, Sonora


UBICACIÓN




DIRECTOR DE OBRAS O COORDINADOR DEL CMCOP



C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

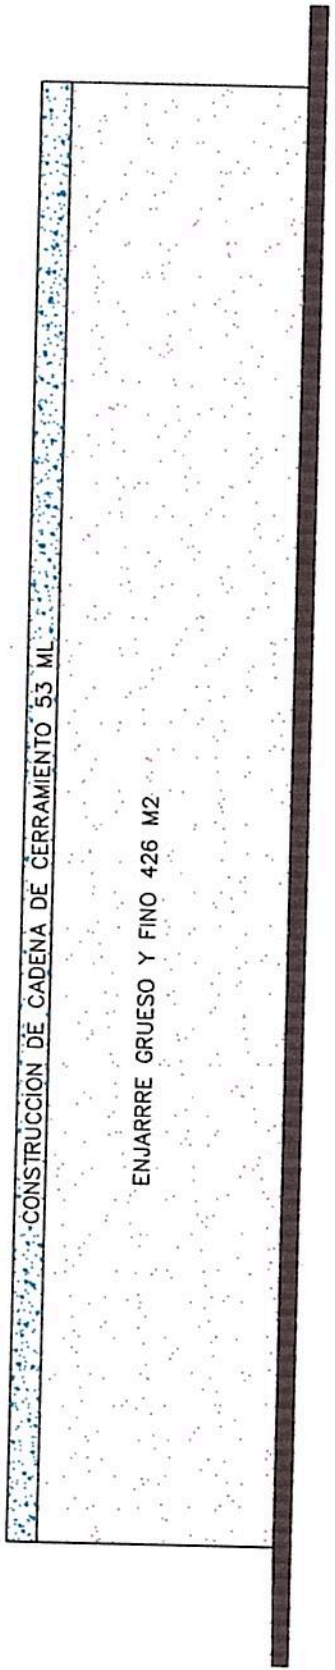

CONSTRUCCION DE BANQUETA 30 M2

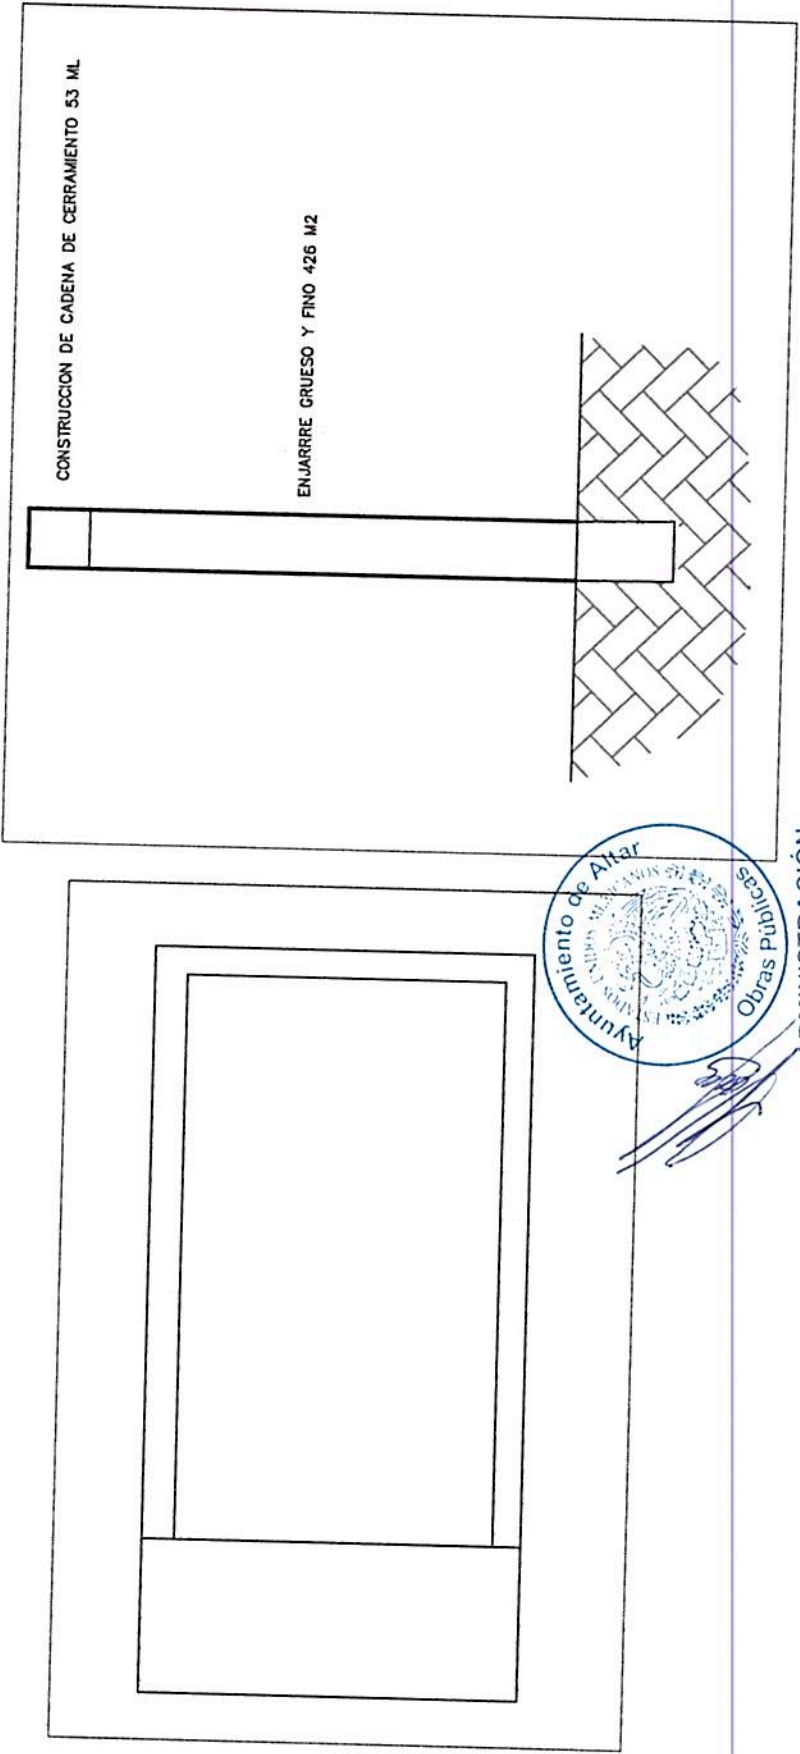

CONSTRUCCION DE CADENA DE CERRAMIENTO 53 ML

ENJARRRE GRUESO Y FINO 426 M2

CONSTRUCCION DE BANQUETA 30 M2

CONSTRUCCION DE CADENA DE CERRAMIENTO 53 ML

ENJARRRE GRUESO Y FINO 426 M2



[Handwritten signature]



cecop

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO




ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



cecop

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO

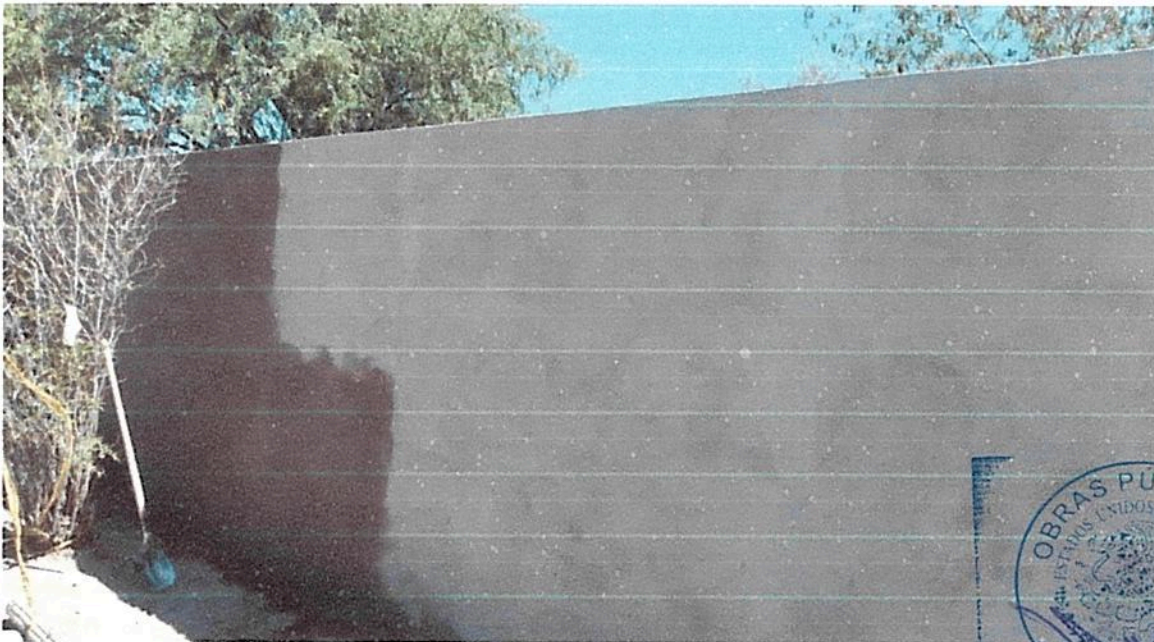


ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



cecop

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO

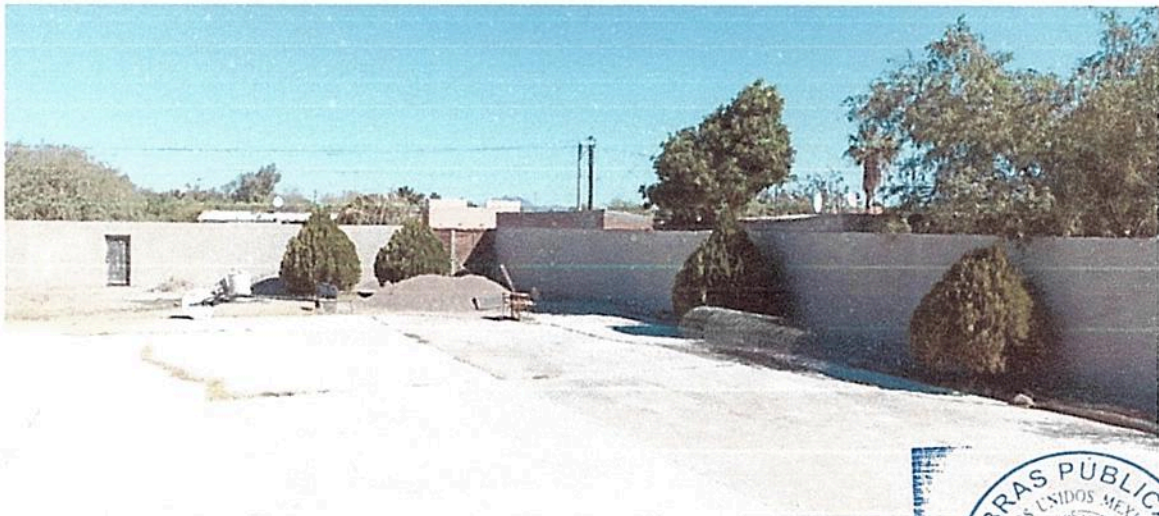



cecop

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO



FOTOS DEL LUGAR, DESPUÉS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO DE IGLESIA CATÓLICA
NOMBRE DE LA OBRA: SAN ANTONIO

LOCALIDAD: ALTAR

MUNICIPIO: ALTAR



DIRECTOR DE OBRAS



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMÓN

FOTOS DEL LUGAR, DESPUÉS DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO DE IGLESIA CATÓLICA
NOMBRE DE LA OBRA: SAN ANTONIO

LOCALIDAD: ALTAR MUNICIPIO: ALTAR



DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



COMPROBACION DE GASTO

CECOP 2021

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO

Pago	Fecha	Destino	Concepto	cantidad
Transferencia	24/02/2022	Vision XXI STG	Cemento, Mortero y Malla	\$ 16,981.97
Transferencia	24/02/2022	Vision XXI STG	Mortero, Varilla, Castillos, Madera y Clavos	\$ 19,363.20
Transferencia	24/02/2022	Vision XXI STG	Cemento	\$ 16,200.00
Cheque #079	02/05/2022	Francisco Gabriel Celaya	Renta Maquinaria	\$ 5,645.28
Transferencia	05/04/2022	Vision XXI STG	Materiales Menores	\$ 3,663.07
Cheque #076	05/03/2022	Jorge Arsenio Espinoza Limon	Nomina 28 Feb al 04 Marzo	\$ 17,220.00
Cheque #077	18/03/2022	Jorge Arsenio Espinoza Limon	Nomina 07 al 12 Marzo	\$ 17,220.00
Cheque #078	31/03/2022	Jorge Arsenio Espinoza Limon	Nomina 21 al 27 Marzo	\$ 17,560.00
			Total	\$ 113,853.52

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Transferencias SPEI

24/02/2022 14:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0453243210
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC o CURP del Ordenante	MAL840101S34
Moneda	MXP
ID Tercero	09
Nombre del Beneficiario	VISION XXI STG S.A. DE C.V.
Cuenta/CLABE/Celular	002765021067696591
RFC Beneficiario	VVS081231SR8
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$16,981.97
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/02/2022
Número de Referencia	240222
Propósito de la Transferencia	pago de material de factura fa0230155
Clave de Rastreo	8846APR2202202241615705479
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha Captura	24/02/2022 14:47:30 p. m.
Ejecutó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha de Ejecución	24/02/2022 14:50:44 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.
C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1353 FAX 01(637) 373-0359SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SANIC, COL. CENTRO
C.P. 83750 ALTAR, SONORA
TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0562 Lugar de Expedición: 83750

FERRETERIA ALTAR

ALTAR, SONORA. A 23 DE FEBRERO DEL 2022.

FACTURA

FA0230155

Tipo de Comprobante : Ingreso

CONDICIONES: CREDITO

Empleado: RAMON ESTEBAN AHUMADA GAMECA

DATOS DEL TIMBRADO:

Certificado Emisor:
00001000000510013041Certificado SAT:
00001000000504204971Folio Fiscal:
D6046B2B-E741-4ADA-AC88-862E27251E99Fecha Timbrado:
2022-02-23T12:44:18Cliente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
Domicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, CENTRO C.P.83750Ciudad: ALTAR, SONORA
RFC: MAL840101S34

Clave	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
MA250C10	MTK-Metr o cuadrado	35.0000	[31162800-Ferretería en general] MALLA PARA PISO ELECTROSOLDADA DE 2.5 X 4 CALIBRE 10	33.48	1,171.80
CG	XSA-Sac o KILOS	15.0000	[30111601-Cemento] CEMENTO GRIS CAMPANA. SACO DE 50	300.00	4,500.00
CM25	XSA-Sac o	75.0000	[30111601-Cemento] CEMENTO MORTERO. SACO DE 25 KILOS	134.03	10,052.25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]D6046B2B-E741-4ADA-A088-862E27251E99|2022-02-23T12:44:18|E++qLHul+HUI+eC1YFQKBSN2MbaJ/esrHCDKChSx1fu17h4+2u6Jj0KAoYIZDvBeE+LOcGnJFMxQESNhbv9DhM1XVsvVWOoYal6ObAjpzNm
HZYQQPHgruQbxUB0LaG8vndg0RzkpucewVCbdNv9tUyidUOe49qeUKHH9Z7FDK0oGPVjWg5cNv4Rr/4TFH70/RKZvj5WvgTowyS4siAxdwzSIRYbFeTWwUCJ0t0NCnMAJs7HJMWW26PYab9+7PantPNSvG2BURmEe
Mio5w7C05OcW19wJf/RISDELgh5+hBnUPZodnoqaMsE9J37OdnzbW11WMSFvzfQ==|00001000000504204971|]

Sello Digital del SAT:

E++qLHul+HUI+eC1YFQKBSN2MbaJ/esrHCDKChSx1fu17h4+2u6Jj0KAoYIZDvBeE+LOcGnJFMxQESNhbv9DhM1XVsvVWOoYal6ObAjpzNmHZYQQPHgruQbxUB0LaG8vndg0Rzk
kpucewVCbdNv9tUyidUOe49qeUKHH9Z7FDK0oGPVjWg5cNv4Rr/4TFH70/RKZvj5WvgTowyS4siAxdwzSIRYbFeTWwUCJ0t0NCnMAJs7HJMWW26PYab9+7PantPNSvG2BURmEeM
Io5w7C05OcW19wJf/RISDELgh5+hBnUPZodnoqaMsE9J37OdnzbW11WMSFvzfQ==

Sello Digital del Emisor:

Hsr2le7GNhbdP+X/mgGWM/YxtjdRpm8d3LdM0bvvhwVktM2GHXyRLwIP1aKil8/n9CAOX0L9fUykceqQEXyR2BL9aez/c8aPn/W8EN/6m0TYIoENIR7g1T+34gKxYxyERqIBEv0ARvR
a6pgP9Rmclv3l1+usLXSVQfSoG+nb8EQWDMNxyTJ1FPaJ9Y51/kJuGJidKHR1nd2DC78xo7ITMCMn6tblGLIKb9Z+Wo1gRNzwBow1qUXs5R0UVJQWn26ZVFdc2OxwHECmYwyD
TKnDhAubXKlPdM01vFmRzNee1fwi/Fh4RPr1113akI5nKAGYA==

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 97/100 M.N.

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido

UsoCFDI: P01

Forma de Pago: 99.

PAGARE No. FA0230155.

BUENO POR \$16,981.97

EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 23 de FEBRERO del 2022.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 25 de MARZO del 2022, la cantidad de \$16,981.97 (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 97/100 M.N) valor o importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34

SUSCRIPTOR Y AVAL

FA0230155

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1.

Pago en una sola exhibición. Toda Devolución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

23/02/2022 11:52:00a. m.



Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/02/2022 14:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0453243210
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC o CURP del Ordenante	MAL840101S34
Moneda	MXP
ID Tercero	09
Nombre del Beneficiario	VISION XXI STG S.A. DE C.V.
Cuenta/CLABE/Celular	002765021067696591
RFC Beneficiario	VVS081231SR8
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$19,363.20
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/02/2022
Número de Referencia	240222
Propósito de la Transferencia	pago de material fa0230154
Clave de Rastreo	8846APR220220241615705484
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha Captura	24/02/2022 14:46:22 p. m.
Ejecutó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha de Ejecución	24/02/2022 14:50:44 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



FERRETERIA ALTAR

ALTAR, SONORA. A 23 DE FEBRERO DEL 2022.

VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITUITO NO. 30 CESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.
C.P. 83820, H. CABORCA, SONORA.
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SANIC, COL. CENTRO
C.P. 83750 ALTAR, SONORA

TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0562 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA

FA0230154

Tipo de Comprobante: Ingreso

CONDICIONES: CREDITO

Empleado: RAMON ESTEBAN AHUMADA GAMECA

DATOS DEL TIMBRADO:

Certificado Emisor:
000000000510013041Certificado SAT:
000000000504204971Folio Fiscal:
8F3AB3CF-D032-4C12-B11F-7C6BAE560F36Fecha Timbrado:
2022-02-23T12:43:59Cliente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
Domicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, CENTRO C.P.83750Ciudad: ALTAR, SONORA
RFC: MAL840101S34

Clave	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
CCC212	KGM-Kilo	5.0000	[31162002-Clavos de sombrerete] CLAVO COMÚN CON CABEZA DE 2 1/2". KILO	54.06	270.30
15204	H87-Pieza	9.0000	[20121114-Zapatillas de flotación] CASTILLOS FORMADOS DE 15 CM. X 20 CM. X 6 MTS. DE 4 LADOS	247.77	2,229.93
VC3812	H87-Pieza	17.0000	[30102404-Varillas de acero] VARILLA CORRUGADA DE 3/8" X 12 METROS	211.31	3,592.27
CM25	XSA-Sac	75.0000	[30111601-Cemento] CEMENTO MORTERO. SACO DE 25 KILOS	134.03	10,052.25
MA4	FOT-Pie	58.6700	[11121600-Madera] MADERA ÁSPERA DE PINO # 4--> RUSTICA (5) de 1" X8" X10' --> RUSTICA (2) de 1" X8" X14'	30.41	1,784.15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]8F3AB3CF-D032-4C12-B11F-7C6BAE560F36[2022-02-23T12:43:59]R50882886W3UUV0TQhtyITGFA7528i8LKkH6MgBV51c4sDWYMEy/XnSAaT8veyX6uV6E2fU0r0vtdvJDAneqk5R6WN2Y/ACIXPSnQjzxDppj2GmBFYV3nz9GAJnzLdn0CxrKkUW2aEb76wNagHrDR5bNhMy7i+N8CyQ4ybnZY/heTyBLCxeRWxQJw+Mk2izEW311CGNpOTwH4bZprQnfR528KEkmgz8AC1+C4yTxQhF6buJ3KLKwR5Nyr4H1S0+qFvL9S00s6R2aStFVotTq9iGLcIAUJGyP0hBTQ2hUq5Bx0a9TsX0ayRSVckzG/Y124X7EkiFg==[00001000000504204971]

Sello Digital del SAT:

Rs0c82X9n6wL3UV0TQhtyITGFA7528i8LKkH6MgBV51c4sDWYMEy/XnSAaT8veyX6uV6E2fU0r0vtdvJDAneqk5R6WN2Y/ACIXPSnQjzxDppj2GmBFYV3nz9GAJnzLdn0CxrKkUW2aEb76wNagHrDR5bNhMy7i+N8CyQ4ybnZY/heTyBLCxeRWxQJw+Mk2izEW311CGNpOTwH4bZprQnfR528KEkmgz8AC1+C4yTxQhF6buJ3KLKwR5Nyr4H1S0+qFvL9S00s6R2aStFVotTq9iGLcIAUJGyP0hBTQ2hUq5Bx0a9TsX0ayRSVckzG/Y124X7EkiFg==

Sello Digital del Emisor:

img+NVZcCM0ZC1eN2AuqD0yoeN7irXDbGxVCvj+xtx1DT71cYwip0NtR5ShwvGPGXvcrUyWwALDmGXtu9JTHaXOHOs7vLOFKSCu5TZ52srkFUVfBd+pc6P/niv5JINKuAOEIKSeOci1x31mtm+0Xonl1AbwTIST43n9bXUpClnY0nOLhzcRd9T1548DIAF2GEzTuC+ydLh8TQlnHXaFZHYU+TFRMKMie2qNCpqdbgdUJ3WpJg3hjmXyA7f0utFi58hCyB6vK7IwVqxmIRRIRNcUJFF0377nmI 2RKF1IRKIAV5RnWm92n1i7KNNR1 R+Q==

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

UsoCFDI: P01

Forma de Pago: 99.

PAGARE No. FA0230154.

BUENO POR \$19,363.20

EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 23 de FEBRERO del 2022.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 25 de MARZO del 2022, la cantidad de \$19,363.20 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N) valor o importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34

Subtotal	17,928.90
	0.00
IVA	1,434.30
TOTAL	19,363.20

SUSCRIPTOR Y AVAL

FA0230154

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1.

Pago en una sola exhibición. Toda Devolución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

23/02/2022 11:51:59a. m.



Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/02/2022 14:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0453243210
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC o CURP del Ordenante	MAL840101S34
Moneda	MXP
ID Tercero	09
Nombre del Beneficiario	VISION XXI STG S.A. DE C.V.
Cuenta/CLABE/Celular	002765021067696591
RFC Beneficiario	VVS081231SR8
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$16,200.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/02/2022
Número de Referencia	240222
Propósito de la Transferencia	para obra rehabilitacion fa0230156
Clave de Rastreo	8846APR2202202241615705475
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha Captura	24/02/2022 14:48:42 p. m.
Ejecutó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha de Ejecución	24/02/2022 14:50:44 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.
C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO
C.P. 83750 ALTAR, SONORA

TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0562 Lugar de Expedición: 83750

FERRETERIA ALTAR

ALTAR, SONORA. A 23 DE FEBRERO DEL 2022.

FACTURA

FA0230156

Tipo de Comprobante: Ingreso

CONDICIONES: CREDITO

Empleado: RAMON ESTEBAN AHUMADA GAMEGA

DATOS DEL TIMBRADO:

Certificado Emisor:
00001000000510013041Certificado SAT:
00001000000504204971Folio Fiscal:
F1B4A74D-80D7-45C0-B650-153F2E08EE53Fecha Timbrado:
2022-02-23T12:44:43

Cliente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
Domicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, CENTRO C.P.83750
Ciudad: ALTAR, SONORA
RFC: MAL840101S34

Clave	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
CG	XSA-Sac o	50.0000	[30111601-Cemento] CEMENTO GRIS CAMPANA. SACO DE 50 KILOS	300.00	15,000.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F1B4A74D-80D7-45C0-B650-153F2E08EE53|2022-02-23T12:44:43|U1j00wVn+krDr8DjsgWQskzD07R1D0fDFZuuqS6hw04BIHEwzTMs2AFINJ+8ANNpB7nDqv23og3z4oRw93F1a+//3laKTPVDx9E4WA1+5QpY7pGRpn3miK3y1hpUALIR1oRsunNg9vLihzKNo2Eyq9GbT/DLXpZcekMGO2O8q56cvWRb7qbmPNn8BOfnXs49TicfSNmdYkAiebsA+M2r+HTgB4gxlY1TiryX7x5hBMh3DBXve23A8u6OdTWy/3SmYMRtLMXbRxcnc0h4pTOPjdS0Ony5st+7oxlBC9S0Lvo8YHwaCGKml0tVp494ln3+ntw4vguaNBzdA==|00001000000504204971|

Sello Digital del SAT:

U1j00wVn+krDr8DjsgWQskzD07R1D0fDFZuuqS6hw04BIHEwzTMs2AFINJ+8ANNpB7nDqv23og3z4oRw93F1a+//3laKTPVDx9E4WA1+5QpY7pGRpn3miK3y1hpUALIR1oRsunNg9vLihzKNo2Eyq9GbT/DLXpZcekMGO2O8q56cvWRb7qbmPNn8BOfnXs49TicfSNmdYkAiebsA+M2r+HTgB4gxlY1TiryX7x5hBMh3DBXve23A8u6OdTWy/3SmYMRtLMXbRxcnc0h4pTOPjdS0Ony5st+7oxlBC9S0Lvo8YHwaCGKml0tVp494ln3+ntw4vguaNBzdA==

Sello Digital del Emisor:

c+0l9Yf5S5p2cRDYss+dK5c4qO6i4XaDFSlwDy05gSaQ9yJz3kPAzYSBphNVEVWvCZKmsXKdG7azYILRhCvBBAR8fNxpqiczNwqozonxuhIRGTUJicCmMeCEtGmRjUnrra6126ZdoPs p7Jcb6orizutslsSlqQZ7osGVZ6UEj5YSzZs3VzikropmN7Yrs9R4Uv5PzCYhuIPiULd3SXe3KJJzyvM3B2P4GKNY1zWJXmD3JfXgK8fUnkK7c4LqJEZ.OkXl8hhlFhAO7SHu19lvqCg6wC2/qyf nKCRGvA5n2kXlvDraawRPUVd9D14v7iJnKd7wVd11319A==



DIECISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

UsoCFDI: P01

Forma de Pago: 99.

PAGARE No. FA0230156.

BUENO POR \$16,200.00

EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 23 DE FEBRERO del 2022.

Subtotal	15,000.00
	0.00
IVA	1,200.00
TOTAL	16,200.00

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 25 de MARZO del 2022, la cantidad de \$16,200.00 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) valor o importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34

SUSCRIPTOR Y AVAL

FA0230156

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1.

Pago en una sola exhibición. Toda Devolución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

23/02/2022 11:52:01a.m

I - Factura - VERSIÓN 3.3

193

No. de serie del CSD del emisor

00001000000502933784

Fecha y Hora de emisión

2022-05-02T10:20:10

Folio Fiscal

1F28F87B-CA3C-11EC-BB26-00155D014009

Emisor

RFC: CEFR990915IA3

Razón Social: FRANCISCO GABRIEL CELAYA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 83750

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2022-05-02T12:20:11

00001000000504587508

02 - Cheque nominativo

Receptor

RFC: MAL840101S34

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: MUNICIPIO DE ALTAR

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
4.000000	E48 - Unidad de servicio	CAMIÓN DE VOLTEO ClaveProdServ - 30191800 - Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$2,000.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$320.000000	500.000000	2,000.000000
24.000000	E48 - Unidad de servicio	REVOLVERDORA ClaveProdServ - 30191800 - Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,566.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$250.560000	65.250000	1,566.000000
2.000000	E48 - Unidad de servicio	ANDAMIOS ClaveProdServ - 30191800 - Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$268.620000 Tasa - 0.160000 Importe - \$42.979200	134.310000	268.620000
5.000000	E48 - Unidad de servicio	AGUA PARA CONSTRUCCION ClaveProdServ - 30191800 - Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$377.500000 Tasa - 0.160000 Importe - \$60.400000	75.500000	377.500000
170.000000	E48 - Unidad de servicio	LADRILLOS ClaveProdServ - 30191800 - Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al	3.850000	654.500000

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,1]]1F28F87B-CA3C-11EC-BB26-00155D014009|2022-05-02T12:20:11|TEN840609RKA|d3nyUs+AO7CE25nM5JHOQaEls4EmBHOQyPjmolylLWn5NO4gZ34|AN2S1ICPJ1WrmnX3UI7EnWeloX3R0OVS/AxPU|VD4wodaJaWDCfHMu1mx6eXZiFETHvsputymv1IAKjD6v8p0HT0gLFPI1SDGUzMDUqnlFZcR0X2650pFHD0g3Z5jhbOqyilLuU|ECIQ5OLDHqCgI2Ia2vJcy7uVRypdIPxwmj8RLIEIXWa53YIEwPWXVTSHCAFDmXORNS5w1LM4URAMDDVAUK6kzqCq7ABYv9AI20gNVpIgeQx+3J79+d/wboJHhO+rC|7eGxwv8jd+47rJw==|00001000000504587508]]

Sello digital del emisor

d3nyUs+AO7CE25nM5JHOQaEls4EmBHOQyPjmolylLWn5NO4gZ34|AN2S1ICPJ1WrmnX3UI7EnWeloX3R0OVS/AxPU|VD4wodaJaWDCfHMu1mx6eXZiFETHvsputymv1IAKjD6v8p0HT0gLFPI1SDGUzMDUqnlFZcR0X2650pFHD0g3Z5jhbOqyilLuU|ECIQ5OLDHqCgI2Ia2vJcy7uVRypdIPxwmj8RLIEIXWa53YIEwPWXVTSHCAFDmXORNS5w1LM4URAMDDVAUK6kzqCq7ABYv9AI20gNVpIgeQx+3J79+d/wboJHhO+rC|7eGxwv8jd+47rJw==

Sello digital del SAT

IB/w7LQ2C4pVfUcnaRfKjQDWTJcCjuOyYQR0trC4qppGQZrTJv8ROPGRs1u2knTrVjQBapqL7xGQJN2qNWYjgAcS/Eb1D0Kay/NBZcWvFRWQ2LJkvoza10VZP3Kn dxQgIBLdC1nNQntwQKfPuKIU5RcAp0eG/P0UJoWqHKEP+DRvNoHIEPZ1oeC2yRBJUYXWyz9ulSTDYqRveJey2GGOPa3BuQ%ZbqG3rkDioHKSe87lchu0+hgrbg BT3hg+cc972IQd5fCHYxLm9GyYPEWtnZaBqUHiswtkgq9/svyKmdEWtnZG0le+5VBV6wdGrqwfCT08Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

I - Factura - VERSIÓN 3.3

193

No. de serie del CSD del emisor

00001000000502933784

Fecha y Hora de emisión

2022-05-02T10:20:10

Folio Fiscal

1F28F87B-CA3C-11EC-BB26-00155D014009

Emisor

RFC: CEFR990915IA3

Razón Social: FRANCISCO GABRIEL CELAYA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 83750

Fecha y hora de
certificación

2022-05-02T12:20:11

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

02 - Cheque nominativo

Receptor

RFC: MAL840101S34

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: MUNICIPIO DE ALTAR

mantenimiento

No. ID:

Impuestos:

Traslados: 002 IVA Base - \$654.500000 Tasa - 0.160000 Importe - \$104.720000

TOTAL EN LETRA:

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 MXN

Subtotal

4,866.62 MXN

IVAT 0.160000

778.659200 MXN

Total

5,645.28 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]1F28F87B-CA3C-11EC-BB26-00155D014009[2022-05-

02T12:20:11]TDN040609RKAjd3nyUs+AO7CE25nM3JHOQaE3u54fEmBHOQqyPjmolyyLWn5NO4gZ34/AN251ICPJ1WrmnX3UI7EnWefcX9R0OV5/AsPUjVD4wodaJaWDCfMufm1x6eXZ/FETHvsPymv11AKjD6v8p8Ht0gLF11SDGUzMDUgnfZcR0X269bpfHFDg3Z5jhbOqyILuUjECiQ5OLDHqCgZ3a2vJcy7uVRypADPawmj6R8LIEnXW51Y/YEwPWXVTSHCAFDmXOrN3Sw1LM4URaMDDVAUK8tkzqCq7ABYv79AI20gNVpIsgeQx+2J79+dwboJHhO+Cj7eGxwvSjld+47rJw==100001000000504587508[1]

Sello digital del emisor

d3nyUs+AO7CE25nM3JHOQaE3u54fEmBHOQqyPjmolyyLWn5NO4gZ34/AN251ICPJ1WrmnX3UI7EnWefcX9R0OV5/AsPUjVD4wodaJaWDCfMufm1x6eXZ/FETHvsPymv11AKjD6v8p8Ht0gLF11SDGUzMDUgnfZcR0X269bpfHFDg3Z5jhbOqyILuUjECiQ5OLDHqCgZ3a2vJcy7uVRypADPawmj6R8LIEnXW51Y/YEwPWXVTSHCAFDmXOrN3Sw1LM4URaMDDVAUK8tkzqCq7ABYv79AI20gNVpIsgeQx+2J79+dwboJHhO+Cj7eGxwvSjld+47rJw==

Sello digital del SAT

IBe7LQ2C4gVfUcnRfEiQDWJtqCjvOyYQR0tc4apqGZRTJjv8ROPGRs1u2hnTrVjQBapqL7xOQjN28qNWYjqAcE/b1DKay/NBZcWvF8W12LJkvoxx1OVZP3KndeQg8DLCD1nNQHtWQKfPwKIU5RcAp0eGf9tUoWqHk6iP+DRvNoHIEPZ1oeC2yRBjUYXWYza3uLSTDYqRvo2Jny2GgG0Pa7BuQ/NZbqG8rkDloHK5e87Ichu0+hgrtgBT3hg+ec973IQd5fCHYxLm9GyPEWtnZx8qUH5wfkIggq+9xyKmdEwfnZG0IexSVBY6wdGrqwfCT03Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 2 de 2

Reporte de Transferencias SPEIBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/04/2022 11:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	0453243210
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC o CURP del Ordenante	MAL840101S34
Moneda	MXP
ID Tercero	09
Nombre del Beneficiario	VISION XXI STG S.A. DE C.V.
Cuenta/CLABE/Celular	002765021067696591
RFC Beneficiario	VVS081231SR8
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$3,663.07
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	05/04/2022
Número de Referencia	050422
Propósito de la Transferencia	PAGO DE MATERIAL CENTRO
Clave de Rastreo	8846APR2202204051668696931
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha Captura	05/04/2022 11:37:06 a. m.
Ejecutó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha de Ejecución	05/04/2022 11:40:03 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Cliente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR
Domicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N. CENTRO C.P.83750

Ciudad: ALTAR, SONORA
RFC: MAL840101S34

Certificado Emisor:
00001000000510013041
Certificado SAT:
00001000000504204971
Folio Fiscal:
D73627E1-0EEB-4399-ABEA-2794E8EB3D5C
Fecha Timbrado:
2022-04-04T11:42:29

Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
H87-Piez a	1.0000	[49131502-Hilo de pesca] HILO PARA PESCA ROLLO 100 M CALIBRE 1.00 MM	37.82	37.82
H87-Piez a	1.0000	[46181500-Ropa de seguridad] GUANTES DE POLIAMIDA RECUBIERTOS DE NITRILO GRANDES	81.61	81.61
XKI-Kit (Conjunto de piezas)	1.0000	[24101507-Carretillas] CARRETILLA 5.5 FT 3 SUPER REFORZADA TRUPER EXPERT	1,938.54	1,938.54
KGM-Kilo gramo	5.0000	[30264305-Alambre de acero electro galvanizado] ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16	44.47	222.35
XBJ-Cube la	1.0000	[12164905-Agente de impermeabilización] CURACRETO MEMBRANA DE CURADO PARA CONCRETO CUB 19LTS	522.53	522.53
H87-Piez a	1.0000	[22101706-Cucharas de pala] PALA CUADRADA MANGO LARGO	224.94	224.94
H87-Piez a	1.0000	[27111622-Martillo de carpintería] MARTILLO DE U±A CURVA MANGO TUBULAR CON FORRO DE P	138.99	138.99
H87-Piez a	1.0000	[27112004-Palas] PALA REDONDA T2000 MGO/MAD LARGO	224.94	224.94

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]D73627E1-0EEB-4399-ABEA-2794E8EB3D5C|2022-04-04T11:42:29|YyFzGqJt+QLg8u0lq8DUJACUwGF0U8QrObxyE6cyzpZLD8TbUyY9VscjuQI6R+2YgdU45kqxw7VWVnbdzzxdbQ9hLwY0H4q6rN4F7K38GRuvfzSSK997vEaSAKhq00g4Qu67m5AZyeYu5Nj0aTuZp01875MWEEvZO/2sbHdv6dLF4IHmzC9o4CwQWB0px8pqZGfD3IMpNv5xzzpPTgt9GawwMhHrVn82efv/cCi5hCUYb4kaCJ4pVWUJ0oe6uNM/Z+tdBx8Ayt/OB0dFmAwkwBojx3GlbhEq5jMyfmXHnJoChjJ+INMPTkOB1sbU9mgPTqWYxA==|00001000000504204971]]

Sello Digital del SAT:

YyFzGqJt+QLg8u0lq8DUJACUwGF0U8QrObxyE6cyzpZLD8TbUyY9VscjuQI6R+2YgdU45kqxw7VWVnbdzzxdbQ9hLwY0H4q6rN4F7K38GRuvfzSSK997vEaSAKhq00g4Qu67m5AZyeYu5Nj0aTuZp01875MWEEvZO/2sbHdv6dLF4IHmzC9o4CwQWB0px8pqZGfD3IMpNv5xzzpPTgt9GawwMhHrVn82efv/cCi5hCUYb4kaCJ4pVWUJ0oe6uNM/Z+tdBx8Ayt/OB0dFmAwkwBojx3GlbhEq5jMyfmXHnJoChjJ+INMPTkOB1sbU9mgPTqWYxA==

Sello Digital del Emisor:

KGz7Y4Gp33WgmX1XldMmFdvblbZJ+oJWqIXmV0lqGoyvZosqwhknMXHyM1dxEpMwUIZ+Tzn3f9W08a71rXQ3LJLaY5JrWLAJuK5sIF28sXKYQdzDH4vsNOIG4QPIh m5124aJUSaE4TqAtwVoePYad0sl9/O52zmsiNY6eSV/g7TSINag6FDDU0ZKYvqkAnsEK+qcnIHr18K1QSBerJwqTawlg4mZtAgwdbYfa5+5KltYeN5sac31YZUPFGNWOSiC Cassn3 vIXFpUmUP48n7J4zU2oMqcnY4qnP1JY81P2IMfAymVpWlBmdk/Wzp2Sb0RR5uh9dwUw==



TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido

UsoCFDI: P01

Forma de Pago: 99.

PAGARE No. FA0234409. BUENO POR \$3,663.07

EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 04 de ABRIL del 2022.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 04 de MAYO del 2022, la cantidad de \$3,663.07 (TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N) valor o importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34

DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N

CIUDAD: ALTAR

Subtotal	3,391.72
	0.00
IVA	271.35
TOTAL	3,663.07

SUSCRIPTOR Y AVAL

FA0234409

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1.

Pago en una sola exhibición. Toda Devolución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

04/04/2022 09:42:29a. m.

CECOP

JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

17,220.00

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100

BANCO: **BANORTE S.A.**

MUNICIPIO ALTAR: 0453243210

REFERENCIA: 0076

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO DE NOMINA TRABAJOS REALIZADOS 2 M2 DESPRENDIMIENTO DE LADRILLOS MAL ESTADO, 3M2 DE CONSTF
20 ML DE CONSTRUCCION DE CADENA 117 M2 DE ENJARRE GRUESO

[illegible]

SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	PÓLIZA NÚMERO
-----------	----------	------------	------------	--------	---------------

2H5170175

MUNICIPIO DE ALTAR
CECOP 2015-2018
MAL840101S34

BANORTE

CABORCA, SON.

FECHA: 05 de marzo del 2022

\$ 17 220

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Jorge Arsenio Espinoza Limon

MONEDA NACIONAL

Son Diecisiete mil Doscientos Veinte Pesos 00/100 m.n.

610182

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 6520 CABORCA
CTA 045324321-0

No. CUENTA

No. CHEQUE

236 115 101 707 291 004 53 243 210 00000076



ADMINISTRACION 2021-2024

NOMINA DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2022
CECOP 2021

TRABAJOS REALIZADOS: 2 M2 DESPRENDIMIENTO DE LADRILLO EN MAL ESTADO, 3 M2 DE CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE LADRILLO, 20 ML DE CONSTRUCCION DE CADENA, 117 M2 DE ENJARRE GRUESO

CONCEPTO: REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	SALARIO	DÍAS TRAB.	COMPENSACION HORAS EXTRAS	SUELDO NETO	FIRMAS
1	FRANCISCO ANTONIO AMARILLAS QUIHUIS	ALBAÑIL	\$520.00	6.00	\$120.00	\$3,240.00	FCO AMARILLAS
2	MANUEL QUIHUIS	ALBAÑIL	\$520.00	6.00	\$100.00	\$3,220.00	Manuel Quihuis
3	MARTIN FRANCISCO HERNANDEZ MORENO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	\$460.00	6.00	\$100.00	\$2,860.00	Martin Fco Hernandez
4	RAMON SANCHEZ GONZALEZ	AYUDANTE DE ALBAÑIL	\$460.00	6.00	\$100.00	\$2,860.00	Ramon Sanchez G.
5	LUIS ALBERTO ROBLES MARTINEZ	PEON	\$420.00	6.00		\$2,520.00	Luis Robles Mtz
6	ROMAN TAPIA MADRID	PEON	\$420.00	6.00		\$2,520.00	Roman T. Madrid
			TOTAL			\$17,220.00	



AUTORIZACION DE TESORERIA.
C.P. JUAN JOSE DELAYA GAYTAN

Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENI ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

CECOP

RECEIVED 2007
REVISED 2007

MATERIAL: 15 ML DE CONSTRUCCION DE CADENA. 135 M2 DE ENJARRE GRUESO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE

AUTORIZADO

ADDITIONAL INFORMATION: 10/25/00

ADMINISTRACION 2021-2024
NOMINA DE LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE MARZO DEL 2022
CECOP 2021



TRABAJOS REALIZADOS: 15 ML DE CONSTRUCCION DE CADENA, 135 M2 DE ENJARRE GRUESO

CONCEPTO: REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	SALARIO	DÍAS TRAB.	COMPENSACION HORAS EXTRAS	SUELDO NETO	FIRMAS
1	FRANCISCO ANTONIO AMARILLAS QUIHUIS	ALBAÑIL	\$520.00	6.00	\$120.00	\$3,240.00	FCO AMARILLAS
2	MANUEL QUIHUIS	ALBAÑIL	\$520.00	6.00	\$100.00	\$3,220.00	Manuel Quihuis
3	MARTIN FRANCISCO HERNANDEZ MORENO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	\$460.00	6.00	\$100.00	\$2,860.00	Modesto Hernandez
4	RAMON SANCHEZ GONZALEZ	AYUDANTE DE ALBAÑIL	\$460.00	6.00	\$100.00	\$2,860.00	Ramon Sanchez G
5	LUIS ALBERTO ROBLES MARTINEZ	PEON	\$420.00	6.00		\$2,520.00	Luis Robles Mf.
6	ROMAN TAPIA MADRID	PEON	\$420.00	6.00		\$2,520.00	Roman Tapia Madrid
TOTAL						\$17,220.00	

AUTORIZACIÓN DE TESORERIA.
C.P. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA CIMÓN

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

31 de marzo de 2022

ISSN 0013-788X/95/0005-0000\$05.00/0

AUTORIZADO



ADMINISTRACION 2021-2024
NOMINA DE LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022
CECOP 2021

TRABAJOS REALIZADOS: 30 M2 DE ENJARRE GRUESO, 313.68 M2 DE ENJARRE FINO

CONCEPTO: REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	SALARIO	DÍAS TRAB.	COMPENSACION HORAS EXTRAS	SUELDO NETO	FIRMAS
1	FRANCISCO ANTONIO AMARILLAS QUIHUIS	ALBAÑIL	\$520.00	6.00	\$140.00	\$3,260.00	FCO AMARILLAS
2	MANUEL QUIHUIS	ALBAÑIL	\$520.00	6.00	\$140.00	\$3,260.00	Manuel Quihuis
3	MARTIN FRANCISCO HERNANDEZ MORENO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	\$460.00	6.00	\$120.00	\$2,880.00	Martin Fco Hernandez
4	RAMON SANCHEZ GONZALEZ	AYUDANTE DE ALBAÑIL	\$460.00	6.00	\$120.00	\$2,880.00	Ramon Sanchez G
5	LUIS ALBERTO ROBLES MARTINEZ	PEON	\$420.00	6.00	\$120.00	\$2,640.00	Luis Robles Martinez
6	ROMAN TAPIA MADRID	PEON	\$420.00	6.00	\$120.00	\$2,640.00	Roman T. Madrid
TOTAL						\$17,560.00	


AUTORIZACIÓN DEL TESORERÍA.
C.P. JUAN JOSÉ CELAYA GAYTAN



Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA-LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

Aportación H. Ayuntamiento

POLIZA DE CHEQUE GASTO CORRIENTE		19 de marzo de 2022
JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON		18,720.00
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100		
BANCO: BANORTE S.A.	MUNICIPIO ALTAR: 0620002778	NO. CHEQUE: 5820

CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
REABILITACION CENTRO DE CATESCISMO IGLESIA CATOLICA SAN ANTONIO 18 ml de construcción cadena, 144 m2 enjarre grueso(Nomina 18 al 20 de Marzo 2022) APORTACIÓN AYUNTAMIENTO 12.50% DEL VALOR DE LA OBRA	

[illegible]

SUMAS IGUALES		

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	PÓLIZA NÚMERO
-----------	----------	------------	------------	--------	---------------

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA:

TESORERIA

RECIBO DE EGRESOS

020

RECIBI de la tesorería municipal de este lugar la cantidad de \$ 18,720.00

Son: dieciocho mil setecientos veinte pesos 00/100 m.n.

Por el siguiente concepto: rehabilitacion centro de catecismo iglelsia catolica san
Antonio, 18 ml construccion en cadena, 144 m2 enjarre grueso (nomina 18 al 20 de marzo 2022)
aportacion Ayuntamiento del 12.5% del valor de obra en mano de obra

Altar, Sonora., a 19 de Marzo 2022

AUTORIZACIÓN DE TESORERÍA

C. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

(Nombre y Firma de Recibido)

JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

Vo.Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. L.D. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

Banorte S.A.

No. Cta. 2778

No. Cheque 5820

No. Factura

MUNICIPIO DE ALTAR
GASTO CORRIENTE

MAL840101S34
ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR

C.P. 83750
Tel. 016373740039
SONORA

 **BANORTE**

4S9042104

CABORCA SON.

FECHA: 19 de Marzo del 2022

\$ 18720

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Jorge Arsenio Espinoza Limon

Son Dieciocho mil Seleccionados Veinte Pesos 00/100 mn.

236080

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 6520 CABORCA
CTA 062000277-8

No. CUENTA

No. CHEQUE

MONEDA NACIONAL

EDICIÓN 2019

8336151017072910062000277810005820

ADMINISTRACION 2021-2024

NOMINA DE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022

CECOP 2021



APORTACION H. AYUNTAMIENTO

TRABAJOS REALIZADOS: 18 ML DE CONSTRUCCION DE CADENA, 144 M2 DE ENJARRE GRUESO

CONCEPTO: REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	SALARIO	DÍAS TRAB.	COMPENSACION HORAS EXTRAS	SUELDO NETO	FIRMAS
1	FRANCISCO ANTONIO AMARILLAS QUIHUIS	ALBAÑIL	\$520.00	7.00		\$3,640.00	FCO AMARILLAS
2	MANUEL QUIHUIS	ALBAÑIL	\$520.00	7.00		\$3,640.00	Manuel Quihuis
3	MARTIN FRANCISCO HERNANDEZ MORENO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	\$460.00	7.00		\$3,220.00	Martin Francisco Hernandez
4	RAMON SANCHEZ GONZALEZ	AYUDANTE DE ALBAÑIL	\$460.00	6.00		\$2,760.00	Ramon Sanchez
5	LUIS ALBERTO ROBLES MARTINEZ	PEON	\$420.00	7.00		\$2,940.00	Luis Robles Martinez
6	ROMAN TAPIA MADRID	PEON	\$420.00	6.00		\$2,520.00	Roman T. Madrid
TOTAL						\$18,720.00	



AUTORIZACION DE TESORERIA.

C.P. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024
