



Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-026/06/2025.
Altar, Sonora a 23 de junio de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. DR. GODINEZ Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 16 al 22 de junio del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. **Trazo y nivelación** para la instalación de la línea de agua potable, cubriendo una longitud de **126 metros lineales**.
2. **Realización de un sondeo** para verificación de ductos, interferencias y condiciones del subsuelo.
3. **Colocación de plantilla** con material tipo "B", con un espesor de 10 cm, compactada con pisón de mano, aplicando un volumen total de **7.56 m³**.
4. **Instalación, junteo y prueba de tubería PVC hidráulico de 3"**, en una longitud total de **41.38 metros lineales**, conforme a las especificaciones técnicas establecidas para la red de agua potable.

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO





FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. DR. GODINEZ Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
1	DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2025	TRAZO Y NIVELACION 126 ML, UN SONDEO; PLANTILLA CON MATERIAL TIPO B DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADA CON PISON DE MANO 7.56 M3; INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3" 41.38 ML.


SUPERVISIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


C. JORGE ARSENIÓ ESTRINOZA LIMÓN

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

Semana del 16 al 22 de junio del 2025

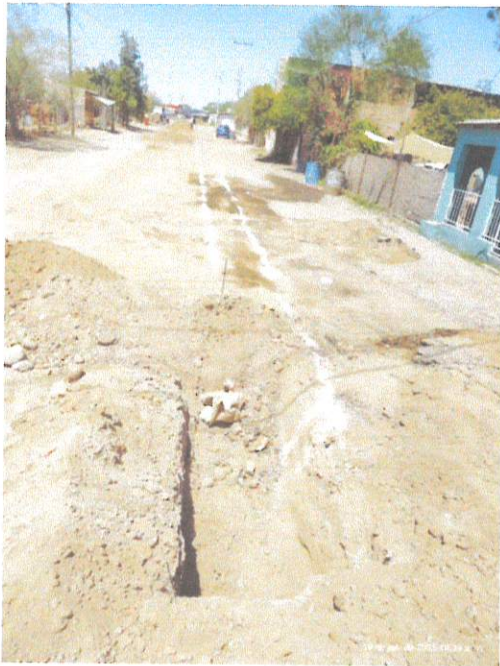

21 jun 2025 10:00:23 a. m.
SN-C Bulevar Francisco I Madero
Centro Norte
Altar
Sonora

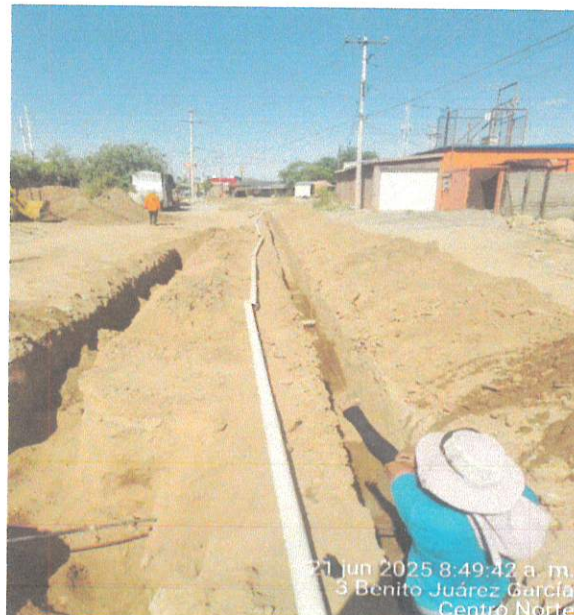

21 jun 2025 8:49:42 a. m.
3 Benito Juárez García
Centro Norte



Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-027/06/2025.
Altar, Sonora a 30 de junio de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. DR. GODINEZ Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 23 al 29 de junio del 2025

Descripción de actividades realizadas:

- 1. Instalación, junteo y prueba de tubería PVC hidráulico de 3"**, en una longitud total de **85 metros lineales**, conforme a las especificaciones del proyecto.
- 2. Relleno, apisonado y compactado** con equipo mecánico utilizando material de banco en zanjas para tubería de 3", con un volumen total de **35 m³**.
- 3. Relleno de zanja** para tubería de PVC de 3", utilizando material producto de la excavación, con un volumen de **112.42 m³**.

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. DR. GODINEZ Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
2	DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2025	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3" 85 ML; RELLENO, APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS DE TUBERIA DE 3" 35 M3; RELLENO DE ZANJA PARA TUBERIA DE PVC DE 3" PRODUCTO DE LA EXCAVACION 112.42 M3.

SUPERVISOR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENO ESPINOZA LIMON

SEMANA DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2025
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-029/07/2025.
Altar, Sonora a 07 de julio de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. DR. GODINEZ Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 30 de junio al 06 de julio del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. **Conexión a línea existente de 3"**, incluyendo corte de tubería y colocación de **tres (3) piezas especiales**, conforme a especificaciones del proyecto.
2. **Instalación de tomas de agua de 3"** con cople de inserción de 1/2" y manguera Kitec, realizando un total de **20 tomas domiciliarias**.
3. **Instalación de una (1) válvula de 3" con brida**, colocada en la línea de conducción.
4. **Construcción de registro para válvula de 3"**, incluyendo la **instalación de tapa de fierro fofo**, acorde a los detalles constructivos.
5. **Limpieza general** del área de trabajo, retirando material excedente y dejando la zona en condiciones adecuadas.

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. DR. GODINEZ Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
3	DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2025	CONEXIÓN DE LINEA EXISTENTE DE 3" INCLUYE CORTE DE TUBERIA Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (3); INSTALACION DE TOMA DE AGUA DE 3" CON COPLE DE INSERCIÓN DE 1/2" Y MANGUERA KITEC (20); INSTALACION DE VALVULA DE 3" CON BRIDA (1); CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA VALVULA DE 3" E INSTALACION DE TAPA DE FIERRO FOFO; LIMPIEZA GENERAL.

SUPERVISIÓN:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
Obras Públicas

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027
Semana del 30 de junio al 06 de julio del 2025

