



Dependencia: Obras Públicas.  
Sección: Administrativa.  
No. Oficio C-033/07/2025.  
Altar, Sonora a 07 de julio de 2025.  
Asunto: Supervisión de Obra

**C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.**

**CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.**

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. DR. GODINEZ Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

**Período supervisado:**  
**Del 09 al 15 de junio del 2025**

**Descripción de actividades realizadas:**

1. **Trazo y nivelación** a lo largo de **144 metros lineales**, correspondientes al eje de la nueva tubería sanitaria.
2. **Ejecución de un sondeo** para verificación de infraestructura existente y cotejo de niveles de proyecto.
3. **Colocación de plantilla** con material tipo *B* con espesor de **10 cm**, compactada con pisón manual, con un volumen total de **8.64 m<sup>3</sup>**.
4. **Instalación, junteo y prueba hidráulica** de tubería de **PVC de 8"** para drenaje sanitario, conforme a las especificaciones del proyecto.
5. **Alineación y nivelación** de **144 metros lineales** de tubería PVC de 8" para drenaje.
6. **Relleno, apisonado y compactado** con equipo mecánico en zanjas de tubería de 8", empleando material de banco, con un volumen total de **34.56 m<sup>3</sup>**.
7. **Trazo en alineación horizontal** para excavación de zanja destinada a tubería **PVC sanitaria de 6"**, con una longitud total de **92 metros lineales**.

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.





**ATENTAMENTE**

**C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
**MUNICIPAL 2024-2027**

**ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO**

**c.c.p archivo**



**ADMINISTRACIÓN**  
**MUNICIPAL 2024-2027**





FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)  
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027  
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA  
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. DR. GODINEZ Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
1	DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2025	TRAZO Y NIVELACION 144 ML; UN SONDEO; PLANTILLA CON MATERIAL B DE 10 CM DE ESPESOR CON PISON DE MANO 8.64 M3; INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" PARA DRENAJE; NIVELACION DE TUBERIA DE 8" PARA DRENAJE PVC 144 ML; RELLENO, APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS DE TUBERIA DE 8" 34.56 M3; TRAZO EN ALINEACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA DE 6" PVC SANITARIA 92 ML.

SUPERVISION


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. JORGE ARSENIÓ ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027  
Semana del 09 al 15 de junio del 2025



10 jun 2025 5:26:07 p. m.  
7 Benito Juárez García  
Centro Norte  
Altar  
Sonora

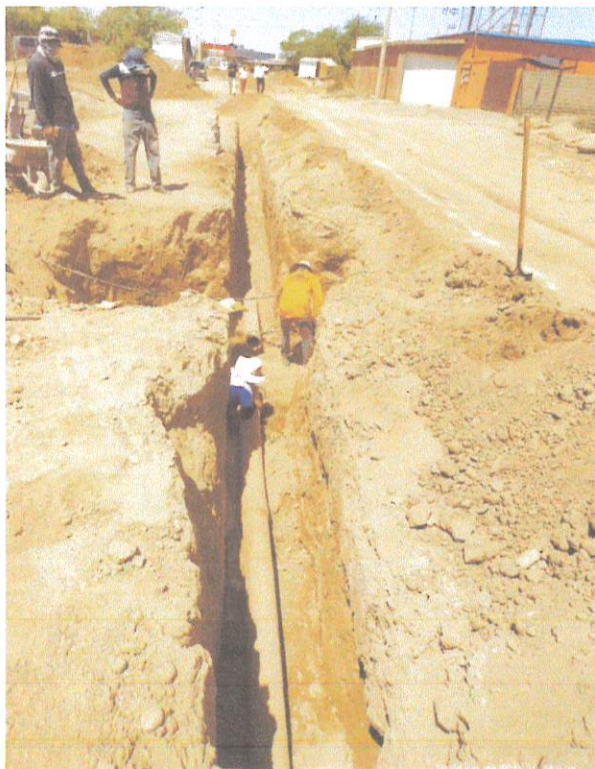





Dependencia: Obras Públicas.  
Sección: Administrativa.  
No. Oficio C-025/06/2025.  
Altar, Sonora a 23 de junio de 2025.  
Asunto: Supervisión de Obra

**C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.**

**CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.**

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. DR. GODINEZ Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

**Período supervisado:**  
**Del 16 al 22 de junio del 2025**

**Descripción de actividades realizadas:**

1. **Trazo en alineación horizontal** para excavación de zanja destinada a tubería de **PVC sanitario de 6"**, con una longitud de **13 metros lineales**.
2. **Construcción de tres (3) pozos de visita tipo común**, elaborados a base de cuñas de concreto, conforme a especificaciones del proyecto.
3. **Colocación de plantilla** con material tipo "B", con un espesor de **10 cm**, para zanja de tubería de 6", con un volumen total de **6.3 m<sup>3</sup>**.
4. **Conexión de 15 descargas domiciliarias** a la red de atarjea existente.
5. **Instalación de tubería PVC sanitaria de 6"**, en una longitud de **105 metros lineales**, incluyendo junteo y nivelación.
6. **Relleno, apisonado y compactado** con pisón de mano en zanjas de tubería de 6", con un volumen de **7.86 m<sup>3</sup>**.

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

**ATENTAMENTE**

**C. JORGE ARSENO ESPINOZA LIMON**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO**





FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)  
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027  
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA  
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. DR. GODINEZ Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
2	DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2025	TRAZO EN ALINEACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA DE 6" PVC SANITARIA 13 ML; CONSTRUCCION DE BOZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE CUÑAS DE CONCRETO (3); PLANTILLA CON MATERIAL TIPO B DE 10 CM DE ESPESOR PARA ZANJA DE TUBERIA DE 6" 6.3 M3; CONEXION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A RED DE ATARJEA (15); INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" 105 ML; RELLENO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN ZANJAS DE TUBERIA DE 6" 7.86 M3.


SUPERVISIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. JORGE ARSENIÓ ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 2024-2027

Semana del 16 al 22 de junio del 2025

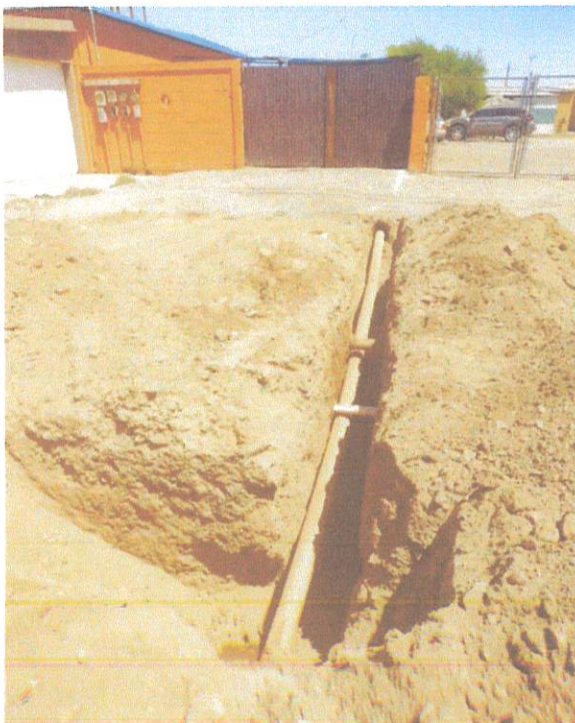





Dependencia: Obras Públicas.

Sección: Administrativa.

No. Oficio C-030/07/2025.

Altar, Sonora a 07 de julio de 2025.

Asunto: Supervisión de Obra

**C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.**

**CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.**

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. DR. GODINEZ Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

**Período supervisado:**

**Del 30 de junio al 03 de julio del 2025**

**Descripción de actividades realizadas:**

1. **Relleno, apisonado y compactado** con pisón de mano en zanjas de tubería de 6", aplicando un volumen total de **17.34 m<sup>3</sup>**.
2. **Demolición de losa** existente, abarcando una superficie de **12 m<sup>2</sup>**, con retiro de escombros producto de la demolición.
3. **Construcción de losa** con colado de concreto  $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ , con un espesor de **15 cm**, cubriendo una superficie de **12 m<sup>2</sup>**, de acuerdo con las especificaciones del proyecto.
4. **Limpieza general de la obra**, retirando materiales, escombros y dejando las áreas intervenidas en condiciones adecuadas.

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

**ATENTAMENTE**

**C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO**

**c.c.p archivo**



**ADMINISTRACIÓN**  
**MUNICIPAL 2024-2027**



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)  
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027  
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA  
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. DR. GODINEZ Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
3	DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2025	RELLENO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN ZANJAS DE TUBERIA DE 6" 17.34 M3; DEMOLICION DE LOSA 12 M2; CONSTRUCCION DE LOSA CON COLADO DE CONCRETO FC 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR 12 M2, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

SUPERVISION  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

Semana del 30 de junio al 03 de julio del 2025

