



Dependencia: Obras Públicas.

Sección: Administrativa.

No. Oficio C-040/10/2025.

Altar, Sonora a 20 de octubre de 2025.

Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BOULEVARD PINO FINAL Y AV. FRESNOS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:

Del 17 al 19 de octubre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. **Sondeo:** 1 (uno).
2. **Trazo y nivelación:** 400 metros lineales.
3. **Conexión a línea existente:** 1 (una).
4. **Instalación de válvula de 3" con brida.**
5. **Construcción de registro para válvula.**
6. **Plantilla con material tipo A y/o B de 10 cm de espesor:** 6.00 m³.

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo




FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BOULEVARD PINO FINAL Y AV. FRESNOS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
1	DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025	UN SONDEO; TRAZO Y NIVELACION 400 ML; CONEXIÓN A LINEA EXISTENTE; INSTALACION DE VALVULA DE 3" CON BRIDA; CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA VALVULA; PLANTILLA CON MATERIAL TIPO A Y/O B DE 10 CM DE ESPESOR 6.00 M3.

SUPERVISIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESENOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027
Semana del 17 al 19 de octubre del 2025

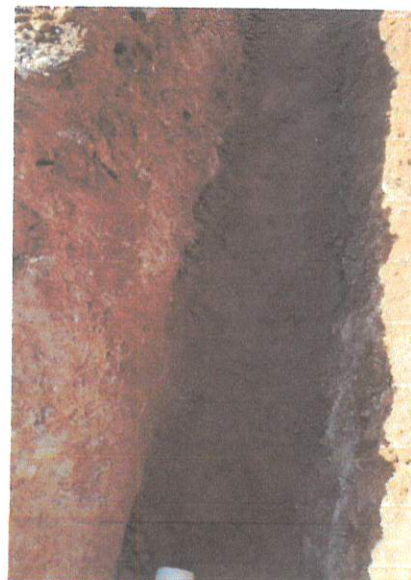



Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-041/10/2025.
Altar, Sonora a 27 de octubre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BOULEVARD PINO FINAL Y AV. FRESNOS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 20 al 26 de octubre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Plantilla con material tipo A y/o B de 10 cm de espesor: 9 m³.
2. Instalación, junteo y prueba de tubería PVC hidráulico de 3": 300 metros lineales.
3. Acostillado de tubería hidráulica de 3" con material de banco: 30 m³.

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BOULEVARD PINO FINAL Y AV. FRESNOS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
2	DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2025	PLANTILLA CON MATERIAL TIPO A Y/O B DE 10 CM DE ESPESOR 9.00 M3; INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3" 300 ML ACOSTILLADO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 3" CON MATERIAL DE BANCO 30 M3.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

Semana del 20 al 26 de octubre del 2025
ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2024-2027





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-043/10/2025.
Altar, Sonora a 01 de noviembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BOULEVARD PINO FINAL Y AV. FRESNOS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 27 al 31 de octubre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Plantilla con material tipo A y/o B de 10 cm de espesor: 5 m³.
2. Instalación, junteo y prueba de tubería PVC hidráulico de 3": 100 metros lineales.
3. Acostillado de tubería hidráulica de 3" con material de banco: 10 m³.
4. Limpieza general del área de trabajo.

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BOULEVARD PINO FINAL Y AV. FRESNOS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
3	DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	PLANTILLA CON MATERIAL TIPO A Y O B DE 10 CM DE ESPESOR 5.00 M3; INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3" 100 ML; ACOSTILLADO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 3" CON MATERIAL DE BANCO 10 M3; LIMPIEZA GENERAL

SUPERVISION
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ARSENO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
Semana del 27 al 31 de octubre del 2025

