



Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-034/10/2025.
Altar, Sonora a 06 de octubre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. ISABEL LA CATOLICA ENTRE CALLE RUBEN POMPA Y CALLE PRIMERA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 29 de septiembre al 05 de octubre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

- 1. Trazo y nivelación:** 232 metros lineales.
- 2. Ejecución de un sondeo** para verificación de infraestructura existente y cotejo de niveles de proyecto.
- 3. Colocación de plantilla** con material tipo *B* con espesor de **10 cm**, compactada con pisón manual, con un volumen total de **11.60 m³**.
- 4. Instalación, junteo y prueba hidráulica** de tubería de PVC de **3" hidráulica: 201 metros lineales.**

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo




FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. ISABEL LA CATOLICA ENTRE CALLE RUBEN POMPA Y CALLE PRIMERA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
1	DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2025	TRAZO Y NIVELACION 232 ML. UN SONDEO, PLANTILLA CON MATERIAL TIPO A Y/O B DE 10 CM DE ESPESOR 11.60 M3; INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3" 201 ML.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIQ ESPINOZA LIMON

Semana del 29 de septiembre al 05 de octubre del 2025

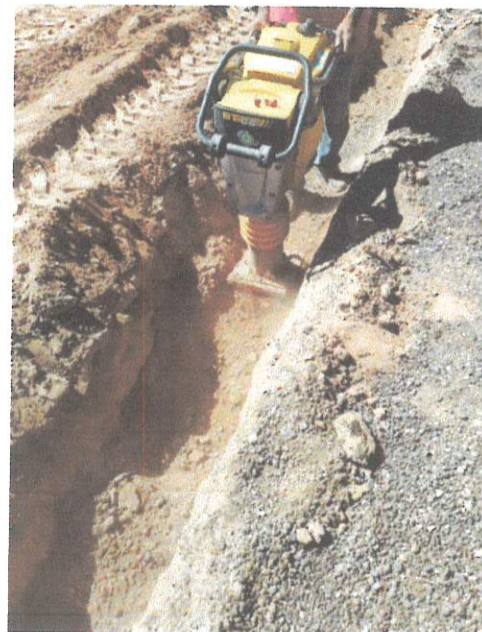



Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-036/10/2025.
Altar, Sonora a 10 de octubre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. ISABEL LA CATOLICA ENTRE CALLE RUBEN POMPA Y CALLE PRIMERA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 06 al 09 de octubre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

- 1. Instalación, junteo y prueba de tubería PVC hidráulico de 3": 31 metros lineales.**
- 2. Acostillado de tubería hidráulica de 3" con material de banco en capas de 20 cm: 29 m³.**
- 3. Conexión a línea existente: 1 (una).**
- 4. Limpieza general del área de trabajo.**

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. ISABEL LA CATOLICA ENTRE CALLE RUBEN POMPA Y CALLE PRIMERA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
2	DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2025	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3" 31 ML; ACOSTILLADO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 3" CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM 29 M3; CONEXIÓN A LINEA EXISTENTE (1); LIMPIEZA GENERAL.

SUPERVISOR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

Semana del 06 al 09 de octubre del 2025

