



Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-038/10/2025.
Altar, Sonora a 13 de octubre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON JUANA DE ARCO Y AV. ISABEL LA CATOLICA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 10 al 12 de octubre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

- 1. Trazo y nivelación:** 185 metros lineales.
- 2. Sondeo:** 1 (uno).
- 3. Plantilla con material tipo A y/o B de 10 cm de espesor:** 9.25 m³.
- 4. Instalación, junteo y prueba de tubería PVC hidráulico de 3":** 47 metros lineales.

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA



BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON JUANA DE ARCO Y AV. ISABEL LA CATOLICA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
1	DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2025	TRAZO Y NIVELACION 185 ML; UN SONDEO; PLANTILLA CON MATERIAL TIPO A Y/O B DE 10 CM DE ESPESOR 9.25 M3; INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3" 47 ML.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENI ESPINOZA LIMON

Semana del 10 al 12 de octubre del 2025

ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2024-2027

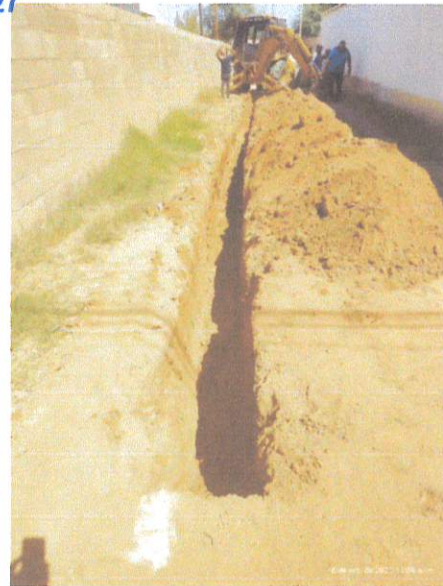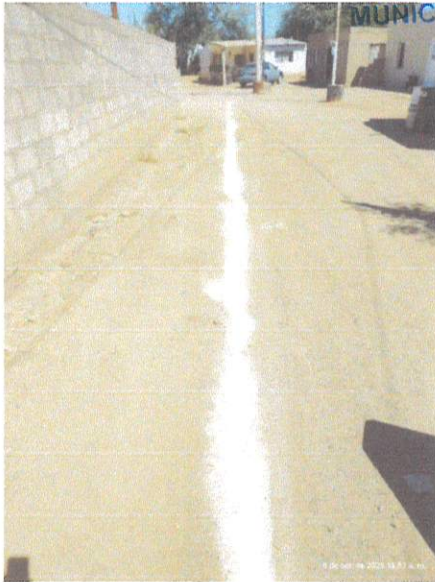



Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-039/10/2025.
Altar, Sonora a 17 de octubre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON JUANA DE ARCO Y AV. ISABEL LA CATOLICA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 13 al 16 de octubre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

- 1. Instalación, junteo y prueba de tubería PVC hidráulico de 3": 138 metros lineales.**
- 2. Acostillado de tubería hidráulica de 3" con material de banco en capas de 20 cm: 23.12 m³.**
- 3. Conexión a línea existente: 1 (una).**
- 4. Limpieza general del área de trabajo.**

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON JUANA DE ARCO Y AV. ISABEL LA CATOLICA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
2	DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2025	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3" 138 ML; ACOSTILLADO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 3" CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM 23.12 M3; CONEXIÓN A LINEA EXISTENTE (1); LIMPIEZA GENERAL.

SUPERVISION

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. JORGE ARSENO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL 2024-2027
Semana del 13 al 16 de octubre del 2025

