



Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-046/11/2025.
Altar, Sonora a 10 de noviembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 8 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 03 al 09 de noviembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Construcción de emplastes en muros: 66.36 m².

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 8 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
1	DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCION DE EMPLASTES EN MUROS 66.36 M2

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENO ESPINOZA LIMON

Semana del 03 al 09 de noviembre del 2025





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-049/11/2025.
Altar, Sonora a 17 de noviembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 8 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 10 al 16 de noviembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Construcción de muros: 2.72 m².
2. Construcción de emplastes en muros: 50.32 m².

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 8 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
2	DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCION DE MUROS 2.72 M2; CONSTRUCCION DE EMPLASTES EN MUROS 50.32 M2

SUPERVISIÓN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027
Semana del 10 al 16 de noviembre del 2025





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-053/11/2025.
Altar, Sonora a 24 de noviembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 8 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 17 al 23 de noviembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. **Construcción de dalas y castillos:** 13.35 metros lineales.

2. **Construcción de muros:** 10.28 m².

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA



BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 8 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
3	DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCION DE 13.35 ML DE DALAS Y CASTILLOS; CONSTRUCCION DE MUROS 10.28 M2.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

Semana del 17 al 23 de noviembre del 2025

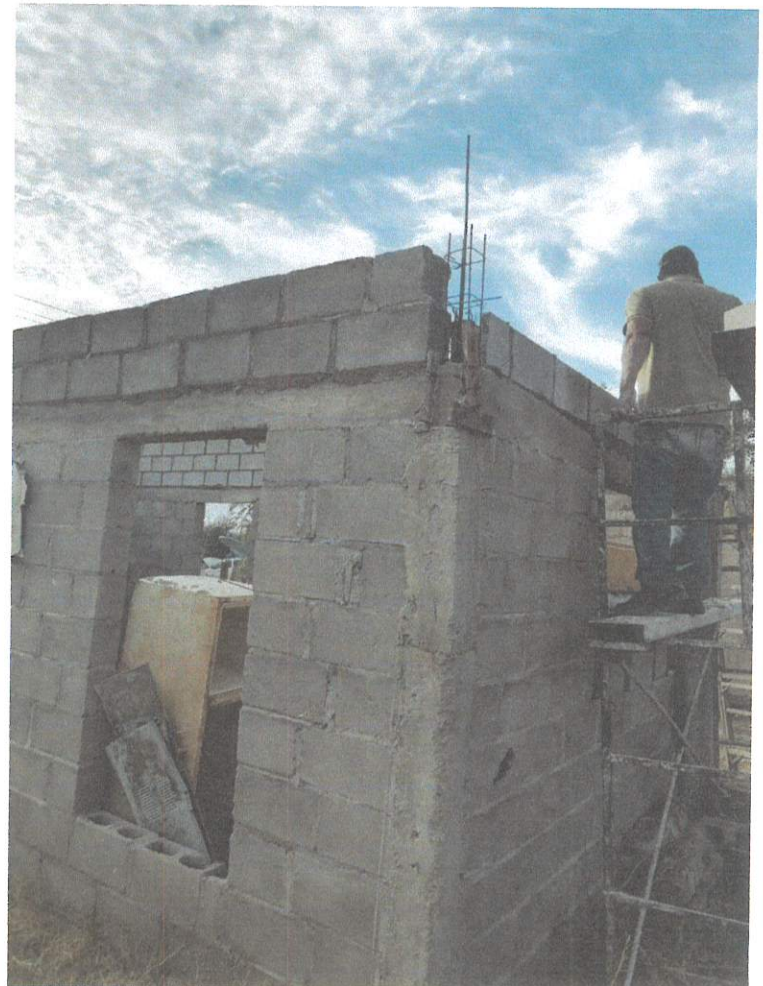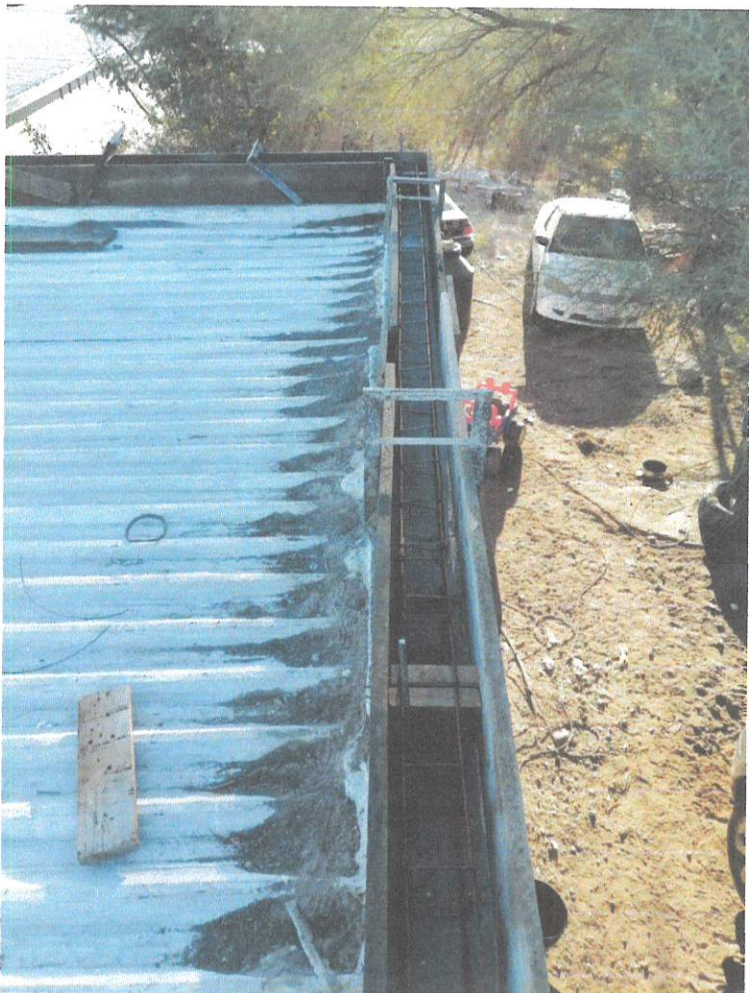



Dependencia: Obras Públicas.

Sección: Administrativa.

No. Oficio C-064/12/2025.

Altar, Sonora a 08 de diciembre de 2025.

Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 8 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:

Del 01 al 07 de diciembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Construcción de emplastes en muros: 99.54 m².

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.



ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIÓ ESPINOZA LIMÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 8 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
4	DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCION DE EMPLASTES EN MUROS 99.54 M2

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

Semana del 01 al 07 de diciembre del 2025





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-076/12/2025.
Altar, Sonora a 29 de diciembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 8 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 22 al 28 de diciembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Construcción de emplastes en muros: 113.70 m².
2. Construcción de muros: 19.60 m².

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 8 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
5	DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCION DE EMPLASTES EN MUROS 113.70 M2; CONSTRUCCION DE MUROS 19.60 M2.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESTRINOZA LIMON

SEMANA DEL 22 AL 28 de diciembre del 2025
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027

