



Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-047/11/2025.
Altar, Sonora a 17 de noviembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 10 al 16 de noviembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Construcción de piso firme: 33.63 m².

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA


NOMBRE DE LA OBRA:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
1	DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCION DE PISO FIRME 33'63 M2

SUPERVISION

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027
Semana del 10 al 16 de noviembre del 2025

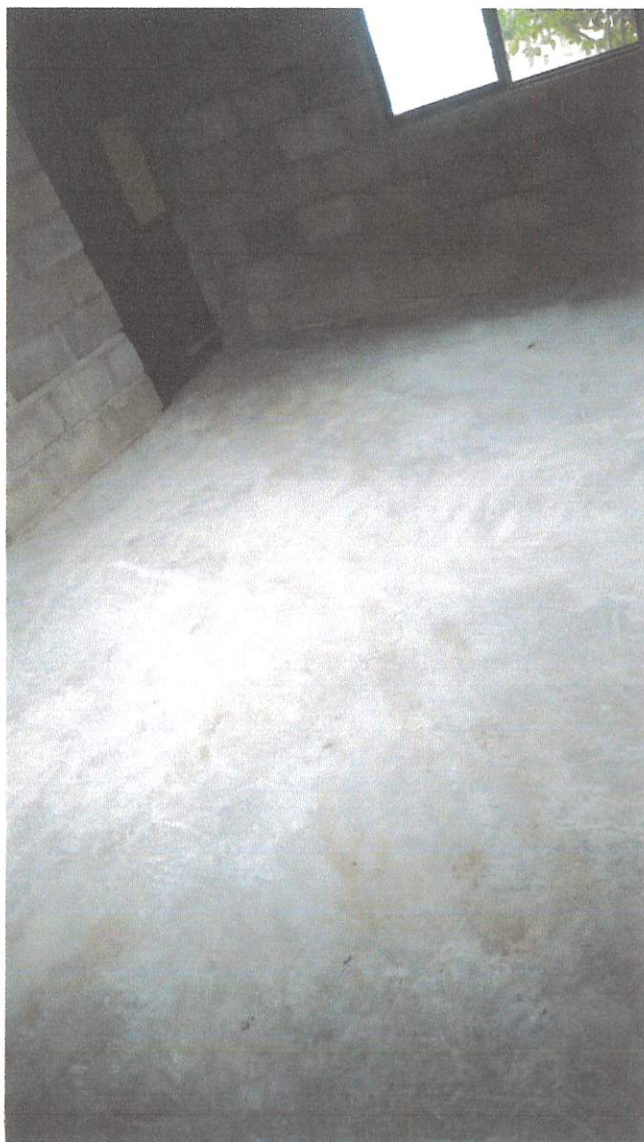



Dependencia: Obras Públicas.

Sección: Administrativa.

No. Oficio C-057/12/2025.

Altar, Sonora a 01 de diciembre de 2025.

Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:

Del 24 al 30 de noviembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Construcción de piso firme: 50.45 m².

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
2	DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCION DE PISO FIRME 50.45 M2

SUPERVISOR

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. JORGE ARSENIQ ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

Semana del 24 al 30 de noviembre del 2025





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-062/12/2025.
Altar, Sonora a 08 de diciembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 01 al 07 de noviembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Construcción de piso firme: 36.81 m².

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
3	DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCION DE PISO FIRME 36.81 M2

Supervisión
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

Semana del 01 al 07 de diciembre del 2025





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-067/12/2025.
Altar, Sonora a 15 de diciembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 08 al 14 de diciembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Construcción de piso firme: 25 m².

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA


BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
4	DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCION DE PISO FIRME 25 M2

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027
Semana del 08 al 14 de diciembre del 2025

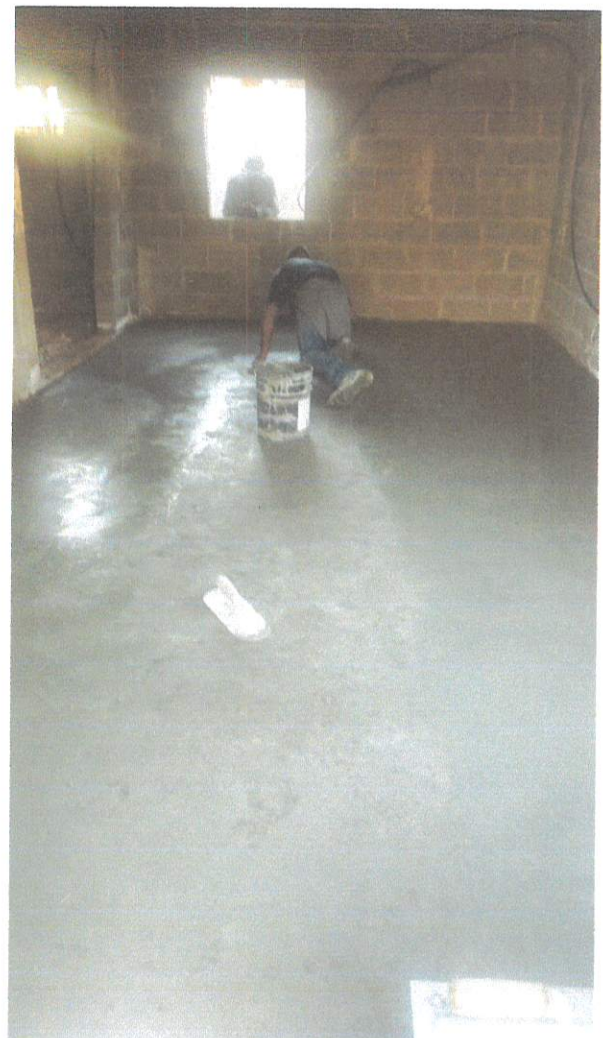



Dependencia: Obras Públicas.

Sección: Administrativa.

No. Oficio C-071/12/2025.

Altar, Sonora a 22 de diciembre de 2025.

Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:

Del 15 al 21 de diciembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Construcción de piso firme: 43.40 m².

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
5	DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCION DE PISO FIRME 43.40 M2

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027
Semana del 15 al 21 de diciembre del 2025

