



Dependencia: Obras Públicas.

Sección: Administrativa.

No. Oficio C-042/10/2025.

Altar, Sonora a 27 de octubre de 2025.

Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:

Del 20 al 26 de octubre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Retiro de estructura existente: 18.00 m².
2. Construcción de techo de lámina galvanizada a base de polinería: 47.00 m².
3. Construcción de pretil: 16.18 metros lineales.

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
1	DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2025	RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE 18 M2; CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE POLINERIA 47 M2; CONSTRUCCION DE PRETIL 16.18 ML.

SUPERVISION


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON



Semana del 20 al 26 de octubre del 2025

ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2024-2027

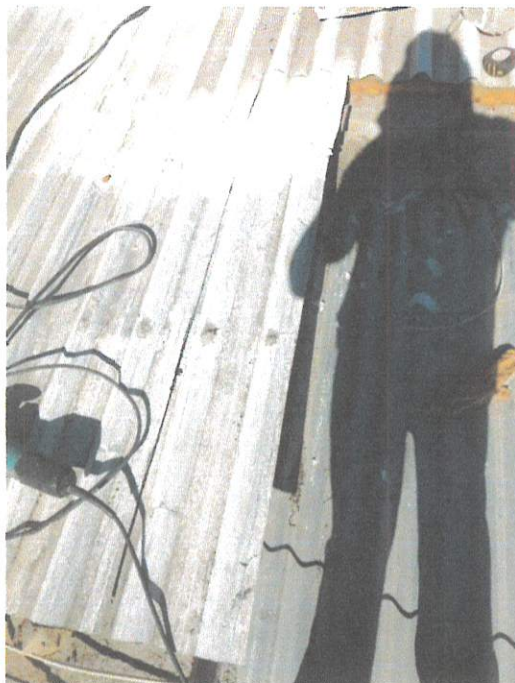



Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-044/11/2025.
Altar, Sonora a 03 de noviembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 27 de octubre al 02 de noviembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Construcción de techo de lámina galvanizada a base de polinería: 80.70 m².
2. Construcción de pretil: 59.00 metros lineales.

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo





FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
2	DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE POLINERIA 80.70 M2; CONSTRUCCION DE PRETIL 59 ML.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENO ESPINOZA LIMON
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

Semana del 27 de octubre al 02 de noviembre del 2025

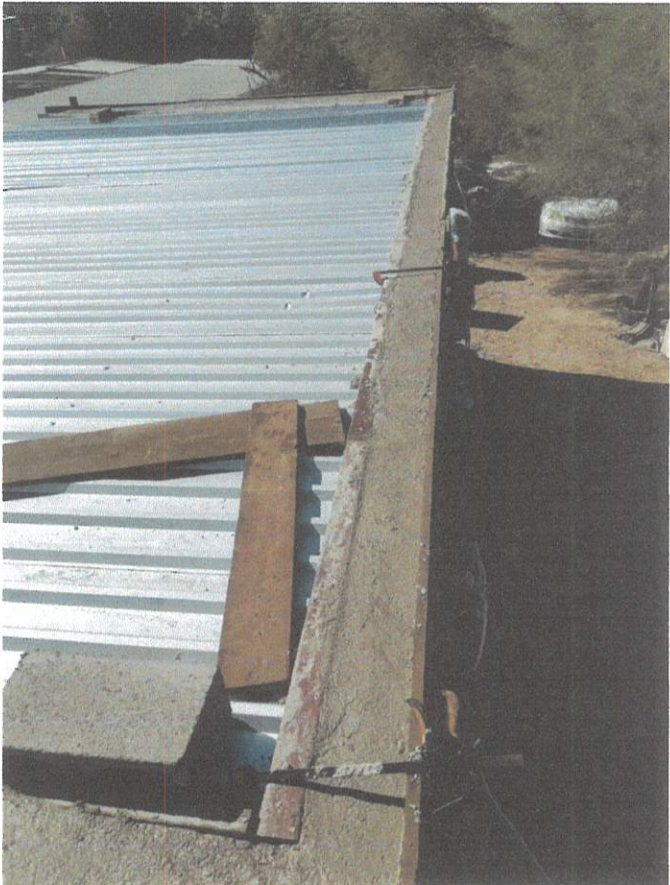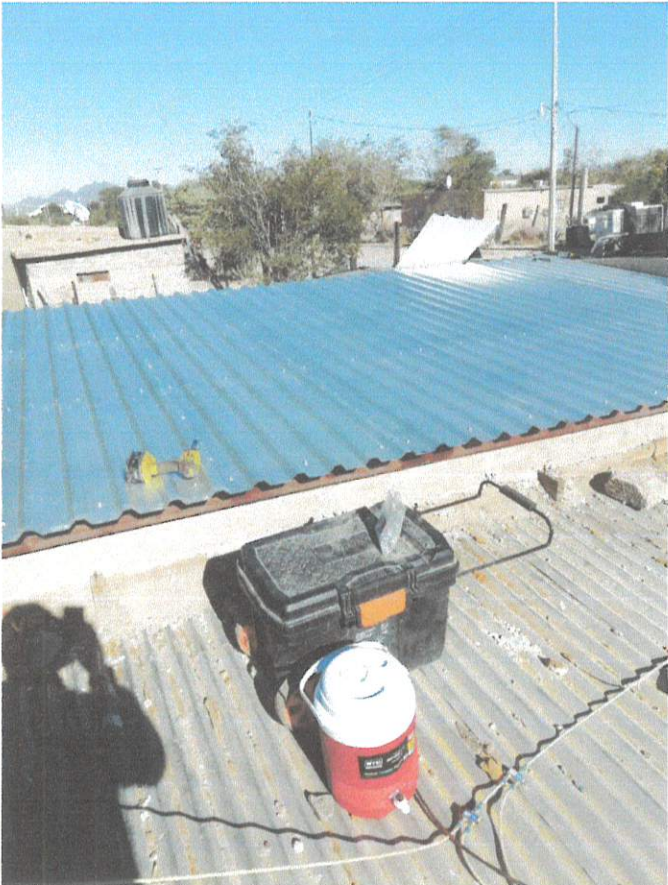



Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-045/11/2025.
Altar, Sonora a 10 de noviembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 03 al 09 de noviembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Retiro de estructura existente: 11.65 m².
2. Construcción de techo de lámina galvanizada a base de polinería: 38.58 m².
3. Construcción de pretil: 16.50 metros lineales.
4. Colocación de plafón: 81.15 m².

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
3	DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025	RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE 11.65 M2; CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE POLINERIA 38.58 M2; CONSTRUCCION DE PRETIL 16.50 ML; COLOCACION DE PLAFON 81.15 M2.


SUPERVISION

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. JORGE ARSENIQ ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

Semana del 03 al 09 de noviembre del 2025

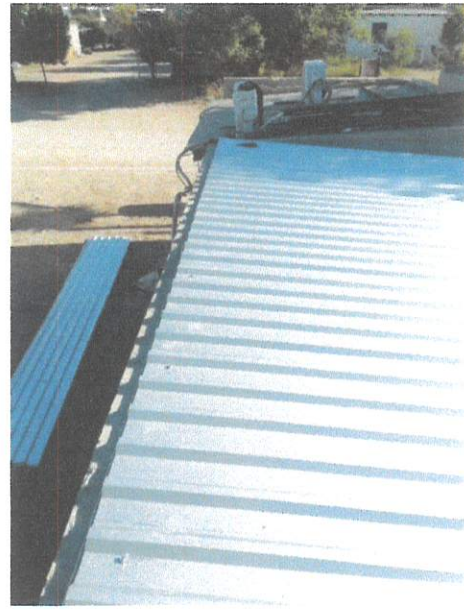



Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-048/11/2025.
Altar, Sonora a 17 de noviembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 10 al 16 de noviembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Retiro de estructura existente: 91.82 m².
2. Construcción de techo de lámina galvanizada a base de polinería: 96.92 m².
3. Construcción de pretil: 8.50 metros lineales.
4. Colocación de plafón: 37.35 m².

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
4	DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025	RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE 91.82 M2; CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE POLINERIA 96.92 M2; CONSTRUCCION DE PRETIL 8.50 ML; COLOCACION DE PLAFON 37.35 M2



SUPERVISION

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

Semana del 10 al 16 de noviembre del 2025

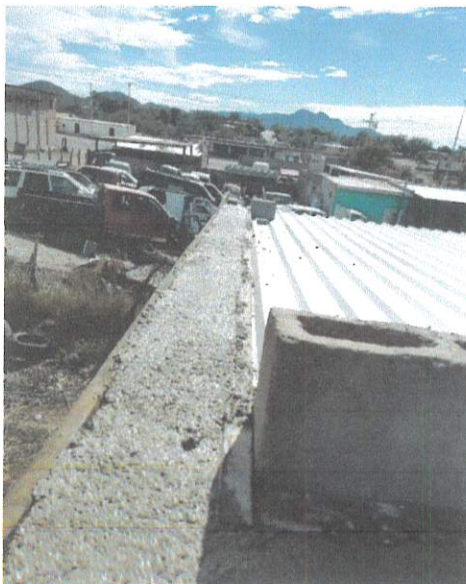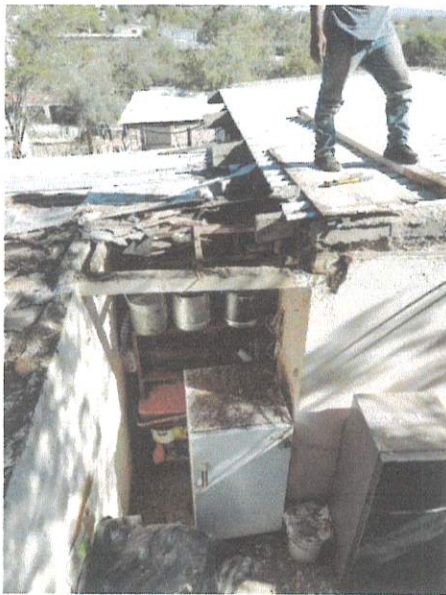



Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-052/11/2025.
Altar, Sonora a 24 de noviembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 17 al 23 de noviembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Retiro de estructura existente: 16.50 m².
2. Construcción de techo de lámina galvanizada a base de polinería: 53.22 m².
3. Construcción de pretil: 58.60 metros lineales.
4. Colocación de plafón: 12.50 m².

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA



BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
5	DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE 16.50 M2; CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE POLINERIA 53.22 M2; CONSTRUCCION DE PRETIL 58.60 ML; COLOCACION DE PLAFON 12.50 M2

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027
Semana del 17 al 23 de noviembre del 2025

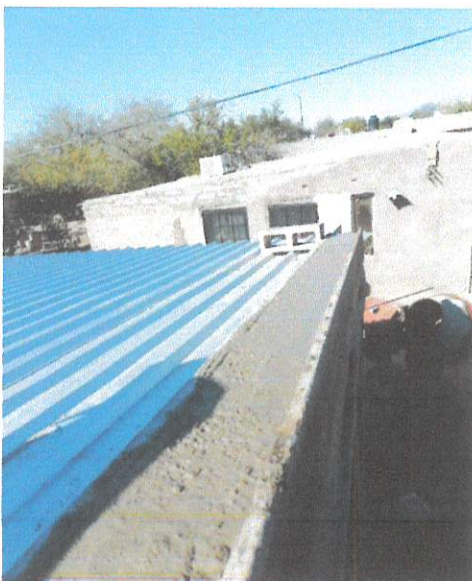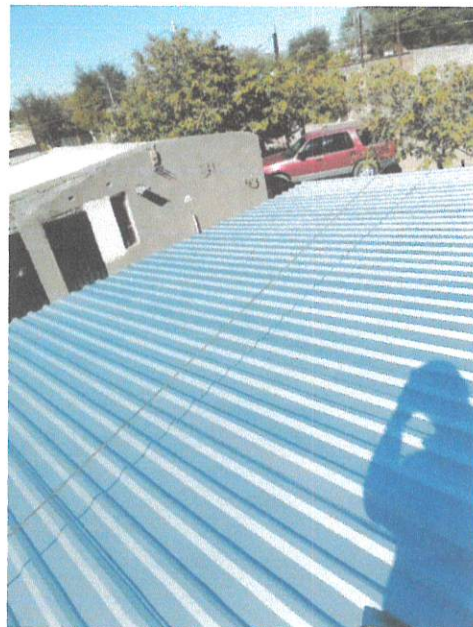



Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-058/12/2025.
Altar, Sonora a 01 de diciembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 24 al 30 de noviembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Construcción de techo de lámina galvanizada a base de polinería: 66 m².
2. Construcción de pretil: 30 metros lineales.
3. Colocación de plafón: 38 m².

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo




FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
6	DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE POLINERIA 66 M2; CONSTRUCCION DE PRETIL 30 ML; COLOCACION DE PLAFON 38 M2

SUPERVISOR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

Semana del 24 al 30 de noviembre del 2025

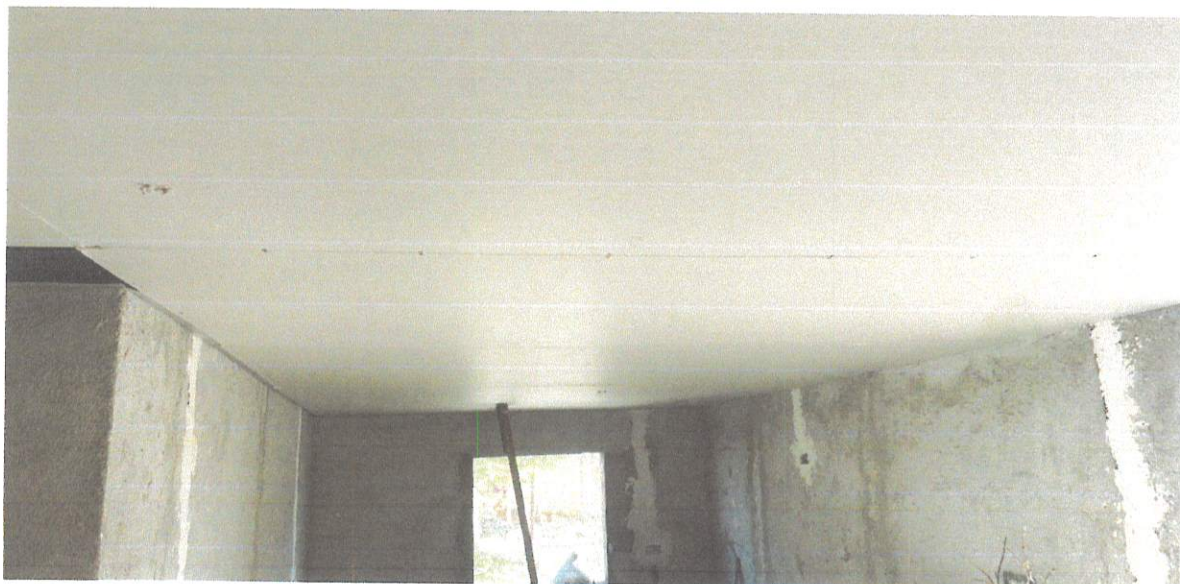



Dependencia: Obras Públicas.

Sección: Administrativa.

No. Oficio C-063/12/2025.

Altar, Sonora a 08 de diciembre de 2025.

Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:

Del 01 al 07 de diciembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

- 1. Construcción de techo de lámina galvanizada a base de polinería: 32.31 m².**
- 2. Construcción de pretil: 15 metros lineales.**

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA


BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
7	DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE POLINERIA 32.31 M2; CONSTRUCCION DE PRETIL 15 ML.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIQ ESPINOZA LIMON

Semana del 01 al 07 de diciembre del 2025

ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2024-2027

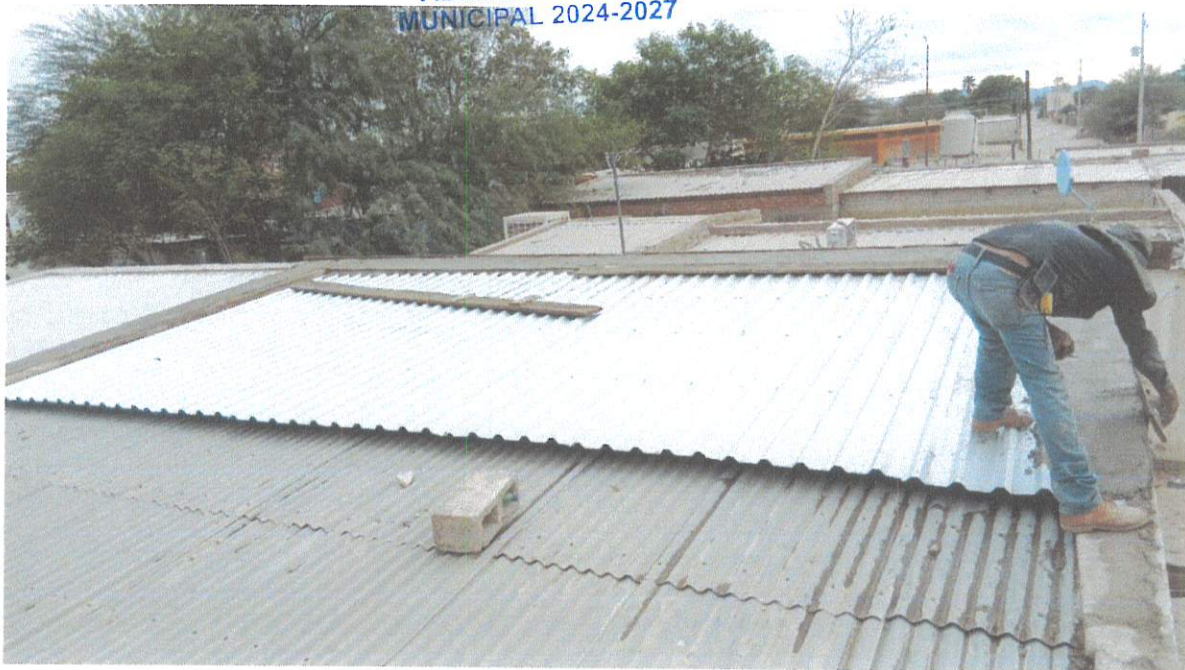



Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-069/12/2025.
Altar, Sonora a 15 de diciembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 08 al 14 de diciembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

- 1. Construcción de techo de lámina galvanizada a base de polinería: 48 m².**
- 2. Construcción de pretil: 7 metros lineales.**

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA


BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
8	DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE POLINERIA 48 M2; CONSTRUCCION DE PRETIL 7 ML.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

Semana del 08 al 14 de diciembre del 2025

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

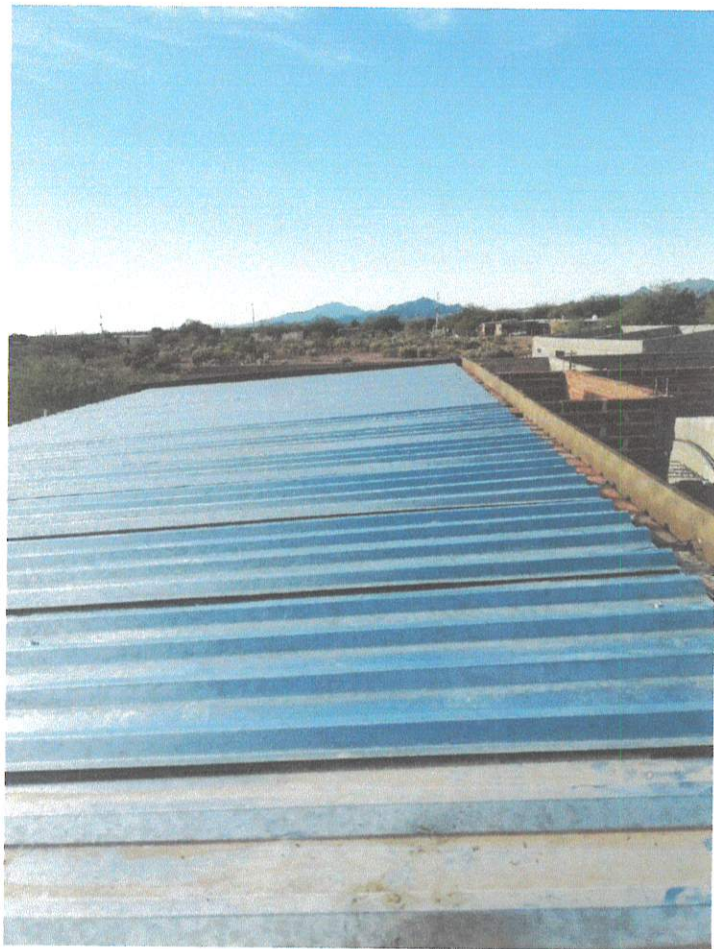



Dependencia: Obras Públicas.

Sección: Administrativa.

No. Oficio C-073/12/2025.

Altar, Sonora a 22 de diciembre de 2025.

Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:

Del 15 al 21 de diciembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

- 1. Retiro de estructura existente: 56 m².**
- 2. Construcción de techo de lámina galvanizada a base de polinería: 46 m².**
- 3. Construcción de pretil: 15.40 metros lineales.**

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
9	DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2025	RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE 56 M2; CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE POLINERIA 46 M2; CONSTRUCCION DE PRETIL 15.40 ML.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESTRINOZA LIMON

Semana del 15 al 21 de diciembre del 2025
MUNICIPAL 2024-2027





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-075/12/2025.
Altar, Sonora a 29 de diciembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 22 al 28 de diciembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. **Retiro de estructura existente:** 7.85 m².
2. **Construcción de techo de lámina galvanizada a base de polinería:** 46.88 m².
3. **Construcción de pretil:** 9.32 metros lineales.
4. **Colocación de plafón:** 9 m².

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
10	DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2025	RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE 7.85 M2; CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE POLINERIA 46.88 M2; CONSTRUCCION DE PRETIL 9.32 ML; COLOCACION DE PLAFON 9 M2.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027
Semana del 22 al 28 de diciembre del 2025

